

report

Rapporto
annuale di
esecuzione

Letno
poročilo
o izvajanju

2012



2007-2013
cooperazione territoriale europea
programma per la cooperazione
transfrontaliera
Italia-Slovenia
evropsko teritorialno sodelovanje
program čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija



Investiamo nel
vostro futuro!

Nalozba v vašo
prihodnost!

www.ita-slo.eu

Fondo europeo di sviluppo regionale
Evropski sklad za regionalni razvoj



2007-2013
cooperazione territoriale europea
programma per la cooperazione
transfrontaliera
Italia-Slovenia
evropsko teritorialno sodelovanje
program čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija



Investiamo nel
vostro futuro!

Naložba v vašo
prihodnost!

www.ita-slo.eu

Fondo europeo di sviluppo regionale
Evropski sklad za regionalni razvoj

Letno poročilo o izvajanju 2012

Operativni program številka CCI: 2007 CB 163 PO 036

Odločba Komisije K(2007) 6584 končni z dne 20. decembra 2007

Sklep Komisije K(2010) 2343 končni z dne 20. aprila 2010

K A Z A L O

UVOD	6
1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA	7
1.1 Programski dokumenti	8
1.2 Delo struktur upravljanja Programa	10
2. PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA	22
2.1 Dosežki in analiza napredka	22
2.1.1 Informacije o fizičnem napredku Operativnega programa	22
2.1.2 Finančni podatki	42
2.1.3 Informacije o razdelitvi uporabe skladov	64
2.1.4 Pomoč ciljnim skupinam	73
2.1.5 Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč	80
2.1.6 Kakovostna analiza	82
2.2 Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti	86
2.3 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo	93
2.4 Spremembe v okviru izvajanja Operativnega programa (če je ustrezno)	97
2.5 Bistvene spremembe v skladu s 57. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 (če je ustrezno)	98
2.6 Dopolnjevanje z drugimi instrumenti	99
2.7 Spremljanje in ocenjevanje	100
2.8 Nacionalna rezerva na podlagi doseženih rezultatov (kjer je primerno in le za letno poročilo o izvajanju, predloženo za leto 2010)	117
3. IZVAJANJE PO PREDNOSTNIH NALOGAH	118
3.1 Prednostna naloga 1: Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija	122
3.1.1 Doseganje ciljev in analiza napredka	122
3.1.2 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo	127
3.2 Prednostna naloga 2: Konkurenčnost in na znanju temelječa družba	128
3.2.1 Doseganje ciljev in analiza napredka	128
3.2.2 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo	132
3.3 Prednostna naloga 3: Socialna integracija	133
3.3.1 Doseganje ciljev in analiza napredka	133
3.3.2 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo	136
3.4 Prednostna naloga 4: Tehnična pomoč	137
3.4.1 Doseganje ciljev in analiza napredka	137
3.4.2 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo	143
4. PROGRAMI IZ ESRR/KOHEZIJSKEGA SKLADA: VELIKI PROJEKTI (ČE JE USTREZNO)	144
5. TEHNIČNA POMOČ	145



6. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI	147
6.1 Nosilci in strukture.....	147
6.2 Izvajanje, nadzor in spremembe Komunikacijskega načrta	149
6.3 Vrste ukrepov.....	149
6.4 Vsebina	153
6.4.1 Dodana vrednost ukrepov Skupnosti	153
6.4.2 Spletna stran in socialna omrežja	154
6.4.3 Dogodki, ki jih je organiziral Organ upravljanja	155
6.4.4 Dogodki, ki jih je organizirala Republika Slovenija	158
6.4.5 Celostna grafična podoba Programa	158
6.5 Ocena komunikacijskih dejavnosti	159

UVOD

Pričujoče Letno poročilo o izvajanju, ki ga je obravnaval in potrdil Nadzorni odbor Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 (v nadaljevanju NO), vsebuje pregled izvajanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 (v nadaljevanju Program) in programskih aktivnosti od 1. januarja do 31. decembra 2012.

Zaradi boljše preglednosti izvajanja Programa, pričujoče poročilo vsebuje tudi informacije o aktivnostih izvedenih v letu 2013, in sicer do 31. marca.

Poročilo je pripravil Organ upravljanja (v nadaljevanju OU) s pomočjo Skupnega tehničnega sekretariata (v nadaljevanju STS) v skladu z določili 67. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in na podlagi Priloge XVIII k Uredbi Komisije (ES) št. 1828/2006 spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 846/2009. Morebitne pripombe in dopolnitve, ki se nanašajo na obdobje po 31.03.2013, bodo vključene v Letno poročilo o izvajanju za leto 2013.

Skupni OU Programa je Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina in sicer Glavna direkcija za kulturo, šport, mednarodne odnose in odnose z EU, Služba za upravljanje EU skladov, odgovorna oseba pri organizacijski enoti za usklajevanje aktivnosti Operativnega Programa Slovenija-Italija 2007-2013 (v nadaljevanju O.P.) in PPS INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006 ter izvajanje funkcije in nalog OU, Via Udine 9 - 34132 Trst, adg.itaslo@regione.fvg.it, tel. +39 040 3775974.

Vsa poglavja pričujočega poročila vsebujejo opis in kjer je potrebno tudi povzetek obravnavanih vsebin v obliki tabel.



1. Opredelitev Operativnega programa

Operativni program

Cilj:	Cilj 3 »Evropsko teritorialno sodelovanje«
Upravičeno območje:	<u>Za Republiko Italijo:</u> Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina: Pokrajina Trst Pokrajina Gorica Pokrajina Videm Pokrajina Pordenone (»na osnovi načela fleksibilnosti«, v skladu z 21.1 členom Uredbe (ES) št. 1080/2006) Dežela Veneto Pokrajina Benetke Pokrajina Rovigo Pokrajina Padova Pokrajina Treviso (»na osnovi načela fleksibilnosti«, v skladu z 21.1 členom Uredbe (ES) št. 1080/2006) Dežela Emilia Romagna Pokrajina Ferrara Pokrajina Ravenna <u>Za Republiko Slovenijo:</u> Goriška statistična regija Obalno-kraška statistična regija Gorenjska statistična regija Osrednjeslovenska statistična regija (na osnovi načela fleksibilnosti v skladu z 21.1 členom Uredbe (ES) št. 1080/2006) Notranjsko-kraška statistična regija (na osnovi načela fleksibilnosti v skladu z 21.1 členu Uredbe (ES) št. 1080/2006)
Programsko obdobje:	2007-2013
Številka Programa (št. CCI):	2007 CB 163 PO 036
Ime Programa:	Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
Odločba o odobritvi:	K(2007) 6584 kon. z dne 20. decembra 2007
Odločba o spremembi:	K(2010) 2343 kon. z dne 20. aprila 2010
Letno poročilo o izvajanju	
Leto poročanja:	2012
Datum potrditve letnega poročila s strani Nadzornega odbora:	12. junij 2013 (44. dopisna seja NO)



1.1 Programski dokumenti

Vse dokumente, ki jih je sprejel NO, je pripravil OU s pomočjo STS. Sodelovanje programskih partnerjev je omogočilo sprotno dopolnjevanje in izboljševanje le-teh.

V nadaljevanju sledita seznama novih ter spremenjenih in dopolnjenih dokumentov, ki so bili pripravljeni v referenčnem obdobju tega poročila na podlagi rezultatov revizij operacij, izvedenih v letu 2011. Ugotovitve v okviru opravljenih revizijskih postopkov so obenem pripomogle k izboljšanju sistema upravljanja in nadzora Programa.

Seznam novih dokumentov:

- Smernice za spremljanje in poročanje o državnih pomočeh (verzija št. 01/2012) - za italijanske upravičence;
- Okrožnica OU z dne 11.06.2012 v zvezi s postopki javnega naročanja ter kontrolna lista za postopek oddaje javnega naročila za slovenske in italijanske upravičence;
- Okrožnica OU z dne 14.08.2012 o trajnosti projekta, skladno s 57. členom (»Trajnost projekta«) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, spremenjene z Uredbo (EU) št. 539/2010 Evropskega parlamenta in Sveta;
- Smernice za upravljanje projektov, ki ustvarjajo prihodek ter kontrolni list za preverjanje morebitnih prihodkov v okviru projekta.

Poleg zgoraj naštetih dokumentov, so bili v referenčnem obdobju tega poročila posodobljeni sledeči dokumenti:

- Navodila in obrazci za poročanje za upravičence - strateški projekti (JR št. 01/2009), verzija št. 03/2012 z dne 01.06.2012 in verzija št. 04/2013 z dne 25.02.2013;
- Navodila in obrazci za poročanje za upravičence - standardni projekti (JR št. 02/2009 in JR št. 03/2011), verzija št. 01/2013 z dne 25.02.2013;
- Posodobitev obrazca za uveljavljanje sprememb na projektu (verzija št. 02/2012);
- Pravilnik o arhiviranju dokumentov;
- Spremembe projekta tehnične pomoči št. 4TA03-2009, ki se nanaša na ustanovitev STS;
- Priloge k zgoraj omenjenemu projektu tehnične pomoči: Navodila za izvajanje tehnične pomoči; Obrazec za poročanje - Poročilo upravičenca; Navodila in obrazci za poročanje za upravičence projekta 4TA03-2009;
- Časovni načrt (Road Map) Programa.

STS je pripravil in objavil na uradni spletni strani Programa (www.ita-slo.eu) tudi 12 predstavitev (v formatu power point) zgoraj navedene dokumentacije ter dopolnitev le-te, namenjenih upravičencem. Objava novih dokumentov oz. dopolnjenih verzij le-teh je na spletni strani Programa posebej označena.



Predlagana sprememba Poslovnika NO, in sicer 3. člena, ki ureja postopek odločanja in določa potrebno večino, je bila vključena v dnevni red 11. seje NO in objavljena v začetku oktobra 2011 na intranetni strani Programa, kjer je dostopna vsem članom NO. Do časa priprave tega poročila točka še ni bila obravnavana. Omenjena sprememba bo ponovno predložena v obravnavo NO v teku leta 2013.



1.2 Delo struktur upravljanja Programa

Organ upravljanja (OU)

Odbor Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine se je, v skladu z Odlokom Predsednika Dežele 42/2008, s sklepom št. 1286 z dne 12.07.2012, seznanil z odločitvijo o odobritvi prednostnih lestvic po posamezni prednostni nalogi, v okviru javnega razpisa št. 03/2011 za predložitev standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju ter dodelitvijo preostankov sredstev Programa, ki jo je NO sprejel v Novi Gorici, na svoji 12. redni seji z dne 06.07.2012.

Do priprave pričujočega Letnega poročila se je zaključilo podpisovanje Pogodb o dotaciji sofinanciranja za 51 standardnih projektov, odobrenih v okviru javnega razpisa št. 02/2009 (glej poglavje 2.1.2), in za 20 standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju, odobrenih v okviru javnega razpisa št. 03/2011.

V letu 2012 je OU izvedel številne postopke za oddajo javnih naročil, ki se financirajo v okviru prednostne naloge 4 - Tehnična pomoč - projekt št. 4TA 03-2009, in zagotovil dobavo blaga in storitev. Omenjena javna naročila so zajemala: potrošni material in drugo opremo za organe Programa, prevajalske storitve, storitve izobraževanja na področju javnih naročil gradenj in/ali storitev, ki ne presegajo mejne vrednosti EU in javnih naročil blaga in storitev v skladu s 125. členom italijanskega zakona o javnem naročanju, storitve sprotne vrednotenja Programa za obdobje 2012 -2015¹ (glej poglavje 2.1.1) ter vzpostavitev spletne platforme »4pm«.

Obenem je OU izvedel tudi postopek za izbor zunanjega svetovalca s področja državnih pomoči - v Italiji, in sicer zaradi potrebe ocenjevanja projektnih predlogov, predloženih v okviru javnega razpisa št. 03/2011.

OU je s pomočjo STS zagotovil tudi obveščanje javnosti o Programu ter sodeloval pri organizaciji dogodkov, ki prispevajo k prepoznavnosti le-tega (glej 6. Poglavje tega poročila).

Skupni tehnični sekretariat (STS)

Po zaključku javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine št. 50 z dne 16. decembra 2009, je bil na sedežu OU v Trstu 28. septembra 2010 uradno vzpostavljen STS, ki je 1. januarja 2012 štel 14 uslužbencev. V okviru Info točke, ki deluje v Regionalni pisarni Štanjel, kot dislocirani pisarni Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)², pa sta zaposleni 2 osebi.

V letu 2012, in sicer do konca meseca junija 2012, je STS deloval brez namestnice vodje, ki je bila od oktobra 2011 na porodniškem dopustu. Od 15. septembra 2012 pa se je omenjeno delovno mesto sprostilo zaradi predčasne prekinitve pogodbe s strani uslužbenke.

¹ Obdobje 2012-2015 se nanaša na trajanje pogodbe, sklenjene z izvajalcem storitev sprotne vrednotenja Programa, t.j. začasno združenje podjetij »GRETA Associati in MK Projekt« iz Benetk.

² V skladu z določili Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F), objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije št. 8/2012 z dne 3. februarja 2012, je bila Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) ukinjena. Delovno področje evropske kohezijske politike in regionalnega razvoja je prevzelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).



V mesecu novembru je OU pričel postopek za izbiro novega kandidata za namestnika vodje STS, ki se je zaključil dne 24.01.2013 s sprejetjem funkcije s strani prvouvrščene kandidatke na prednostni lestvici za omenjeni postopek, ki je sicer že delovala v okviru STS kot svetovalka za upravljanje. Pogodba z novo namestnico vodje STS je bila podpisana 15. marca 2013.

Meseca marca 2013 je OU pričel s postopkom za izbor novega svetovalca za upravljanje. Omenjeno delovno mesto se je sprostilo zaradi prehoda uslužbenke na delovno mesto namestnice vodje STS. Na dan priprave tega poročila je postopek za izbor kandidata v teku.

V okviru STS je od meseca decembra 2012 začasno nezasedeno tudi delovno mesto svetovalke za spremljanje in finance, ki je odšla na porodniški dopust. V obdobju priprave tega poročila je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) zagotovilo nadomeščanje uslužbenke za čas trajanja porodniškega dopusta, in sicer od meseca maja 2013 dalje.

Zaradi porodniškega dopusta je bilo v letu 2012 za obdobje 6 mesecev nezasedeno tudi eno od dveh delovnih mest svetovalca v okviru Info točke v Štanjelu.

V zvezi z aktivnostmi STS velja izpostaviti, da skladno s 16. členom Uredbe (ES) št. 1080/2006 in za zagotovitev potrebne podpore za pospešitev postopkov potrjevanja izdatkov v okviru prvostopenjskih kontrolnih enot v Italiji in Sloveniji ter skladno s prošnjama, ki sta ju vodji kontrolnih enot posredovali OU, je le-ta sprejel sklep št. 3356 z dne 9. novembra 2012, s katerim je 6 uslužbencev STS - 3 italijanske in 3 slovenske uslužbenke - dodelil omenjenima prvostopenjskima kontrolnima enotama do 10. decembra 2012.

Kot opredeljeno v O.P. in v skladu z določbami 14. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006 STS nudi tehnično pomoč OU, Revizijskemu organu in NO pri izvajanju njihovih nalog.

V obdobju poročanja se je dejavnost STS osredotočila predvsem na sledeče aktivnosti:

- pomoč OU pri pripravi / posodobitvi dokumentacije, ki jo določajo uredbe ES (Letna poročila o izvajanju na podlagi 67. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006) in priprava tehnične in administrativne programske dokumentacije (v zvezi z javnim razpisom za standardne projekte - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011: dokumentacija za čezmejne skupine ocenjevalcev za izvedbo postopka ocenjevanja kakovosti standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju, ki vključuje priročnik za ocenjevanje in ocenjevalne liste; predlog prednostnih lestvic standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju, ki jih je odobril NO na 12. redni seji v Novi Gorici, 6. julija 2012; časovni načrt Programa), ter dokumentacije za upravičence (navodila in priročniki za izvajanje projektov, skladno s seznamom dokumentov v poglavju »1.1.1 Programski dokumenti«);
- pomoč organom Programa, predvsem priprava dokumentacije in tehnična pomoč NO; tehnična pomoč Revizijskemu organu in Skupini revizorjev v skladu s 14. členom Uredbe (ES) št. 1080/2006;
- dopolnitve in spremembe dokumentacije za upravičence, ki zadeva javna razpisa št. 02/2009 in št. 03/2011, predvsem vzorca Pogodbe o dotaciji sofinanciranja med OU in VP za standardne projekte - javni razpis št. 02/2009 s prilogami, Pogodbe o partnerstvu med VP in projektnimi partnerji - javni razpis št. 03/2011 in vzorca Pogodbe o dotaciji

sofinanciranja med OU in VP za standardne projekte - javni razpis št. 03/2011 s prilogami;

- pomoč pri organizaciji:
 - dogodkov v sodelovanju z INTERACT-om (17. in 18. julija 2012 v Novi Gorici) - seminar z naslovom »Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS)«;
 - informativnih dogodkov, namenjenih promociji Programa pri širši javnosti: obeležitev Dneva evropskega sodelovanja z razpravo na socialnem omrežju Twitter (21.09.2012) (glej 6. poglavje tega poročila); predstavitevna stojnica na 44. Barkovljanki (»Villaggio Barcolana«) v Trstu s programom predstavitev sofinanciranih projektov (10.-14.10.2012);
 - organizacija tematskih delavnic za upravičence (npr. delavnice o poročanju, o izvajanju prvostopenjske kontrole, o spremembah na projektu, itd.):
 1. Izobraževalne delavnice o poročanju in prvostopenjski kontroli
 12. in 17. januarja v Ljubljani,
 26. januarja v Vidmu,
 4. maja 2012 v Benetkah,
 3. oktobra v Bologni.
 2. Predstavitev novih navodil za poročanje
 18. junija v Vidmu in
 21. junija v Novi Gorici.
 3. Delavnica za upravičence standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju - javni razpis št. 03/2011
 18. oktobra v Novi Gorici in
 25. oktobra v Vidmu.
 4. Delavnice o postopkih javnega naročanja (v sodelovanju z zunanjimi izvajalci)
 - 6.-12. novembra v Vidmu in
 - 10.-17. novembra 2012 v Benetkah.
- ocenjevanje projektnih predlogov, predloženih v okviru javnega razpisa št. 03/2011, v skladu s Priročnikom za ocenjevanje, odobrenem s strani NO; izobraževanje in usklajevanje italijanskih in slovenskih ocenjevalcev, ki sodelujejo v postopkih ocenjevanja kakovosti, v okviru posebnih izobraževalnih delavnic, organiziranih v Italiji in Sloveniji; priprava poročil o ocenjevanju, zapisnikov o postopku in predlogov prednostnih lestvic, ki se predložijo v odobritev NO;
- podpora upravičencem med celotnim trajanjem projekta, in sicer v zvezi s strateškimi projekti, predloženimi v okviru javnega razpisa št. 01/2009 ter standardnimi projekti, predloženimi v okviru javnega razpisa št. 02/2009 in št. 03/2011;



- posodabljanje sistema spremljanja Programa in implementacija le-tega v sodelovanju z zunanjim izvajalcem;
- stalno posodabljanje spletnih strani Programa.

Velja poudariti, da je bil postopek ocenjevanja projektov javnega razpisa št. 03/2011 dokaj zahteven in dolgotrajen, saj je potekal ves prvi semester leta 2012, in sicer zaradi koordinacije ocenjevanja in 69 ocenjevalcev s strani STS. Omenjeni ocenjevalci - 30 na italijanski strani (Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina) in 39 na slovenski strani - so sodelovali v postopku ocenjevanja kakovosti projektov.

Trenutno OU in STS nudita stalno pomoč VP 16 strateških projektov ter VP 51 standardnih projektov - predvsem v zvezi s prošnjami za spremembe projekta, s poročanjem o izdatkih in predložitvijo zahtevkov za izplačilo, ter VP 20 standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju, za katere je bilo odobreno sofinanciranje v okviru javnega razpisa št. 03/2011, in sicer v zvezi s sklenitvijo Partnerske pogodbe, s postopkom za podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja in številnimi prošnjami za spremembe projektov (glej tabelo s povzetkom postopka odločanja NO, ki se nanaša na javne razpise št. 01/2009, št. 02/2009 in št. 03/2011, v poglavju 2.1).

V zvezi z upravljanjem projektov velja izpostaviti, da je STS obravnaval 160 prošenj za spremembe projektov, ki so jih v teku izvajanja projektov predložili VP (83 prošenj VP strateških projektov javnega razpisa št. 01/2009, 71 prošenj VP standardnih projektov javnega razpisa št. 02/2009 in 6 prošenj VP standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju javnega razpisa št. 03/2011), in v zvezi s temi izvedel vsa potrebna vsebinska, finančna in administrativna preverjanja ter pridobil potrebna pojasnila in dopolnitve. Omenjene prošnje so zajemale več vrst sprememb, kot podrobneje navedeno v tabelah v poglavju 2.1.

Nadzorni odbor (NO)

V skladu s Poslovníkom NO in načelom letne rotacije predsedujočega NO, je v teku leta 2012 NO predsedovala Republika Slovenija.

NO se je v letu 2012 sestel enkrat: 12. redna seja od formalne ustanovitve tega organa je potekala v Novi Gorici 6. julija 2012.

Do datuma priprave pričujočega poročila se je v letu 2012 izvedlo še 9 dopisnih sej in v letu 2013 dodatnih 5 dopisnih sej. Dodatne informacije vsebuje 2. poglavje tega poročila.



Organ za potrjevanje (OP)

V nadaljevanju so navedeni podatki o certificiranih izdatkih in plačilih upravičencem.

V okviru izvajanja Programa so v letu 2012 vsi strateški projekti ter večina standardnih projektov poročali o izdatkih, ki so bili vključeni v 5 zahtevkov za plačilo, v skupni višini 18.550.139,64 EUR.

OP je, po zaključku aktivnosti za leto 2012, v mesecu februarju 2013 predložil Komisiji nov zahtevek za plačilo v višini 201.523,86 EUR. Zahtevek je vključeval izdatke, ki so nastali in so bili potrjeni v letu 2012 in jih zaradi pomanjkanja časa ni bilo mogoče vključiti v zadnji zahtevek za plačilo za leto 2012.

OP je poskrbel tudi za izplačilo sredstev italijanskega nacionalnega sofinanciranja upravičencem. Velja izpostaviti, da je pri tem je prišlo do zamud zaradi začasne prekinitve izplačil s strani Komisije³. V letu 2012 so bili namreč s strani Komisije izplačani le izdatki, vključeni v zahtevek za plačilo št. 7 z dne 14. decembra 2011. Kljub temu je OP upravičencem izplačal izdatke, ki so bili certificirani do novembra 2012, in sicer iz preostankov sredstev, izplačanih s strani Komisije iz naslova predplačil.

Slovensko nacionalno sofinanciranje je bilo po izdaji Izjav o potrjenih izdatkih redno izplačano upravičencem (glej tabelo C). Podatki o izplačilih sofinanciranja iz ESRR in italijanskega nacionalnega sofinanciranja pa so bili redno vneseni v sistem spremljanja Programa.

Spodnja tabela prikazuje podatke o certificiranih izdatkih, povrnjenih izdatkih (tabeli A in B) in izdatkih, ki so bili izplačani upravičencem s strani OP (tabela B).

³ Evropska komisija je zaradi pomanjkljivosti v sistemu upravljanja in nadzora (v smislu 1. točke 92. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006), povezane s prvostopenjskima kontrolnima enotama ter zaradi stopnje napake, ugotovljene s strani Skupnega revizijskega organa, ki je presegala 2%, določila prekinitev izplačil, ki je trajala od meseca aprila do meseca oktobra 2012.



Certificirani in povrnjeni izdatki (Tabela A)

Zahtevek za povračilo	Skupni certificiran znesek (v €)	od katerega			Povrnjen znesek ESRR (v €)	Povrnjen italijanski nac. delež (Zakon 183) (v €)
		ESRR (v €)	Italijanski nac. delež (v €)	Slovenski nac. delež (v €)		
predplačilo 2%					2.324.138,62	326.244,00
predplačilo 3%					3.486.207,93	489.336,00
predplačilo 2%					2.324.138,62	326.244,00
predplačilo 2%					2.324.138,62	326.244,00
Predplačila skupno					10.458.623,79	1.468.068,00
Vmesna plačila						
št. 1/17.12.2009	487.503,84	414.378,28	48.860,60	24.264,98	414.378,28	48.860,60
št. 2/20.12.2010	1.051.484,03	893.761,42	86.120,38	50.184,30	893.761,42	86.120,38
št. 3/15.03.2011	837.168,58	711.593,33	68.249,42	54.707,55	711.593,33	68.249,42
št. 4/19.04.2011	950.473,49	807.902,49	38.109,34	74.029,43	807.902,49	38.109,34
št. 5/21.07.2011	855.205,87	726.924,98	111.038,01	13.775,98	726.924,98	111.038,01
št. 6/14.10.2011	280.385,87	238.327,99	7.173,80	23.939,19	238.327,99	7.173,80
št. 7/14.12.2011	2.734.232,40	2.324.097,55	276.639,59	94.898,11	2.324.097,55	276.639,59
št. 8/20.12.2011	2.320.901,69	1.972.766,46	262.451,09	85.640,11	1.972.766,46*	262.451,09*
št. 9/20.12.2011	83.644,11	71.097,49	11.945,51	647,10	71.097,49*	11.945,51*
št. 10/20.09.2012	2.411.297,41	2.049.602,81	180.352,70	181.342,32	2.049.602,81*	180.352,70*
št. 11/07.11.2012	2.571.602,13	2.185.861,82	188.971,98	387.820,76		
št. 12/13.12.2012	5.534.080,27	4.703.968,23	436.479,64	387.820,76		
št. 13/21.12.2012	4.343.114,80	3.691.647,60	494.386,23	162.895,13		
št. 14/28.12.2012	3.690.045,03	3.136.538,30	222.549,23	330.959,13		
št. 15/13.02.2013	201.523,86	171.295,28	0	30.228,58		
Skupno certificirani izdatki - kumulativno	28.352.663,38	24.099.764,03	2.433.327,32	1.903.153,43		
Skupni povrnjeni izdatki - vključno s predplačili					20.669.076,59	2.559.008,44

Vir: Pripravi Organ za potrjevanje

*Zneski prejeti dne 18.01.2013.


Zneski izplačani upravičencem, vključno z izplačilom sofinanciranja za izdatke tehnične pomoči (Tabela B)

Leto	Namen	Sofinanciranje ESRR (v €)	Italijansko nacionalno sofinanciranje (v €)
2010	Predplačila	380.259,24	0
2011	Vmesna plačila	414.378,28	48.860,60
2011	Predplačila	797.860,69	0
2011	Vmesna plačila	3.378.507,80	310.690,91
2011	Predplačila	2.393.215,07	0
2012	Vmesna plačila	8.503.759,54	904.675,48
2013	Vmesna plačila	590.138,22	0
2013	Vmesna plačila	0	191.730,60
Skupaj plačano		16.458.118,84	1.455.957,59

Vir: Pripravil Organ za potrjevanje

Delež nacionalnega sofinanciranja, ki ga je slovenskim upravičencem izplačalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) (Tabela C)

Leto	Namen	Slovensko nacionalno sofinanciranje (v €)
2010	Vmesna plačila	47.129,75
2011	Vmesna plačila	208.134,58
2012	Vmesna plačila	457.661,43
Skupaj plačano		712.925,76

Vir: Pripravil STS na osnovi podatkov, posredovanih s strani slovenskega nacionalnega organa

Prejeti zneski in plačila po prednostnih nalogah na dan 31.12.2012 (vključno s predplačili) (Tab. D)

Prednostna naloga	Skupni certificirani zneski (v €)	Prejeti zneski ESRR (v €)	Plačani zneski ESRR (v €)
PREDPLAČILO		10.458.623,79	
1	3.804.481,44	1.805.073,76	5.097.021,03
2	3.280.229,75	1.862.797,53	4.796.357,56
3	2.532.614,31	1.209.808,87	3.938.879,49
4	2.394.971,79	1.239.305,88	2.035.722,54
Skupaj	12.012.297,29	16.575.609,83	15.867.980,62

Vir: Pripravil Organ za potrjevanje



Revizijski organ (RO)

Ta del vsebuje opis dejavnosti Revizijskega organa (v nadaljevanju RO) in Skupine revizorjev, ustanovljene v skladu z 2. odstavkom 14. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006, opravljenih v letu 2012.

Opis zadeva revizijsko dejavnost, ki je osnova za izdajo:

- a) Mnenja 2011 o izdatkih, certificiranih v letu 2010;
- b) Mnenja 2012 o izdatkih, certificiranih v letu 2011;
- c) Mnenja 2013 o izdatkih, certificiranih v letu 2012.

V zvezi z navedenim pod točko a), je skupni RO z dopisom št. 28634 z dne 27. decembra 2011, s pomočjo Skupine revizorjev, izdal mnenje brez zadržkov glede certificiranih izdatkov v letu 2010, neglede na stopnjo napake 2,41%, ki je bila višja od dovoljene (2%). Mnenje brez zadržkov temelji na osnovi različnih preverjenih elementov, in sicer visoke zanesljivosti sistema upravljanja in nadzora, visokega odstotka preverjenih izdatkov (30,63% izdatkov, certificiranih v letu 2010) ter na podlagi zneska neupravičenih izdatkov v višini 7.776,45 EUR, ki je glede na absolutno vrednost, zanemarljiv.

Službe Evropske komisije so z dopisom št. Ares(2012)226234 z dne 28. februarja 2012 in z dopisom št. Ares(2012)437692 z dne 11. aprila 2012, po seznanitvi o preseženi stopnji napake (2%), obvestile o prekinitvi izplačil, skladno s členom 91 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, in skupni RO zaprosile za zagotovila glede uvedbe korektivnih ukrepov za izboljšanje sistema upravljanja in nadzora ter za pripravo načrta prvostopenjskih kontrol, predvsem za preverjanje pravilnosti postopkov javnega naročanja. Z dopisom št. 7747 z dne 4. aprila 2012 je skupni RO dopolnil načrt ukrepov za izboljšavo, ki ga je že posredoval OU z dopisom št. 27656 z dne 15. decembra 2011.

RO je preveril in potrdil izvajanje korektivnih ukrepov z dopisom št. 12849 z dne 11. junija 2012 in z dopisom št. 20115 z dne 27. septembra 2012. Z dopisom št. Ares(2012)1286353 z dne 30. oktobra 2012 je Evropska komisija sporočila preklic prekinitve izplačil.

V zvezi z navedenim pod točko b), ki zadeva mnenje 2012 o izdatkih, certificiranih v letu 2011, so bili izvedene revizije sistema, načrtovane v okviru posodobljene Revizijske strategije, ki je bila posredovana Evropski komisiji 12. aprila 2012, ter revizije treh operacij, izbranih med tistimi s certificiranimi izdatki v letu 2011.

V spodnji tabeli so navedeni revidirani organi sistema upravljanja in nadzora, revidirana področja in stopnja zanesljivosti posameznih organov.



Organi, ki so izvedli revizijo sistema	Organi, ki so bili predmet revizije sistema	Obdobje revizije	Namen revizije	Stopnja zanesljivosti
Revizijski organ	Organ upravljanja	01.07.2011 - 03.02.2012	Preverjanje izvajanja priporočil v skladu z navedenimi v poročilih sistemske revizije za predhodna revizijska obdobja.	visoka
Revizijski organ	Skupni tehnični sekretariat	24.06.2011 - 02.02.2012	Skladnost in delovanje ključne zahteve št. 2 »Ustreznost postopkov za izbor operacij«, ključne zahteve št. 5 »Ustreznost revizijskih sledi« in ključne zahteve št. 6 »Zanesljivost računovodskega sistema, sistema spremljanja in finančnega poročanja«.	visoka
Revizijski organ	Organ za potrjevanje	24.06.2011 - 30.12.2011	Skladnost in delovanje ključne zahteve št. 2 »Ustreznost revizijskih sledi in informacijskih sistemov«, ključne zahteve št. 3 »Ustreznost ukrepov za zagotavljanje solidnosti certificiranja izdatkov« in ključne zahteve št. 4 »Ustreznost ukrepov za vodenje računovodske evidence o zneskih, ki jih je potrebno izterjati in o neupravičeno izplačanih zneskih«.	visoka

V okviru navedenih revizij je bila ugotovljena visoka stopnja zanesljivosti sistema upravljanja in nadzora v celoti. Revizijska strategija za Program določa, da se v primeru visoke stopnje zanesljivosti vzorči 10% certificiranih operacij. Izbrani sta bili 2 operaciji (SIGMA2 in OPENMUSEUMS) od 18 strateških projektov, za katere so bili izdatki certificirani v letu 2011. Omenjenemu vzorcu je bila dodana operacija tehnične pomoči, ki na podlagi finančnih parametrov, določenih v Revizijski strategiji, spada med t.i. »high value« operacije. Revidirane so bile torej 3 operacije v skupnem znesku 2.249.935,27 EUR, kar predstavlja 28,20% skupnih certificiranih izdatkov v letu 2011 (t.j. 7.978.367,90 EUR).

Revidirane operacije vključujejo skupaj 19 partnerjev, za katere so bili izdatki certificirani v letu 2011:

- SIGMA2: 11 partnerjev, od tega 3 v Republiki Sloveniji, 1 v Deželi Emilia Romagna, 2 v Deželi Veneto in 5 v Deželi Furlaniji Julijski krajini.
- OPENMUSEUMS: 6 partnerjev, od tega 2 v Deželi Emilia Romagna, 2 v Deželi Veneto, 2 v Deželi Furlaniji Julijski krajini in noben v Republiki Sloveniji.



- Tehnična pomoč: 2 partnerja, od tega 1 v Deželi Furlaniji Julijski krajini in 1 v Republiki Sloveniji.

V okviru revizij operacij so bili ugotovljeni neupravičeni izdatki v višini 167.630,59 EUR. Stopnja napake za celotno programsko območje je 7,45%. Skupina revizorjev je na sestanku z dne 5. decembra 2012 analizirala naravo napak, skladno z dokumentom COCOF 11-0041-01-EN »Guidance on treatment of errors disclosed in the annual control reports« in zaključila, da sta dve napaki izjemne narave. Napaki, ki ju je ugotovil RO Republike Slovenije v zvezi z javnim naročilom gradnje visoke vrednosti v okviru podprojekta št. 1428 operacije Sigma2 - vodilni partner Univerza na Primorskem, Znanstveno - raziskovalno središče Koper, sta nastali zaradi različnih razlogov. Prva nepravilnost v vrednosti 65.313,29 EUR je nastala zaradi nedobavljenega blaga upravičencu s strani podizvajalca, ki je šel v stečaj. Skupina revizorjev je ugotovila, da gre v primeru omenjene napake za izjemo, saj je le-ta nastala zaradi izrednih, neponovljivih okoliščin. Druga nepravilnost, v višini 97.235,80 EUR, je posledica neupoštevanja pravil o obveščanju pri javnem naročilu gradnje, ki presega mejno vrednost. Skupina revizorjev je ugotovila, da gre pri tem za napako enega samega upravičenca, ki je prvotno upošteval pravila o obveščanju in javni razpis pravilno objavil v Uradnem listu EU, nato pa je spremembo razpisnih pogojev objavil le v nacionalnem Uradnem listu. Po ugotovljeni nepravilnosti v okviru postopka oddaje javnega naročila, ki presega mejno vrednost, je skupni RO z dopisom št. 23630 z dne 15. novembra 2012 zahteval, da OU preveri obstoj morebitnih drugih javnih naročil gradenj, storitev ali blaga, ki presegajo mejno vrednost, na slovenskem in na italijanskem območju. Z dopisom št. 23827 z dne 4. decembra 2012 je OU sporočil rezultat preverjanja, ki ga je izvedel tako pri italijanskih, kot pri slovenskih upravičencih. Poleg javnega naročila nad mejno vrednostjo, vključenega v vzorec za leto 2011, je bilo ugotovljeno še eno javno naročilo za nakup blaga, ki je bilo predmet revizije 2012/REGIO/J3/1002/1 s strani Evropske komisije in je bilo opredeljeno kot ustrezno. Po izvedenem preverjanju in analizi podatkov ter informacij, pridobljenih s strani OU, je Skupina revizorjev ugotovila, da kršenje pravil o obveščanju o javnih naročilih v okviru podprojekta št. 1428 predstavlja izjemno napako, ki ni systemske narave. Skupni znesek obeh nepravilnosti znaša 162.549,09 EUR (65.313,29 EUR in 97.235,80 EUR).

V okviru izračuna stopnje napake sta bila znesek 388.943,20 EUR, ki predstavlja vrednost pogodbe za izvedbo del v okviru javnega naročila pri katerem so bile ugotovljene nepravilnosti, in znesek 162.549,09 EUR, odšteta od vrednosti vzorca in revidiranih izdatkov. Stopnja napake znaša 0,27% vrednosti vzorca, kot prikazano v spodnji tabeli:



Operacija	Znesek vzorčenih izdatkov za leto 2011 (v €) A	Znesek neupravičenih izdatkov (v €) B	Stopnja napake pred preverjanjem narave napake B/A	Znesek nepravilnosti, ki so bile opredeljene kot izjema (v €)	Znesek nepravilnosti, ki se nanašajo na naključne napake (v €) C	Znesek vzorčenih izdatkov, brez izjemne napake (v €) D	Stopnja napake po ugotovljeni naravi napake C/D	Število podprojektov z neupravičenimi izdatki
SIGMA2	754.203,87	163.558,07	21,69%	162.549,09	1.008,98	365.260,67*	0,28%*	4 od 11
OPENMUSEUMS	70.938,29	3.572,52	5,04%	/	3.572,52	70.938,29	5,04%	1 od 6
Tehnična pomoč	1.424.793,11	500,00	0,04%	/	500,00	1.424.793,11	0,04%	1 od 2
Skupaj	2.249.935,27	167.630,59	7,45%	162.549,09	5.081,50	1.860.992,07**	**0,27%	6 od 19

*Za izračun stopnje napake pri operaciji SIGMA2 je bil upoštevan znesek 365.260,67 EUR, ki predstavlja vrednost certificiranih izdatkov za to operacijo (754.203,87 EUR) z odšteto vrednostjo javnega naročila gradnje, pri katerem so bile ugotovljene izjemne napake (388.943,20 EUR).

**Pri izračunu stopnje napake za celotne revidirane izdatke smo upoštevali vrednost 1.860.992,07 EUR, ki predstavlja vrednost vzorčenih izdatkov (2.249.935,27 EUR) z odšteto vrednostjo projekta, pri katerem so bili ugotovljeni neupravičeni izdatki (388.943,20 EUR).

Ob upoštevanju visoke stopnje zanesljivosti sistema upravljanja in nadzora in stopnje napake <2%, je skupni RO z dopisom št. 26556 z dne 21. decembra 2012 izdal mnenje brez zadržkov za izdatke, certificirane v letu 2011.

Na dan priprave tega poročila je RO prejel dopis Evropske komisije št. Ares(2013)373917 z dne 19. marca 2013 o sprejetju Letnega revizijskega poročila in mnenja za leto 2012. Komisija podala pripombo glede nepravilnosti (nedobavljeno blago upravičencu s strani izvajalca, ki je šel v stečaj), ki je bila ugotovljena v okviru revizij operacij in obravnavana kot izjemna napaka. Komisija namreč meni, da ni bilo podanih zadostnih utemeljitev in je zahtevala spremembo prvotno ugotovljene stopnje napake in vključitev omenjene ugotovljene nepravilnosti v izračun le-te. Podrobnejše informacije s končnim izidom postopka bodo vključene v poročilu o izvajanju za leto 2013.

V zvezi s točko c), ki se nanaša na mnenje za leto 2013 o izdatkih, certificiranih v letu 2012, velja izpostaviti, da se v posameznem koledarskem letu pokrivajo revizijske aktivnosti dveh različnih revizijskih obdobj. S 1. julijem 2012 se je pričelo šesto revizijsko obdobje, ki traja od 1. julija 2012 do 30. junija 2013; mnenje o izdatkih, certificiranih v letu 2012 pa je potrebno predložiti do konca decembra 2013.

Omenili smo že revizijo OU, ki je potekala v letu 2012 v zvezi s korektivnimi in ukrepi za izboljšavo sistema upravljanja in nadzora, ki jih je uvedel OU. Revidirani sta bili tudi italijanska in slovenska prvostopenjska kontrolna enota, in sicer v zvezi z izvajanjem dodatnih kontrol postopkov javnega naročanja. Skupni RO in RO Republike Slovenije sta preverila učinkovito delovanje prvostopenjske kontrolne enote in izvedla revizijo treh postopkov prvostopenjske kontrole. V okviru revizije je bila potrjena njihova pravilnost.



Pozitivna ocena sistema upravljanja in nadzora je bila potrjena na sestanku Skupine revizorjev z dne 5. decembra 2012, vključno z zahtevo o ukrepu za izboljšavo prvostopenjske kontrole.

Omenjena pozitivna ocena je upoštevala tudi ugotovitve revizije št. 2012/REGIO/J3/1002/1 italijanske prvostopenjske kontrolne enote, ki jo je opravila Evropska komisija. V vmesnem revizijskem poročilu št. Ares (2012)711987 z dne 14. junija 2012 je v zvezi s ključno zahtevo št. 4 navedeno, da sistem deluje pravilno in da je potrebno uvesti določene izboljšave. V omenjenem dokumentu ni bilo ugotovljenih neupravičenih izdatkov za vzorec šestih operacij, ki so jih revizorji Komisije preverili na kraju samem.

Upoštevajoč visoko stopnjo zanesljivosti sistema upravljanja in nadzora je bilo vzorčenih 10% od skupno 65 operacij s certificiranimi izdatki v letu 2012, oziroma 6 operacij, skladno s kriterijem zaokroževanja, ki ga je Skupina revizorjev potrdila na že omenjenem sestanku z dne 5. decembra 2012. Izbrana sta bila 2 strateška projekta (CLIMAPARKS in PARSJAD) in 4 standardni projekti (WINE NET, SALTWORKS, ISO TO, MACC) v skupni vrednosti 2.272.008,04 EUR, kar predstavlja 12,19% certificiranih izdatkov, v skupni vrednosti 18.633.783,75 EUR, za leto 2012. Certificirani so bili izdatki 35 partnerjev, 11 na slovenskem območju, 10 v Deželi Emilia Romagna, 8 v Deželi Veneto in 6 v Deželi Furlaniji Julijski krajini.

Revizija operacij je trenutno v teku.



2. Pregled izvajanja Operativnega programa

2.1 Dosežki in analiza napredka

2.1.1 Informacije o fizičnem napredku Operativnega programa

V letu 2012 je 16 strateških projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 01/2009 in 51 standardnih projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 02/2009 v polnem izvajanju. Po zaključenem postopku ocenjevanja kakovosti (ki se je pričel 27.12.2011 z imenovanjem ocenjevalcev čezmejne delovne skupine (ČDSO) in se je zaključil 5. aprila 2012) je NO v okviru 12. redne seje, ki je potekala v Novi Gorici 6. julija 2012 odobril 20 standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju, ki se sofinancirajo iz sredstev javnega razpisa št. 03/2011. Vse Pogodbe o dotaciji sofinanciranja za projekte javnega razpisa št. 03/2011 so bile podpisane v letu 2012 (glej tabelo »Javni razpis št. 03/2011. Sofinancirani projekti in odobrena vrednost« v poglavju 2.1.2) in pričelo se je izvajanje projektnih aktivnosti tudi za to skupino projektov.

Po odobritvi projektov vseh treh skupin (strateških, standardnih in standardnih - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju), je NO na seji, ki je potekala 6. julija 2012, odobril tudi dodelitev preostanka sredstev Programa, z namenom krepitev izvajanja Programa in zagotavljanja predvidene letne ciljne porabe sredstev.

V zvezi s 1. in 3. prednostno nalogo je NO odobril dodelitev preostankov sredstev omenjenih prednostnih nalog za sofinanciranje dodatnih upravičenih projektov, uvrščenih na prednostno lestvico navedenih prednostnih nalog javnega razpisa št. 02/2009. NO je ob tem odločil, da je dodelitev sredstev pogojena z izidom dveh sodnih postopkov. 10. in 20. septembra 2012 sta bili pritožbi, vloženi na Deželno upravno sodišče Furlanije Julijske krajine s strani prijaviteljev projektov MODEF in CAMAA, umaknjeni in po formalni odpovedi sporu je bilo sofinanciranje obeh projektov odobreno v celoti, saj sta bila opisa stroškovnih načrtov spremenjena oz. prilagojena višini razpoložljivih sredstev.

V zvezi z 2. prednostno nalogo je NO sprejel odločitev o dodelitvi preostankov sredstev v višini 600.000,00 EUR za sofinanciranje dodatnih upravičenih projektov na prednostni lestvici omenjene prednostne naloge javnega razpisa št. 03/2011, in sicer za sofinanciranje projekta RURAL v celoti ter za delno sofinanciranje projekta EnjoyTour, skladno z določili 8. točke 16. poglavja javnega razpisa za predložitev standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011.



Odobreni projekti v okviru javnih razpisov št. 01/2009, 02/2009 in 03/2011 po posameznih prednostnih nalogah - skupna vrednost in povprečna vrednost projektov v okviru posameznega razpisa.

Javni razpis št.	Prednostna naloga	Št. odobrenih projektov na dan 31.12.2012	Skupna vrednost projektov (v €)	Povprečna vrednost projekta (v €)
01/2009	1	6	50.946.804,08	3.184.175,25
	2	5		
	3	5		
Skupaj		16		
02/2009	1	20	58.972.603,52	1.156.325,56
	2	17		
	3	14		
Skupaj		51		
03/2011	1	5	18.164.383,99	908.219,20
	2	9		
	3	6		
Skupaj		20		
Skupaj		87	128.083.791,59	

Vir: pripravil STS

Izvajanje priporočil in korektivnih ukrepov, skladno z revizijami sistemov in operacij, ki so bile opravljene v letu 2012 na osnovi člena 62.1 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, je opisano v prejšnjem poglavju 1.2, v delu, ki se nanaša na dejavnost RO.

Kar zadeva tehnično pomoč je NO odobril predlagane posodobitve finančnega načrta v okviru 12. seje, ki je potekala 6. julija 2012, in sicer možnost sofinanciranja iz sredstev za tehnično pomoč potnih stroškov in nastanitve za udeležbo sej za člane NO z volilno pravico, ter predlog povišanja prejemkov za italijanske sodelavce STS, skladno s sklepi, sprejetimi na 11. seji NO. Med izdatke za delo zaposlenih (BL1) sta bili vključeni dve novi postavki: 1.03 - izdatki za morebitno nadurno delo in službene poti organov Programa in zaposlenih v italijanski prvostopenjski kontrolni enoti ter 1.05 - izdatki za delo zaposlenih v italijanski prvostopenjski kontrolni enoti. Kljub opisanim spremembam skupni obseg sredstev, namenjenih projektu tehnične pomoči, ostaja nespremenjen.

V zvezi s sredstvi tehnične pomoči velja izpostaviti, da je OU izvedel dve dopisni seji (dopisna seja št. 37 - 2012 in št. 40 - 2013, ki se je zaključila uspešno) za potrditev spremembe projekta Tehnične pomoči št. 4TA03-2009, in sicer dodelitve zneska v višini 124.380,31 EUR za pričetek novega programskega obdobja čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo 2014-2020. Sredstva bodo namenjena pripravi predhodnega vrednotenja, posodobitvi celovite presoje vplivov na okolje, aktivnostim v pomoč in podporo delovni skupini v ustanavljanju in pripravi novega O.P.

Kot že navedeno v poglavju 1.2, je OU v letu 2012 izvedel tri postopke za oddajo javnih naročil in sicer je bila sklenjena pogodba za opravljanje storitev prevajanja, pogodba za izobraževalne storitve (izobraževalne delavnice na temo javnega naročanja - javna naročila gradenj in/ali storitev pod pragom EU ter drugi postopki javnega naročanja blaga in storitev v skladu s 125. členom italijanskega zakona o javnem naročanju) ter pogodba za sprotno vrednotenje Programa za obdobje 2012-2015.



V zvezi s sprotnim vrednotenjem Programa za obdobje 2012-2015 je OU v Uradnem listu Republike Italije št. 46 z dne 20. aprila 2012 objavil razpis za oddajo javnega naročila za opravljanje storitev vrednotenja. V okviru odprtega postopka OU ni prejel nobene ponudbe in je zato 20. junija 2012 pričel nov postopek oddaje javnega naročila s pogajanjem, z istimi začetnimi pogoji, skladno z 2. točko 57. člena zakonodajnega odloka št. 163/2006, z naknadnimi spremembami in dopolnitvami, in na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, skladno s 83. členom zakonodajnega odloka št. 163/2006 z naknadnimi spremembami in dopolnitvami. 26. septembra 2012 je bilo za izvedbo storitev izbrano začasno združenje podjetij »GRETA Associati in MK Projekt« iz Benetk. Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana 26. novembra 2012.

Na osnovi ugotovitev in priporočil v okviru revizij operacij, ki so bile opravljene v letu 2011, je OU 20. junija 2012 s preverjanjem ponudbe na trgu pričel postopek oddaje javnega naročila s pogajanjem (11. točka 125. člena zakonodajnega odloka št. 163/2006 z naknadnimi spremembami in dopolnitvami) za storitve izobraževanja upravičencev na področju javnih naročil gradenj in/ali storitev, ki ne presegajo mejne vrednosti EU ter javnih naročil blaga in storitev v skladu s 125. členom italijanskega zakona o javnem naročanju. Javno naročilo za izvedbo storitev je bilo oddano 12. septembra 2012 družbi SOGES iz Torina, ki je izvedla izobraževalne delavnice v mesecih novembru in decembru 2012 (glej poglavji 1.2 in 6).

Avgusta 2011 se je pričel postopek za oddajo javnega naročila prevajalskih storitev v okviru Programa, in sicer na podlagi merila najnižje cene, skladno s 125. členom zakonodajnega odloka št. 163 z dne 12. aprila 2006. Naročilo za izvajanje storitev je bilo 1. februarja 2012 oddano družbi VERTO GROUP d.o.o. iz Perugia, ki je pogodbo podpisala 12. junija 2012.

Sklenitev Pogodb o dotaciji sofinanciranja za vse odobrene projekte je omogočilo utrditev ukrepov za izboljšanje sistema upravljanja in nadzora; polna vzpostavitev aktivnosti spremljanja pa je omogočila spremljanje izvajanja projektov od začetka do zaključka projekta.

V letu 2012 je OU s pomočjo STS okrepil spremljanje rezultatov posameznih projektov zaradi enotnega spremljanja napredka in doseganja splošnih in posebnih ciljev programskega obdobja. Z namenom informiranja in usposabljanja upravičencev so bila na uradni spletni strani Programa (www.ita-slo.eu) objavljena ustrezna navodila in informacije ter datumi organiziranih srečanj, seminarjev in delavnic.

Poleg omenjenega so bili objavljeni, kot že navedeno v poglavju 1.1 »Programski dokumenti«, tudi programski priročniki in navodila. V zvezi z ukrepi, sprejetimi v skladu z ugotovitvami revizij operacij v letu 2011 in namenjenimi izboljšavi sistema upravljanja in nadzora Programa, sta bila pripravljena 2 kontrolna lista (»Kontrolni list za kontrolo operacij na kraju samem, ki jo izvaja OU/STS« in »Kontrolni list za izvajanje kontrole kakovosti na kraju samem«), ki se uporabljata pri izvajanju kontrole na kraju samem in kontrole kakovosti s strani OU in STS.

Uvedene izboljšave v okviru Programa so bile predstavljene tudi na organiziranih srečanjih s posameznimi upravičenci ter na tematskih dogodkih in delavnicah.

V mesecu februarju 2013 je pričel delovati informacijski sistem »GOLD-MIS« za e-poročanje za standardne projekte, sofinancirane v okviru javnega razpisa št. 02/2009 in javnega razpisa št. 03/2011. Sistem nadomešča Excelove obrazce in omogoča samodejen prenos podatkov v informacijski sistem spremljanja MIS brez ponovnega vtiskovanja. Obenem sistem prispeva k zmanjševanju *gold platinga*, saj zmanjšuje administrativne obveznosti upravičencev in omogoča izmenjavo podatkov med deležniki in organi Programa. Razvoj in uporaba sistema je usmerjena tudi v prihajajočo programsko perspektivo 2014-2020.

**RAZPIS ŠT. 01/2009 ZA PREDLOŽITEV STRATEŠKIH PROJEKTOV**

V okviru javnega razpisa št. 01/2009 je bilo odobreno sofinanciranje 16 strateških projektov. Sofinanciranje 13 projektov je bilo odobreno na 16. dopisni seji NO z dne 15. aprila 2010. Sofinanciranje ostalih treh projektov (INTERBIKE, TRANS2CARE in OPENMUSEUMS) pa marca 2011 na 19. dopisni seji NO. Skupna vrednost sredstev za sofinanciranje strateških projektov znaša 50.946.804,08 EUR.

V nadaljevanju sledi seznam projektov po prednostnih nalogah, sofinanciranih v okviru javnega razpisa za strateške projekte št. 01/2009. Podrobnejši finančni podatki so navedeni v poglavju 2.1.2.

Javni razpis št. 01/2009. Odobreni projekti: specifični cilj - prednostna naloga in operativni cilj.

Specifični cilj - Prednostna naloga	Operativni cilj	Akronim projekta	Naslov projekta
1	1.1	CLIMAPARKS	Cambiamenti climatici e gestione delle aree protette / Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij
1	1.1	SIGMA 2	Rete transfrontaliera per la gestione sostenibile dell'ambiente e la biodiversità / Čezmejna mreža za sonaravno upravljanje okolja in biotske raznovrstnosti
1	1.2	SAFE-PORT	Il porto e la gestione dei rischi industriali ed ambientali / Obvladovanje industrijskih in okoljskih tveganj v pristanišču
1	1.3	ADRIA A	Accessibilità e sviluppo per il ri-lancio dell'area dell'Adriatico interno / Razvoj dostopnosti za oživitev jadranskega zaledja
1	1.3	INTERBIKE	Rete ciclistica intermodale transfrontaliera / Čezmejne intermodalne kolesarske povezave
1	1.4	CARSO - KRAS	Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kohezija
2	2.1	ICON	Competitività delle PMI - Innovazione e cooperazione tra imprese / Konkurenčnost MSP - Inovativnost in kooperativno podjetništvo
2	2.1	KNOW US	Co-generazione di conoscenza competitiva tra le università e le PMI / Soustvarjanje konkurenčnega znanja med univerzami in MSP
2	2.2	SLOWTOURISM	Valorizzazione e promozione di itinerari turistici "slow" tra l'Italia e la Slovenia / Valorizacija in promocija turističnih "slow" poti med Italijo in Slovenijo
2	2.3	CITIUS	Centro Interregionale di Tecnologie Fotoniche Ultra-veloci per la Spettroscopia / Medregijski center za ultrahitre fotonske tehnologije v spektroskopiji
2	2.3	TRANS2CARE	Transregional Network for Innovation and Technology Transfer to Improve Health Care / Rete Transregionale per l'Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico per il Miglioramento della Sanità / Transregionalno omrežje za inovacijo in prenos tehnološkega znanja za izboljšanje zdravstva
3	3.2	JEZIK-LINGUA	Plurilinguismo quale ricchezza e valore dell'area transfrontaliera italo-slovena / Večjezičnost kot bogastvo in vrednota čezmejnega slovensko-italijanskega območja
3	3.2	OPENMUSEUMS	Musei sloveni e italiani in rete / Mreža slovenskih in italijanskih muzejev
3	3.2	PARSJAd	Parco Archeologico dell'Alto Adriatico / Arheološki parki severnega Jadrana
3	3.2	SHARED CULTURE	Progetto per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio culturale condiviso / Projekt za poznavanje in dostopnost skupne kulturne dediščine
3	3.3	E-HEALTH	E-Health nella macroarea transfrontaliera / E-Zdravje na čezmejnem območju

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

V poglavju 2.1.2, v delu, ki se nanaša na javni razpis št. 01/2009, so navedeni datumi podpisa Pogodb o dotaciji sofinanciranja med OU in VP strateških projektov.

Na dan priprave tega Letnega poročila se v okviru projektov izvajajo aktivnosti, predvidene v posameznih delovnih sklopih. Aktivnosti, izvedene v obdobju, ki ga zajema Letno poročilo se nanašajo, na primer, na koordinacijo in upravljanje projekta ter na posamezne projektne dejavnosti.

V zvezi z upravljanjem strateških projektov so aktivnosti STS zajemale stalno pomoč 16 VP, predvsem pri postopkih uveljavljanja večjih sprememb, pregledovanjem vmesnih poročil VP in zahtevkov za izplačilo, reševanjem specifičnih težav, povezanih z izvajanjem projektnih aktivnosti (na primer v povezavi z zahtevkom za predplačilo, z izvajanjem postopkov javnega naročanja, s postopki za pridobitev služnosti ali začasne uporabe nepremičnin ali pridobitve ustreznih dovoljen za izvedbo investicij, itd.).

V letu 2012 so bili zelo zahtevni za STS postopki, povezani z uveljavljanjem večjih sprememb, za katere lahko v teku izvajanja projekta zaprosi VP, tudi v imenu ostalih PP. V tabeli so navedeni podatki o številu zahtevanih in odobrenih sprememb s strani OU in NO za projekte, sofinancirane v okviru javnega razpisa št. 01/2009.

Javni razpis št. 01/2009. Spremembe projekta, za katere so zaprosili VP.

Pred. naloga	Akronim projekta	Št. prošelj za spremembe	Vrsta spremembe, skladno s 4. in 7. členom					
			Pogodbe o dotaciji sofinanciranja					
			Spremembe partnerstva	Spremembe med kategorijami izdatkov	Spremembe v letni dinamiki	Spremembe delov B.5 in E prijavnice	Podaljšanje trajanja projekta	Aktivnosti izven upr. območja
PN 1	Climaparks	6	1	5	5	0	0	0
	Sigma 2	6	1	2	1	1	1	2
	Carso - Kras	8	1	6	5	2	1	2
	Adria A	6	2	4	2	0	0	1
	Safeport	2	1	2	0	0	0	0
	Interbike	2	0	1	1	0	0	1
PN 2	Slowtourism	5	1	5	0	0	1	3
	Citius	4	1	3	0	0	0	0
	Icon	15	1	8	0	2	1	6
	Know Us	3	1	2	0	0	1	0
	Trans2Care	3	0	3	3	0	0	0
PN 3	Jeziklingua	5	0	4	1	0	1	0
	E-Health	8	1	8	1	0	1	0
	Shared Culture	5	0	4	0	1	1	0
	Parsjad	3	0	3	0	0	1	2
	Openmuseums	2	1	2	1	0	0	0
Skupaj - strateški projekti		83	12	62	20	6	9	17

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih



RAZPIS ŠT. 02/2009 ZA PREDLOŽITEV STANDARDNIH PROJEKTOV

V okviru javnega razpisa za predložitev standardnih projektov je bilo odobreno sofinanciranje 51 projektov v skupni vrednosti 58.972.603,52 EUR. Postopek odobritve prvih 49 projektov se je pričel na 10. redni seji NO z dne 29. julija 2011 in se je zaključil 18. oktobra 2011 na 11. redni seji NO (glej Letno poročilo o izvajanju 2011).

Prijavitelja dodatnih dveh projektov (MODEF, CAMAA), za katere sofinanciranje prvotno ni bilo odobreno zaradi pomanjkanja razpoložljivih sredstev za sofinanciranje v celoti, sta v mesecu novembru 2011 na Deželno upravno sodišče Furlanije Julijske krajine vložila pritožbi zoper sklep NO z dne 29. julija 2011 (podrobnejše informacije o pritožbah vsebuje Letno poročilo o izvajanju 2011 v poglavju 2.3).

NO je na 12. redni seji, 6. julija 2012, sprejel odločitev o dodelitvi preostankov sredstev prednostne naloge 1 in prednostne naloge 3 javnega razpisa št. 02/2009 za sofinanciranje dodatnih upravičenih projektov, uvrščenih na prednostno lestvico prednostnih nalog 1 in 3 (t.j. projekta MODEF in CAMAA). NO je ob tem odločil, da je dodelitev sredstev pogojena z izidom pritožbenih postopkov.

NO je obenem določil, da je potrebno Opis stroškovnega načrta obeh projektov spremeniti oz. prilagoditi višini razpoložljivih sredstev, da se na ta način omogoči sofinanciranje projektov v celoti.

10. in 20. septembra 2012 sta prijavitelja pritožbi, vloženi na Deželno upravno sodišče Furlanije Julijske krajine umaknili in izpolnili pogoj NO za odobritev sofinanciranja.

Na dan priprave tega poročila so bile podpisane Pogodbe o dotaciji sofinanciranja med OU in VP standardnih projektov za vseh 51 projektov. V poglavju 2.1.2, v delu, ki se nanaša na javni razpis št. 02/2009, so navedeni datumi podpisa Pogodb o dotaciji sofinanciranja.

Projekti so trenutno v fazi izvajanja aktivnosti, predvidenih v posameznih delovnih sklopih.

Sledi seznam projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa za standardne projekte št. 02/2009, po prednostnih nalogah. Podrobnejši finančni podatki so navedeni v poglavju 2.1.2.

Javni razpis št. 02/2009. Odobreni projekti: specifični cilj - prednostna naloga in operativni cilj.

Specifični cilj - Prednostna naloga	Operativni cilj	Akronim projekta	Naslov projekta
1	1.1	SALTWORKS	Valorizzazione ecosostenibile delle saline tra Italia e Slovenia / Ekološko trajnostno vrednotenje solin med Italijo in Slovenijo
1	1.1	BioDiNet	Rete per la conservazione della biodiversità e del paesaggio culturale / Mreža za varovanje biotske raznovrstnosti in kulturne krajine
1	1.1	ADRIAWET 2000	Adriatic wetlands for nature 2000 / Zone umide dell'adriatico per Natura 2000 / Jadranska mokrišča za omrežje Natura 2000
1	1.1	TESSI	Teaching Sustainability across Slovenia and Italy / Educare alla Sostenibilità in Slovenia ed in Italia / Poučevanje trajnosti v Sloveniji in Italiji



Specifični cilj - Prednostna naloga	Operativni cilj	Akronim projekta	Naslov projekta
1	1.2	GOTRAWAMA	Gestione delle acque transfrontaliere delle aree urbane di Gorizia e Nova Gorica / Čezmejni sistem za upravljanje z vodami na urbanem območju Gorice in Nove Gorice
1	1.2	FUTURELIGHTS	L'illuminazione del futuro / Javna razsvetljava prihodnosti
1	1.2	ASTIS	Acque Sotterranee e di Transizione Isonzo-Soča / Podzemne vode čezmejnih vodonosnikov Isonzo-Soča
1	1.2	EnergyViLLab	Network di Living Lab virtuosi nel risparmio energetico e nello sviluppo di fonti di energia rinnovabili / Mreža virtuosnih živih laboratorijev za varčno rabo energije in razvoj obnovljivih virov energije
1	1.2	ISO - TO	Collaborazione transfrontaliera per il miglioramento ambientale e territoriale, la tutela e gestione coordinata del bacino idrografico dell'Isonzo-Soča mediante la depurazione ed il collettamento delle acque reflue urbane - Comune di Tolmin / Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda - Občina Tolmin
1	1.2	ISO - PRA	Collaborazione transfrontaliera per il miglioramento ambientale e territoriale, la tutela e gestione coordinata del bacino idrografico dell'Isonzo-Soča mediante la depurazione ed il collettamento delle acque reflue urbane - Comune di Pradamano / Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda - Občina Pradamano
1	1.2	ISO-PRE	Collaborazione transfrontaliera per il miglioramento ambientale e territoriale, la tutela e gestione coordinata del bacino idrografico dell'Isonzo-Soča mediante la depurazione ed il collettamento delle acque reflue urbane - Comune di Premariacco / Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda - Občina Premariacco
1	1.2	ISO-GIO	Collaborazione transfrontaliera per il miglioramento ambientale e territoriale, la tutela e gestione coordinata del bacino idrografico dell'Isonzo-Soča mediante la depurazione ed il collettamento delle acque reflue urbane - Comune di San Giovanni al Natisone / Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda - Občina San Giovanni al Natisone
1	1.2	ISO - RE	Collaborazione transfrontaliera per il miglioramento ambientale e territoriale, la tutela e gestione coordinata del bacino idrografico dell'Isonzo-Soča mediante la depurazione ed il collettamento delle acque reflue urbane - Comune di Remanzacco / Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda - Občina Remanzacco



Specifični cilj - Prednostna naloga	Operativni cilj	Akronim projekta	Naslov projekta
1	1.2	GEP	Joint Geo-Information System (GIS) for Emergency Protection of Drinking Water Resources / Sistema informativo territoriale (GIS) congiunto per la protezione delle risorse d'acqua potabile in casi di emergenza / Skupni geoinformacijski sistem (GIS) za varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih
1	1.2	ISO-PA	Collaborazione transfrontaliera per il miglioramento ambientale e territoriale, la tutela e gestione coordinata del bacino idrografico dell'Isonzo-Soča mediante la depurazione ed il collettamento delle acque reflue urbane - Comune di Pavia di Udine / Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda - Občina Pavia di Udine
1	1.2	HYDRO KARST	L'acquifero del Carso quale risorsa idrica strategica transfrontaliera / Kraški vodonosnik kot strateški čezmejni vodni vir
1	1.2	MODEF	Creazione e sperimentazione congiunta di modelli per l'ottimizzazione dell'utilizzo di energia fotovoltaica / Skupna izdelava in raziskava modelov za optimizacijo uporabe fotovoltaične energije
1	1.3	CroCTaL	Il paesaggio e le ciclovie transfrontaliere / Krajina in čezmejne kolesarske poti
1	1.3	TIP	Piattaforma Integrata Transfrontaliera / Čezmejna integrirana platforma
1	1.4	IDAGO	Miglioramento dell'accessibilità e dell'attrattiva / Izboljšanje dostopnosti in atraktivnosti
2	2.1	PROFILI	Creazione di una piattaforma transfrontaliera di servizi per il miglioramento dei Processi della Filiera allargata delle costruzioni edili / Oblikovanje čezmejne platforme storitev za izboljšanje procesov širšega področja gradbenih objektov
2	2.1	TRANSARMON	Armonizzazione delle normative a favore delle PMI transfrontaliere / Usklajevanje zakonodaje v korist čezmejnih MSP
2	2.2	Heritaste	Le vie dei saperi e dei sapori / Poti okusov in doživetij
2	2.2	AGROTUR	Agroturistica carsica / Kraški agroturizem
2	2.2	MOTOR	Incubatore turistico mobile / Mobilni turistični inkubator
2	2.2	UE LI JE II	Olio d'oliva: il simbolo della qualità nell'area transfrontaliera / Oljčno olje: simbol kakovosti v čezmejnem prostoru
2	2.2	LANATURA	Tradizione ed innovazione nell'utilizzo di materiali agrozootecnici / Tradicija in inovacije v uporabi živalskih materialov
2	2.2	SOLUM	Un comune percorso attraverso i sapori tradizionali / Skupna pot skozi tradicijo (in) okusov
2	2.2	T-lab	Laboratorio delle opportunità turistiche delle regioni transfrontaliere di Slovenia e Italia / Laboratorij turističnih priložnosti obmejnih regij Slovenije in Italije



Specificni cilj - Prednostna naloga	Operativni cilj	Akronim projekta	Naslov projekta
2	2.3	GLIOMA	Identificazione di nuovi marcatori di cellule staminali tumorali a scopo diagnostico e terapeutico / Določanje novih biomarkerjev možganskih tumorjev - gliomov za diagnozo in kot nove tarče zdravljenja
2	2.3	IPforSMEs	La integrazione transfrontaliera nella gestione della proprietà intellettuale (IP) come leva di competitività regionale / Vloga intelektualne lastnine (IP) pri oblikovanju regionalne dodane vrednosti skozi medregionalno izmenjavo IP
2	2.3	BELLIMPRESA	Razionalizzazione delle risorse interne e diffusione di una cultura di impresa mirate alla multifunzionalità ed alla sostenibilità economica delle aziende zootecniche / Razionalizacija notranjih virov in razširitev dobre rejske prakse, nanašajoče se na multifunkcionalno in trajnostno gospodarjenje na živinorejskih obratih
2	2.3	INNOVAQUA	Rete per l'innovazione tecnologica in acquacoltura / Omrežje za tehnološko inovacijo v ribogojstvu
2	2.3	WINE NET	Rete di cooperazione per il miglioramento delle qualità della filiera vitivinicola con soluzioni innovative / Kooperacijska mreža za izboljšanje kvalitete vinske industrije z inovativnimi solucijami
2	2.3	MACC	Creazione di un centro per il coordinamento, la ricerca e il restauro dell'arte moderna e contemporanea / Postavitev centra za koordinacijo, raziskave in restavracijo modernih in sodobnih umetnosti
2	2.4	STUDY CIRCLES	Laboratorio transfrontaliero di sviluppo delle risorse umane e delle reti di cooperazione per la valorizzazione delle risorse del territorio / Čezmejni laboratorij za razvoj človeških virov in mrež sodelovanja za ovrednotenje znanja in virov na območju
3	3.1	SIIT	School-oriented Interactive Identification Tools (SIIT): exploring biodiversity in a cross-border area. Strumenti interattivi per l'identificazione della biodiversità: un progetto educativo in un'area transfrontaliera / School-oriented Interactive Identification Tools (SIIT): exploring biodiversity in a cross-border area. Interaktivna določevalna orodja za šole: spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju
3	3.2	PESCA	Progetto di Educazione ad un Sano Consumo Alimentare / Projekt o vzgoji za zdravo prehrano
3	3.2	EDUKA	Educare alla diversità / Vzgajati k različnosti
3	3.2	ALISTO	Ali sulla storia / Na krilih zgodovine
3	3.2	Living Fountains	Ripristino dei pozzi e stagni nella zona transfrontaliera / Oživljanje vodnjakov in kalov v čezmejnem območju
3	3.2	LEX	Analisi, applicazione e sviluppo della tutela delle Minoranze in Italia e Slovenia / Analiza, izvajanje in razvoj zaščite narodnih skupnosti v Sloveniji in Italiji
3	3.2	CAMAA	Centro per le Architetture Militari dell'Alto Adriatico / Center za severno-jadransko vojaško arhitekturo



Specifični cilj - Prednostna naloga	Operativni cilj	Akronim projekta	Naslov projekta
3	3.3	JULIUS	Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale e utilizzo congiunto di infrastrutture sportive nell'area transfrontaliera dalle Alpi Giulie all'Adriatico / Raba in ovrednotenje kulturne dediščine ter skupna uporaba športne infrastrukture na čezmejnem območju od Julijskih Alp do Jadrana
3	3.3	IntegrAid	Approccio integrato al miglioramento dell'assistenza medica d'urgenza / Integriran pristop k izboljšanju nujne medicinske pomoči
3	3.3	PANGeA	Attività fisica e nutrizione per un invecchiamento di qualità / Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje
3	3.3	SIGN	Network genetico sloveno-italiano / Slovensko italijanska genetska mreža
3	3.3	e-surgerynet	Rete Chirurgica in macroarea transfrontaliera / Kirurška mreža na razširjenem čezmejnem območju
3	3.3	e-cardionet	Rete Cardiologica in macroarea transfrontaliera / Kardiološka mreža na širšem čezmejnem območju
3	3.3	SEA	Social economy agency agenzia per l'economia sociale / Agencija za socialno ekonomijo
3	3.3	S.HO.W.	Social HOusing Watch - Osservatorio sperimentale delle politiche di Social Housing in relazione alle politiche di welfare / Social HOusing Watch - Poskusni observatorij politik Socialnih Stanovanj v razmerju s politikami socialne blaginje

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

V zvezi z upravljanjem standardnih projektov so aktivnosti STS v letu 2012 zajemale stalno pomoč 49 VP, predvsem pri postopkih uveljavljanja večjih sprememb, pregledovanjem vmesnih poročil VP in zahtevkov za izplačilo, reševanjem specifičnih težav, povezanih z izvajanjem projektnih aktivnosti (na primer v povezavi z zahtevkom za predplačilo, z izvajanjem postopkov javnega naročanja, s postopki za pridobitev služnosti aličasne uporabe nepremičnin ali pridobitve ustreznih dovoljen za izvedbo investicij, itd.).

Zelo zahtevni za STS so bili v letu 2012 postopki povezani z uveljavljanjem večjih sprememb, za katere lahko v teku izvajanja projekta zaprosi VP, tudi v imenu ostalih PP. V tabeli so navedeni podatki o številu zahtevanih in odobrenih sprememb s strani OU in NO za projekte, sofinancirane v okviru javnega razpisa št. 02/2009.

Javni razpis št. 02/2009. Spremembe projekta, za katere so zaprosili VP.

Pred. naloga	Akronim projekta	Št. prošelj za spremembe	Vrsta spremembe, skladno s 4. in 7. členom					
			Pogodbe o dotaciji sofinanciranja					
			Spremembe partnerstva	Spremembe med kategorijami izdatkov	Spremembe v letni dinamiki	Spremembe delov B.5 in E prijavnice	Podaljšanje trajanja projekta	Aktivnosti izven upr. območja
PN 1	CroCTaL	2	2	0	2	2	0	0
	TIP	1	1	0	1	1	0	0
	SALTWORKS	1	0	1	1	0	0	0



Pred. naloga	Akronim projekta	Št. prošelj za spremembe	Vrsta spremembe, skladno s 4. in 7. členom					
			Pogodbe o dotaciji sofinanciranja					
			Spremembe partnerstva	Spremembe med kategorijami izdatkov	Spremembe v letni dinamiki	Spremembe delov B.5 in E prijavnice	Podaljšanje trajanja projekta	Aktivnosti izven upr. območja
PN 1	BioDiNet	0	0	0	0	0	0	0
	ISO - TO	0	0	0	0	0	0	0
	ISO - PRE	1	1	1	1	0	0	0
	GOTRAWAMA	0	0	0	0	0	0	0
	ISO - PRA	1	1	1	1	0	0	0
	ISO - GIO	1	1	1	1	0	0	0
	ISO - RE	1	1	1	1	0	0	0
	ISO - PA	1	1	1	1	0	0	0
	GEP	2	0	2	1	0	0	0
	ASTIS	0	0	0	0	0	0	0
	IDAGO	0	0	0	0	0	0	0
	ADRIAWET 2000	2	2	0	2	1	0	0
	EnergyViLLab	2	2	1	1	2	0	0
	FUTURELIGHTS	0	0	0	0	0	0	0
	HYDRO KARST	1	1	1	1	1	0	0
	TESSI	0	0	0	0	0	0	0
	MODEF	0	0	0	0	0	0	0
PN 2	PROFILI	2	1	1	1	1	0	0
	MACC	3	3	0	3	3	0	0
	MOTOR	1	0	1	1	0	0	1
	WINE NET	1	0	1	0	0	0	0
	AGROTUR	4	0	0	0	0	0	4
	Heritaste	1	1	0	1	1	0	0
	STUDY CIRCLES	1	0	1	1	0	0	0
	TRANSARMON	2	0	2	2	0	0	0
	UE LI JE II	1	0	1	1	0	0	0
	LANATURA	2	0	1	1	0	0	1
	IPforSMEs	1	0	1	0	0	0	0
	GLIOMA	2	0	1	0	0	0	1
	SOLUM	2	1	1	0	0	0	1
	T-lab	4	1	1	1	1	0	1
	INNOVAQUA	1	0	1	1	0	0	0
	BELLIMPRESA	1	0	1	1	0	0	0
PN 3	PESCA	1	1	0	1	0	0	0
	JULIUS	3	3	1	2	2	0	0
	EDUKA	3	0	3	1	0	0	0
	ALISTO	4	4	0	1	1	0	0



Pred. naloga	Akronim projekta	Št. prošelj za spremembe	Vrsta spremembe, skladno s 4. in 7. členom					
			Pogodbe o dotaciji sofinanciranja					
			Spremembe partnerstva	Spremembe med kategorijami izdatkov	Spremembe v letni dinamiki	Spremembe delov B.5 in E prijavnice	Podaljšanje trajanja projekta	Aktivnosti izven upr. območja
PN 3	IntegrAid	2	0	2	2	0	0	0
	Living Fountains	3	0	2	3	1	0	0
	LEX	2	0	2	2	0	0	0
	SIIT	1	1	0	0	0	0	0
	PANGeA	1	0	0	0	0	0	1
	SIGN	0	0	0	0	0	0	0
	e-surgerynet	1	1	1	1	0	0	0
	S.HO.W.	1	0	0	0	0	1	0
	SEA	4	0	3	1	0	0	1
	e-cardionet	0	0	0	0	0	0	0
	CAMAA	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj - standardni projekti		71	30	38	42	17	1	11

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

JAVNI RAZPIS ŠT. 03/2011 ZA PREDLOŽITEV STANDARDNIH PROJEKTOV - SREDSTVA NAMENJENA OŽJEMU KOPENSKEMU OBMOČJU

Javni razpis (skupna vrednost razpisanih sredstev: 17.564.389,92 EUR) je bil potrjen 11. marca 2011, v okviru 19. dopisne seje NO. Priložena razpisna dokumentacija, vključno s Priročnikom za ocenjevanje projektov, je bila odobrena na 20. dopisni seji NO, ki se je zaključila 1. aprila 2011.

Javni razpis in priloge k razpisu so bile objavljene v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine št. 14 z dne 6. aprila 2011 in Uradnem listu Republike Slovenije št. 26 z dne 8. aprila 2011. Do predvidenega roka (25. maja 2011) je prispelo 134 projektnih predlogov.

Velja izpostaviti, da so bila v zvezi s 3. in 4. točko 15. poglavja »Vloga in razpisna dokumentacija« javnega razpisa št. 03/2011 - različica v italijanskem jeziku - podana pojasnila, ki zadevajo rok do katerega morajo prispeti zahtevane dopolnitve in/ali pojasnila s strani prijaviteljev. NO je na 26. dopisni seji, ki se je pozitivno zaključila 9. septembra 2011, odobril omenjena pojasnila kot dopolnitev k besedilu javnega razpisa. Deželni odbor Furlanije Julijske krajine se je s sklepom št. 1675 z dne 15. septembra 2011 seznanil z odločitvijo NO. Dopolnitev javnega razpisa je bila objavljena v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine št. 38 z dne 21. septembra 2011.

NO je v okviru 28. dopisne seje, ki se je zaključila 22. decembra 2011, odobril seznam upravičenih projektnih predlogov, ki se posredujejo v ocenjevanje kakovosti, in neupravičenih projektnih predlogov po posamezni prednostni nalogi. Seznami so bili 23. decembra 2011 objavljeni na spletni strani Programa. 27. decembra so bili imenovani ocenjevalci čezmejne



delovne skupine (ČDSO) za izvajanje ocenjevanja kakovosti upravičenih projektnih predlogov, ki se je pričel 20. januarja 2012 in zaključil 5. aprila 2012.

NO je na 12. redni seji, ki je potekala v Novi Gorici 6. julija 2012, odobril prednostne lestvice projektov javnega razpisa št. 03/2011 po posameznih prednostnih nalogah. Za 7 projektov, za katere je bila ugotovljena najmanj 20% razlika med ocenama slovenskih in italijanskih ocenjevalcev (BIMOBIS, MINA, PRATICONS, LIVINGLADNSCAPE, ZBORZBIRK, AGRIKNOWS in ECHOS) je NO sprejel pogoje, ki jih je potrebno vključiti v Pogodbo o dotaciji sofinanciranja in posebne korektivne ukrepe za izboljšanje doseganja določenih meril v okviru projekta, vključno z morebitnimi spremembami stroškovnega načrta.

Datumi podpisa Pogodb o dotaciji sofinanciranja med OU in VP so navedeni v naslednjem poglavju 2.1.2 tega poročila v delu, ki se nanaša na javni razpis št. 03/2011 za standardne projekte - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju. Na dan priprave tega Poročila so omenjeni projekti v začetni fazi izvajanja predvidenih aktivnosti.

Sledi seznam projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa za standardne projekte št. 03/2011 - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju po prednostnih nalogah. Podrobnejši finančni podatki so navedeni v poglavju 2.1.2.

Javni razpis št. 03/2011. Odobreni projekti: specifični cilj - prednostna naloga in operativni cilj.

Specifični cilj - Prednostna naloga	Operativni cilj	Akronim projekta	Naslov projekta
1	1.1	TRECORALA	TREzze e CORalligeno dell'Alto Adriatico: valorizzazione e gestione sostenibile / Grebeni in koraligen severnega Jadrana: ovrednotenje in trajnostno upravljanje v Tržaškem zalivu
1	1.2	CAMIS	Attività coordinate per la gestione del fiume Isonzo, Coordinated activities for management of Isonzo Soča / Usklajene aktivnosti za upravljanje reke Soče, Coordinated activities for management of Isonzo Soča
1	1.2	ENRI	Energie rinnovabili e risparmio energetico per il terzo settore / Obnovljivi viri energije in energetska varčevanje za tretji sektor
1	1.3	BIMOBIS	Mobilità ciclistica tra la Slovenia e l'Italia / Kolesarska mobilnost med Slovenijo in Italijo
1	1.3	TRADOMO	Miglioramento dell'accessibilità sostenibile e della mobilità sul territorio del Programma Transfrontaliero / Izboljšanje trajnostne dostopnosti in mobilnosti na čezmejnem programskem območju
2	2.1	FARmEAT	Dal pascolo alla tavola: valorizzazione delle aree rurali transfrontaliere attraverso lo sviluppo della zootecnia sostenibile / Od paše do obložene mize: ovrednotenje čezmejnih kmetijskih območij z razvojem sonaravne živinoreje
2	2.1	NUVOLAK	Piattaforma imprenditoriale bilingue per il supporto alla realizzazione di iniziative imprenditoriali transfrontaliere / Dvojezična podjetniška spletna platforma za podporo pri realizaciji čezmejnih podjetniških priložnosti
2	2.1	OGV	Orti goriziani / Goriški vrtovi



Specifični cilj - Prednostna naloga	Operativni cilj	Akronim projekta	Naslov projekta
2	2.1	VISO	Viticultura sostenibile e valorizzazione delle risorse territoriali nella filiera vitivinicola / Ovrednotenje obmejnih potencialov trajnostnega vinogradništva v verigi od pridelovalca do potrošnika
2	2.2	ENJOY_TOUR	Buon appetito sulle strade del gusto transfrontaliere / Dober tek na čezmejnih poteh okusov
2	2.2	RURAL	Sviluppo transfrontaliero del turismo rurale e promozione congiunta dei prodotti tipici e di qualità tra i comuni di prepotto e kanal ob soči / Čezmejni razvoj turizma na podeželju in skupna promocija kakovostnih tipičnih izdelkov občin Prepotto in Kanal ob Soči
2	2.3	PROTEO	Il centro transfrontaliero per lo studio di proteine per la ricerca e la diagnostica oncologica / Čezmejni center za študij proteinov za onkološko raziskavo in diagnostiko
2	2.3	SHARTEC	Condivisione delle tecnologie innovative di produzione nelle regione transfrontaliera / Izmenjava inovativnih proizvodnih tehnologij v obmejnih regijah
2	2.4	MINA	Inquinanti Ambientali e Malattie Neurodegenerative: uno studio multidisciplinare basato su ricerca, formazione ed innovazione / Okoljski onesnaževalci in nevrodegenerativne bolezni: multidisciplinarna študija, ki temelji na raziskavah, usposabljanju in inovativnosti
3	3.1	Agri-Knows	Trasferimento delle conoscenze in agricoltura come valore aggiunto per la tutela dell'ambiente / Prenos znanja v kmetijstvu kot dodana vrednost pri zaščiti okolja
3	3.2	ECHOS	Echi transfrontalieri / Čezmejni odmevi
3	3.2	LIVING LANDSCAPE	Il Paesaggio vivo del Carso: un progetto di ricerca e formazione per riconoscere e valorizzare il patrimonio culturale e l'ambiente transfrontaliero / Živa krajina Krasa: raziskovalni in izobraževalni projekt na področju prepoznavanja in valorizacije čezmejne dediščine in okolja
3	3.2	POT MIRU - VIA DI PACE	Sentieri storici della Prima Guerra Mondiale dalle Alpi al Adriatico / Zgodovinske poti prve svetovne vojne od Alp do Jadrana
3	3.2	PratiCons	Pratiche di conservazione del patrimonio architettonico / Prakse konservatorstva arhitekturne dediščine
3	3.2	ZBORZBIRK	L'eredità culturale nelle collezioni fra Alpi e Carso / Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju

V zvezi z upravljanjem standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju - so aktivnosti STS v letu 2012 zajemale stalno pomoč 20 VP, predvsem pri postopkih priprave potrebne dokumentacije in sklenitve Pogodbe o partnerstvu ter Pogodbe o dotaciji sofinanciranja, pri postopkih uveljavljanja večjih sprememb, pregledovanjem vmesnih poročil VP in zahtevkov za izplačilo, reševanjem specifičnih težav, povezanih z izvajanjem projektnih aktivnosti (na primer v povezavi z zahtevkom za predplačilo, z izvajanjem postopkov javnega



naročanja, s postopki za pridobitev služnosti ali začasne uporabe nepremičnin ali pridobitve ustreznih dovoljen za izvedbo investicij, itd.).

V letu 2012 so bili zelo zahtevni za STS postopki povezani z uveljavljanjem večjih sprememb, za katere lahko v teku izvajanja projekta zaprosi VP, tudi v imenu ostalih PP. V tabeli so navedeni podatki o številu zahtevanih in odobrenih sprememb s strani OU in NO za projekte, sofinancirane v okviru javnega razpisa št. 03/2011 - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju.

Javni razpis št. 03/2011. Spremembe projekta, za katere so zaprosili VP.

Pred. naloga	Akronim projekta	Št. prošelj za spremembe	Vrsta spremembe, skladno s 4. in 7. členom					
			Pogodbe o dotaciji sofinanciranja					
			Spremembe partnerstva	Spremembe med kategorijami izdatkov	Spremembe v letni dinamiki	Spremembe delov B.5 in E prijavnice	Podaljšanje trajanja projekta	Aktivnosti izven upr. območja
PN 1	Trecorala	0	0	0	0	0	0	0
	BIMOBIS	0	0	0	0	0	0	0
	TRADOMO	0	0	0	0	0	0	0
	ENRI	0	0	0	0	0	0	0
	CAMIS	1	1	0	0	0	0	0
PN 2	SHARTEC	0	0	0	0	0	0	0
	FarMeat	0	0	0	0	0	0	0
	VISO	0	0	0	0	0	0	0
	NUVOLAK	1	0	1	0	0	0	0
	Mina	1	0	1	1	0	0	0
	OGV	0	0	0	0	0	0	0
	Proteo	1	0	1	1	0	0	0
	RURAL	0	0	0	0	0	0	0
	EnjoyTour	0	0	0	0	0	0	0
PN 3	POT MIRU - VIA DI PACE	0	0	0	0	0	0	0
	ZBORZBIRK	0	0	0	0	0	0	0
	LIVING LANDSCAPE	0	0	0	0	0	0	0
	AGRI-KNOWS	0	0	0	0	0	0	0
	PratiCons	1	1	0	0	0	0	0
	ECHOS	1	0	1	1	0	0	0
Skupaj - standardni projekti - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju		6	2	4	3	0	0	0

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju



OU in STS sta v letu 2012 obravnavala 6 zahtev za dostop do dokumentacije, ki so jih vložili prijavitelji projektnih predlogov v okviru javnega razpisa št. 03/2011, za katere ni bilo odobreno sofinanciranje. Podrobnejše informacije o omenjenih zahtevah so opisane v poglavju 2.3.

Povzetek odločanja NO, ki se nanaša na referenčno obdobje tega poročila.

29. dopisna seja 19. december 2011 - 4. januar 2012	Dopisna seja se ni zaključila uspešno. Programski partner Republika Slovenija ni izrazil soglasja k predlogu. Javni razpis za standardne projekte št. 02/2009. Dodelitev sredstev za odobritev in sofinanciranje dodatnih treh projektov. Predmet dopisne seje je bila dodelitev preostanka sredstev v okviru Programa. Stališča programskih partnerjev, ki so bila posredovana v zahtevanem roku so sledeča: italijansko Ministrstvo za finance ter Deželi Veneto in Emilia Romagna so 23., 27. in 30. decembra 2011 posredovali pozitivno mnenje k predlogu o dodelitvi preostanka sredstev, Republika Slovenija pa je 4. januarja 2012 posredovala le soglasje k predlogu, da OU nadaljuje s sodnim postopkom. Zaradi tega se je dopisna seja, katere predmet je bila dodelitev preostanka sredstev, neuspešno zaključila.
30. dopisna seja 29. februar - 8. marec 2012	Seja se je zaključila uspešno. Odobritev sprememb, za katere so zaprosili VP strateških projektov z akronimom ADRIA A, CARSO-KRAS, CLIMAPARSKS, SIGMA2 in SLOWTOURISM.
31. dopisna seja 28. marec - 4. april 2012	Seja se je zaključila uspešno. Odobritev sprememb partnerstva ter delov B.5 in E Prijavnice, za katere so zaprosili VP strateških projektov z akronimom SALTWORKS, ISO-TO, ISO-PRE, ISO-PRA, ISO-GIO, ISO-RE, ISO-PA, WINE NET, IPforSMEs, T-lab, SIIT, SIGN, GLIOMA in LIVING FOUNTAINS.
32. dopisna seja 24. maj - 7. junij 2012	Seja se je zaključila uspešno. Potrditev Letnega poročila o izvajanju 2011. Besedilo poročila je bilo dopolnjeno in spremenjeno v skladu s pripombami, ki so jih posredovali programski partner Republika Slovenija, Dežela Veneto in Dežela Emilia Romagna in se nanašajo na aktivnosti, ki so bile izvedene do datuma priprave poročila za leto 2011, t.j. 30. april 2012.
12. redna seja NO Nova Gorica, 6. julij 2012	1. Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 03/2011 - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju: odobritev končnih prednostnih lestvic; 2. Dodelitev preostankov sredstev Programa: odobritev; 3. Projekt tehnične pomoči: potrditev sprememb; 4. Pospešitev izvajanja Programa: stanje izvajanja in predlogi; 5. Kohezijska politika v novem programskem obdobju in nove uredbe; 6. Poročilo o reviziji s strani EK; 7. Poročilo o ugotovitvah revizij operacij, izvedenih v letu 2011; 8. Razno: □ Stanje izvajanja projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 01/2009; □ Vrednotenje Programa; □ Road Map; □ Drugo
33. dopisna seja 10. - 17. julij 2012	Seja se je zaključila uspešno. Potrditev predloga formule za znižanje sredstev v primeru samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti.



34. dopisna seja 24. september - 2. oktober 2012	Seja se je zaključila uspešno. Odobritev sprememb strateških projektov ICON in PARSJAd; odobritev sprememb partnerstva standardnih projektov javnega razpisa št. 02/2009: ENERGY VILLAB, JULIUS, PROFILI ter projekta javnega razpisa št. 03/2011: PratiCons; odobritev podaljšanja obdobja trajanja projektov PARSJAd, Jezik-Lingua in S.H.O.W.; informacija NO o spremembah projekta ADRIA A, ki jih je potrdil OU.
35. dopisna seja 29. oktober - 6. november 2012	Seja se je zaključila uspešno. Odobritev sprememb strateškega projekta KNOW US, odobritev sprememb partnerstva standardnega projekta - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju PROTEO, informacija NO o spremembah standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju TRADOMO in BIMOBIS ter odobritev podaljšanja obdobja trajanja strateškega projekta ICON.
36. dopisna seja 27. november - 4. decembru in nato podaljšana do 11. Decembra (na zahtevo programskega partnerja Republika Slovenija)	Seja se je zaključila uspešno. Odobritev popravka formule za izračun samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti.
37. dopisna seja 12. - 28. december 2012	Seja se ni zaključila uspešno, zaradi negativnega stališča projektnih partnerjev Dežela Veneto, Dežela Emilia Romagna in Republika Slovenija. Sprememba projekta Tehnične pomoči - začasna št. 4TA03-2009 za start-up PČS Slovenija-Italija 2014-2020. Dodelitev sredstev za pripravo predhodnega vrednotenja in operativnega programa.
38. dopisna seja 30. januar - 6. februar 2013	Seja se je zaključila uspešno. Odobritev sprememb partnerstva strateškega projekta E-HEALTH in standardnega projekta E-SURGERYNET. Odobritev podaljšanja obdobja trajanja strateških projektov E-HEALTH in SLOWTURISM. Odobritev sprememb standardnega projekta - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju MINA. Informacija NO o spremembah standardnega projekta HYDROKARST.
39. dopisna seja 19. - 26. februar 2013	Seja se je zaključila uspešno. Odobritev podaljšanja obdobja trajanja in sprememb strateškega projekta CARSO-KRAS. Informacija NO o spremembah strateškega projekta SLOWTOURISM in standardnih projektov javnega razpisa št. 02/2009: T-lab, IPforSMEs ter projekta javnega razpisa št. 03/2011: CAMIS.



40. dopisna seja 19. februar - 5. marec 2013	Seja se je zaključila uspešno. Odobritev sprememb projekta Tehnične pomoči - začasna št. 4TA03-2009 za koriščenje sredstev za pripravo novega programskega obdobja čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2014-2020. Dodelitev sredstev za pripravo predhodnega vrednotenja, operativnega programa in posodobitve celovite presoje vplivov na okolje.
41. dopisna seja 22. marec - 8. april 2013	Odobritev podaljšanja obdobja trajanja strateških projektov CLIMAPARKS, SHARED CULTURE in SIGMA2. Odobritev sprememb standardnega projekta T-lab, ki se nanašajo na del Prijavnice B.5. O odobritvi tega predloga bomo poročali v Letnem poročilu o izvajanju 2013.
42. dopisna seja 22. marec - 8. april 2013	Odobritev predloga o ponovni določitvi finančnih načrtov projektov, pri katerih so bile ugotovljene nepravilnosti, skladno z določili 98. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. O odobritvi tega predloga bomo poročali v Letnem poročilu o izvajanju 2013.



POSODOBLJENE VREDNOSTI KAZALNIKOV OPERATIVNEGA PROGRAMA

V nadaljevanju sledi seznam kazalnikov s posodobljenimi vrednostmi na dan 31.12.2012, ki so na podlagi O.P. razporejeni po naslednjih tipologijah:

- vsem projektom skupni kazalniki, ki izkazujejo stopnjo sodelovanja;
- kazalniki na programski ravni, ki so porazdeljeni na t.i. kazalnike za »horizontalna načela«;
- splošni kazalniki, ki odražajo čezmejno sodelovanje.

V nadaljevanju navedeni podatki se nanašajo na 85 sofinanciranih projektov na dan 31.12.2012: 16 strateških projektov javnega razpisa št. 01/2009, 49 standardnih projektov javnega razpisa št. 02/2009 in 20 standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju - javnega razpisa št. 03/2011.

Standardna projekta MODEF in CAMAA, za katera je bilo sofinanciranje v okviru javnega razpisa št. 02/2009 odobreno v letu 2012, nista vključena, saj za omenjena projekta Pogodba o partnerstvu, ki jo je potrebno skleniti pred Pogodbo o dotaciji sofinanciranja, na dan 31.12.2012 še ni bila sklenjena. Standardni projekti bodo v celoti vključeni v letno poročilo 2013.

V primerih, kjer je merska enota izražena v odstotkih, je le-ta izračunana glede na skupno število sofinanciranih projektov (85 projektov) na dan 31.12.2012.

VSEM PROJEKTOM SKUPNI KAZALNIKI, KI IZKAZUJEJO STOPNJO SODELOVANJA	Cilj	Vrednost	Enota	Opis enote
Projekti, ki upoštevajo dva izmed naslednjih kriterijev: skupna priprava, skupno izvajanje, skupno osebje, skupno financiranje	45%	1%	%	Delež v odstotkih glede na skupno število projektov (1., 2. in 3. prednostna naloga)
Projekti, ki upoštevajo tri izmed naslednjih kriterijev: skupna priprava, skupno izvajanje, skupno osebje, skupno financiranje	30%	1%	%	Delež v odstotkih glede na skupno število projektov (1., 2. in 3. prednostna naloga)
Projekti, ki upoštevajo štiri izmed naslednjih kriterijev: skupna priprava, skupno izvajanje, skupno osebje, skupno financiranje	30%	98%	%	Delež v odstotkih glede na skupno število projektov (1., 2. in 3. prednostna naloga)
KAZALNIKI ZA »HORIZONTALNA NAČELA«	Cilj	Vrednost	Enota	Opis enote
P1 - Spodbujanje trajnostnega razvoja	45%	99%	%	Delež v odstotkih glede na skupno število projektov
P2 - Spodbujanje enakih možnosti (med spoloma in nediskriminacija)	10%	91%	%	Delež v odstotkih glede na skupno število projektov



SPLOŠNI KAZALNIKI, KI ODRAŽAJO ČEZMEJNO SODELOVANJE	Cilj	Vrednost	Enota	Opis enote
Projekti, ki razvijajo skupno rabo infrastrukture	25%	74%	%	Delež v odstotkih glede na skupno število projektov
Projekti, ki razvijajo sodelovanje na področju javnih storitev	20%	72%	%	Delež v odstotkih glede na skupno število projektov
Projekti, ki zmanjšujejo izoliranost s pomočjo boljše dostopnosti do prevoznih sredstev, IKT omrežij in storitev	25%	49%	%	Delež v odstotkih glede na skupno število projektov
Projekti, ki spodbujajo in izboljšujejo skupno varstvo in upravljanje okolja	15%	82%	%	Delež v odstotkih glede na skupno število projektov
Ljudje, ki se udeležujejo skupnih izobraževalnih dejavnosti ali usposabljanj	350	1781	število	število oseb
Projekti, ki spodbujajo raziskave in razvoj ter inovativne mreže	10%	68%	%	Delež v odstotkih glede na skupno število projektov
Čezmejni projekti malih in srednje velikih podjetij	5%	58%	%	Delež v odstotkih glede na skupno število projektov
Javna in zasebna telesa, ki sodelujejo v čezmejnih projektih	500	893	število	število



2.1.2 Finančni podatki

V nadaljevanju so navedeni podatki o doseganju ciljne porabe »N+2«, ki je predvidena za leto 2012.

Zaradi doseganja ciljne porabe (skupna vrednost sredstev ESSR v višini 26.382.964,21 EUR) je OU v sodelovanju s programskimi partnerji poskrbel za okrepitev prvostopenjskih kontrolnih enot v Italiji in Sloveniji (glej poglavje 1.2 v delu, ki se nanaša na aktivnosti STS in poglavje 2.7, ki se nanaša na spremljanje in ocenjevanje) in uvedel ustrezne ukrepe za zagotavljanje pravilnega in pravočasnega izvajanja predvidenih aktivnosti ter povišanje vrednosti certificiranih izdatkov.

Meseca oktobra 2012 je OU za upravičence javnih razpisov št. 01/2009 in št. 02/2009 uvedel možnost predložitve dodatnega ad-hoc poročila (glede na predvidena v Pogodbi o dotaciji sofinanciranja) pristojni prvostopenjski kontrolni enoti za poročanje o izdatkih (vse kategorije izdatkov) v višini najmanj 80.000,00 EUR. Obenem je bil podaljšan rok za oddajo zadnjega poročila v koledarskem letu, z namenom certificiranja čim višjega zneska izdatkov.

Po odobritvi NO je OU posredoval Evropski komisiji prošnjo za upoštevanje izjeme od samodejne prekinitve obveznosti in začasno znižanje vrednosti ciljne porabe »N+2« zaradi višje sile v vrednosti 6.287.569,99 EUR (ESRR sredstev), skladno s točko c) 96. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. Navedeni znesek predstavlja vsoto sredstev, dodeljenih upravičencem na območjih, ki jih je prizadel potres.

Tabela v nadaljevanju vsebuje podatke o izdatkih, potrjenih s strani prvostopenjskih kontrolnih enot in o certificiranih izdatkih s strani OP ter ciljno porabo, predvideno za leto 2012, ki jo je potrebno doseči, da bi preprečili samodejno prenehanje prevzetih obveznosti.

Ciljna poraba za leto 2012. Potrjeni in certificirani izdatki.

Cilj N+2 2012 skupno (ESRR v €)	Certificirani izdatki s strani Organa za potrjevanje [14. Zahtevak za plačilo, 28.12.2012] skupno (ESRR v €)	Izdatki, vključeni v poročila in potrjeni na dan 31.12.2012 skupno (ESRR v €)	Izdatki, vključeni v poročila in potrjeni na dan 31.12.2012 skupno (v €)
(A)	(B)	(C)	(C)
26.382.964,21	23.928.468,75	24.224.398,34	28.499.292,17

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o porabi sredstev na dan 31.12.2012

Razlika med certificiranimi izdatki in ciljno porabo za leto 2012 znaša 2.454.495,46 EUR (ESRR sredstev). Vrednost potrjenih izdatkov (ESRR sredstva), ki so jih upravičenci predložili prvostopenjski kontroli, na dan 31.12.2012 presega vrednost certificiranih izdatkov za približno 300.000,00 EUR. Razlika do predvidene ciljne porabe »N+2« je torej teoretično nekoliko nižja od navedenega zneska. Kumulativni znesek zahtevanih in potrjenih izdatkov na dan 31.12.2012 znaša 28.499.292,17 EUR.



Tabela v nadaljevanju pa vsebuje finančne podatke po prednostnih nalogah in odgovarjajoče izdatke, ki se sofinancirajo iz sredstev ESRR.

Finančni podatki po prednostnih nalogah - izdatki, sofinancirani iz ESRR.

Prednostna naloga	Izdatki, nastali pri upravičencih in vključeni v Zahteve za izplačilo, ki se posredujejo OU (ESRR v €)	Znesek prispevka ESRR (v €)	Izdatki, ki jih je upravičencem izplačal Organ za potrjevanje (ESRR v €)	Skupna plačila, prejeta s strani Komisije (ESRR v €)
1	7.574.343,50	7.574.343,50	5.252.600,08	1.805.073,76
2	7.533.264,61	7.533.264,61	4.844.133,38	1.862.797,53
3	6.237.006,28	6.237.006,28	3.735.524,62	1.209.808,87
4	2.879.783,95	2.879.783,95	2.035.722,54	1.239.305,88
predplačilo				10.458.623,79
Skupno	24.224.398,34	24.224.398,34	15.867.980,62	16.575.609,83

Vir: pripravil STS na podlagi finančnih podatkov na dan 31.12.2012

Sledi tabela s podrobnejšimi podatki o dodeljenih programskih sredstvih, ki na dan priprave tega poročila znašajo 136.091.691,59 EUR. Predvidena skupna vrednost Programa, ki je določena v finančnem načrtu znaša 136.714.036,00 EUR.

Višina razpoložljivih nedodeljenih sredstev znaša 622.344,41 EUR, skladno z odločitvijo NO, da ostanejo nedodeljeni preostanki sredstev, ki zajemajo preostanke iz javnih razpisov in preostanke, nastale zaradi kritja izdatkov, ki predstavljajo državno pomoč in presegajo dovoljene mejne vrednosti sofinanciranja, iz zasebnih sredstev.



PRED. NALOGA	SKUPNA SREDSTVA 100% (v €)	ESRR SREDSTVA (a) 85% (v €)	NACIONALNA SREDSTVA (b) 15% (v €)	ZASEBNA SREDSTVA ⁴ (c) (v €)	PREOSTANKI, NASTALI ZARADI FINANCIRANJA IZ ZASEBNIH SREDSTEV (d) (v €)	PREOST. PO PRED. NALOGAH (e) (v €)	NEDODELJ. SREDSTVA (f) f=c-d+e (v €)	SKUPNA DODELJENA SREDSTVA (g) g=a+b-f (v €)	% SKUPNIH DODELJENIH SREDSTEV	RAZPOLOŽ. NEDODELJENA SREDSTVA (v €)
PN 1 ESRR - javno 37%	50.584.193,00	42.996.564,00	7.587.629,00	53.440,00	53.440,00	-	-	50.584.193,00	100,00	-
PN 2 ESRR - javno 29%	39.647.070,00	33.700.010,00	5.947.060,00	141.502,00	-	480.836,48	622.338,48	39.024.731,52	98,43	622.338,48
PN 3 ESRR - javno 28%	38.279.931,00	32.537.941,00	5.741.990,00	-	-	5,93	5,93	38.279.925,07	99,999985	5,93
PN 4 ESRR - javno 6%	8.202.842,00	6.972.416,00	1.230.426,00	-	-	-	-	8.202.842,00	100	-
Skupaj ESRR - javno 100%	136.714.036,00	116.206.931,85	20.507.105,00	194.942,00	53.440,00	480.842,41	622.344,41	136.091.691,59	99,54	622.344,41

Vir: pripravil STS

V nadaljevanju so predstavljeni finančni podatki, ki se nanašajo na posamezne javne razpise Programa. Dodatne informacije so na voljo v 3. poglavju (»Izvajanje po prednostnih nalogah«) tega poročila.

JAVNI RAZPIS ŠT. 01/2009 ZA PREDLOŽITEV STRATEŠKIH PROJEKTOV

Tabela navedena v nadaljevanju vsebuje pregled 16 sofinanciranih strateških projektov in odobreno vrednost za posamezni projekt.

Javni razpis št. 01/2009. Sofinancirani projekti in odobrena vrednost.

Prednostna naloga	Akronim projekta	Odobrena vrednost projekta (v €)	Sredstva ESRR (v €)	Datum podpisa Pogodbe o dotaciji sofinanciranja
1	Climaparks	3.239.513,01	2.753.586,06	29.07.2010
1	Sigma 2	3.697.431,50	3.142.816,78	26.07.2010
1	Carso - Kras	3.085.000,00	2.622.250,00	27.07.2010
1	Adria A	3.289.000,00	2.795.650,00	15.07.2010
1	Safeport	2.730.000,00	2.320.500,00	26.09.2011
1	Interbike	3.514.000,00	2.986.900,00	08.09.2011
Prednostna naloga 1	Skupna odobrena vrednost	19.554.944,51	16.621.702,83	

⁴ Lastna sredstva, s katerimi upravičenci pokrivajo delež projektnih izdatkov, za katere je bilo ugotovljeno, da zapadejo pod državne pomoči in presegajo maksimalno dovoljeno višino, upravičeno do sofinanciranja.



Prednostna naloga	Akronim projekta	Odobrena vrednost projekta (v €)	Sredstva ESRR (v €)	Datum podpisa Pogodbe o dotaciji sofinanciranja
2	Slowtourism	3.815.700,00	3.243.345,00	20.07.2010
2	Citius	2.810.946,50	2.389.304,53	04.08.2010
2	Icon	3.167.095,00	2.692.030,75	19.07.2010
2	Know Us	2.831.000,00	2.406.350,00	30.12.2010
2	Trans2Care	2.611.118,00	2.219.450,30	26.07.2011
Prednostna naloga 2	Skupna odobrena vrednost	15.235.859,50	12.950.480,57	
3	Jeziklingua	3.000.000,00	2.550.000,00	26.07.2010
3	E-Health	3.000.000,00	2.550.000,00	13.07.2010
3	Shared Culture	3.500.000,07	2.975.000,06	26.07.2010
3	Parsjad	2.800.000,00	2.380.000,00	05.08.2010
3	Openmuseums	3.856.000,00	3.277.600,00	22.08.2011
Prednostna naloga 3	Skupna odobrena vrednost	16.156.000,07	13.732.600,06	
Skupno		50.946.804,08	43.304.783,46	

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

Spodnja tabela povzema stanje prevzetih obveznosti in izdatkov, potrjenih s strani prvostopenjskih kontrolorjev do 31.12.2012. Iz tabele je razviden napredek v primerjavi s skupno višino sredstev, dodeljenih strateškemu projektu, v skladu s Pogodbo o dotaciji sofinanciranja med OU in VP.

Stanje je predstavljeno tudi po prednostnih nalogah in projektih.

Primerjava skupnega zneska prevzetih obveznosti s celotnim zneskom sredstev, namenjenih projektu kaže, da je zmogljivost prevzemanja obveznosti približno 60% v primerjavi z obsegom sredstev, namenjenih strateškemu projektu. Primerjava potrjenih izdatkov, vključenih v zahteve za izplačilo, s celotnim zneskom dodeljenih sredstev kaže 37,11% zmogljivosti.

Pregled na ravni posamezne prednostne naloge kaže, da je prednostna naloga 1 najbolj učinkovita z vidika prevzetih obveznosti (67,16%), medtem ko je odstotek porabe (36,22%) višji v okviru prednostne naloge 2. Na odstotek porabe vpliva izvajanje projektov Safeport in Interbike, za katera sta bili Pogodbi o dotaciji sofinanciranja podpisani konec leta 2011. Za oba projekta beležimo dober odstotek prevzetih obveznosti (od 40% do približno 70%) in 22% potrjenih izdatkov. Pri prednostni nalogi 2 je delež prevzetih obveznosti nekoliko nižji napram prednostni nalogi 1 (57,53%), medtem ko je poraba skoraj 50%. Pri prednostni nalogi 3 je delež prevzetih obveznosti nižji napram drugima dvema prednostnima nalogama (44,86%), medtem ko odstotek potrjenih izdatkov v primerjavi s celotno odobreno vrednostjo projekta znaša 31,64%.

Natančneje, v okviru prednostne naloge 1 projekt Sigma 2 beleži najbolj učinkovito črpanje sredstev z vidika prevzetih obveznosti (92,69%). Projekt Carso-Kras pa beleži najvišji odstotek



potrjenih izdatkov oz. najvišjo porabo sredstev (53,38%). Kot že omenjeno, v okviru izvajanja projektov Safeport in Interbike, za katera sta bili Pogodbi o dotaciji sofinanciranja podpisani konec leta 2011, beležimo dober finančni napredek.

V zvezi s prednostno nalogo 2 je projekt, ki beleži najboljše rezultate pri prevzemanju obveznosti (71,47%) in porabi sredstev (60,22%), projekt Slowtourism. Med vsemi sofinanciranimi strateškimi projekti projekt Slowtourism beleži absolutno najboljše rezultate v smislu napredka porabe sredstev. Tudi v tem primeru je podatek o napredku izvajanja projektov Know Us in Trans2care pomemben, saj so se njune aktivnosti začele izvajati z zamudo v letu 2011. Odstotka porabe za oba projekta znašata 23,05% (Know-Us) in 26,78% (Trans2Care).

V zvezi s prednostno nalogo 3 najboljši finančni napredek beležita dva projekta: Parsjad, ki pri porabi sredstev beleži odstotek v višini 47,97%, in Jeziklingua, ki pri porabi sredstev beleži odstotek v višini 46,25%. Odstotek porabe sredstev pri projektu Openmuseums, za katerega je bila Pogodba o dotaciji sofinanciranja podpisana v drugi polovici leta 2011, znaša 18,87% glede na skupno odobreno vrednost projekta.



Javni razpis št. 01/2009. Finančni napredek pri izvajanju sofinanciranih strateških projektov po posameznih projektih in prednostnih nalogah na dan 31.12.2012.

Prednostna naloga	Akronim projekta	Odobrena vrednost projekta v € (A)	Prevzete obveznosti v € (B)	Zahtevani in potrjeni izdatki v € (C)	% prevzetih obveznosti (B/A)	% porabe sredstev (C/A)
1	Climaparks	3.239.513,01	2.148.093,25	1.520.590,27	66,31%	46,94%
1	Sigma 2	3.697.431,50	3.427.036,55	1.272.554,41	92,69%	34,42%
1	Carso - Kras	3.085.000,00	2.105.427,01	1.646.641,12	68,25%	53,38%
1	Adria A	3.289.000,00	2.167.688,38	1.237.442,20	65,91%	37,62%
1	Safeport	2.730.000,00	1.794.624,72	629.484,65	65,74%	23,06%
1	Interbike	3.514.000,00	1.491.150,93	776.248,34	42,43%	22,09%
Prednostna naloga 1	Skupna odobrena vrednost	19.554.944,51	13.134.020,84	7.082.960,99	67,16%	36,22%
2	Slowtourism	3.815.700,00	2.727.119,61	2.297.803,77	71,47%	60,22%
2	Citius	2.810.946,50	1.551.936,42	1.631.311,79	55,21%	58,03%
2	Icon	3.167.095,00	2.065.660,30	1.429.244,34	65,22%	45,13%
2	Know Us	2.831.000,00	925.578,64	652.439,13	32,69%	23,05%
2	Trans2Care	2.611.118,00	1.495.082,57	699.239,08	57,26%	26,78%
Prednostna naloga 2	Skupna odobrena vrednost	15.235.859,50	8.765.377,54	6.710.038,11	57,53%	44,04%
3	Jeziklingua	3.000.000,00	1.459.724,30	1.387.386,38	48,66%	46,25%
3	E-Health	3.000.000,00	1.402.365,21	537.959,25	46,75%	17,93%
3	Shared Culture	3.500.000,07	2.171.431,24	1.115.056,86	62,04%	31,86%
3	Parsjad	2.800.000,00	1.469.002,38	1.343.189,50	52,46%	47,97%
3	Openmuseums	3.856.000,00	745.087,34	727.590,26	19,32%	18,87%
Prednostna naloga 3	Skupna odobrena vrednost	16.156.000,07	7.247.610,47	5.111.182,25	44,86%	31,64%
Skupaj		50.946.804,08	29.147.008,85	18.904.181,35	57,21%	37,11%

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih v MIS

V nadaljevanju so predstavljeni podrobnejši podatki z namenom natančnega pregleda vpliva na upravičeno območje. Navedena je natančna porazdelitev sredstev med geografskimi območji programskih partnerjev, v zvezi s sofinanciranimi strateškimi projekti. Analiza prikazuje podatke tako na ravni posameznega projekta kot na ravni prednostne naloge. Pri analizi smo upoštevali tudi spremembe, ki se nanašajo na prerazporeditev sredstev med projektnimi partnerji.



Javni razpis št. 01/2009. Porazdelitev sredstev za sofinanciranje odobrenih strateških projektov glede na geografsko območje po posameznih projektih in po prednostnih nalogah na dan 31.12.2012.

Prednostna naloga	Akronim projekta	ITALIJA			SLOVENIJA (v €)	SKUPAJ (v €)
		Furlanija Julijska krajina (v €)	Veneto (v €)	Emilia Romagna (v €)		
1	Climaparks	632.000,00	329.500,00	655.600,00	1.622.413,01	3.239.513,01
1	Sigma2	568.600,00	513.700,00	85.800,00	2.529.331,50	3.697.431,50
1	Carso Kras	1.400.000,00	0	0	1.685.000,00	3.085.000,00
1	Adria A ⁵	1.740.550,00	382.820,00	39.990,00	1.085.650,00	3.289.000,00
1	Safeport	580.000,00	980.000,00	220.000,00	950.000,00	2.730.000,00
1	Interbike	644.040,00	946.020,00	448.060,00	1.475.880,00	3.514.000,00
Prednostna naloga 1	Skupaj po območjih	5.565.190,00	3.152.040,00	1.449.450,00	9.348.274,51	19.554.944,51
2	Slowtourism	402.500,00	723.000,00	1.278.500,00	1.411.700,00	3.815.700,00
2	Citius	835.778,00	681.872,00	209.162,00	1.084.134,50	2.810.946,50
2	Icon	1.071.078,69	320.494,00	121.315,97	1.654.206,34	3.167.095,00
2	Know Us	716.000,01	949.000,00	250.000,00	915.999,99	2.831.000,00
2	Trans2Care	1.244.371,00	333.051,00	178.605,00	855.091,00	2.611.118,00
Prednostna naloga 2	Skupaj po območjih	4.269.727,70	3.007.417,00	2.037.582,97	5.921.131,83	15.235.859,50
3	Jeziklingua	1.966.606,67	60.000,00	0	973.393,33	3.000.000,00
3	E-Health	1.066.020,00	360.000,00	100.000,00	1.473.980,00	3.000.000,00
3	Shared Culture	99.000,00	1.801.000,06	0	1.600.000,01	3.500.000,07
3	Parsjad	200.000,00	1.175.000,60	425.000,01	999.999,40	2.800.000,01
3	Openmuseums	601.000,00	736.000,00	912.0001,00	1.606.999,00	3.856.000,00
Prednostna naloga 3	Skupaj po območjih	3.932.626,67	4.132.000,66	1.437.001,01	6.654.371,74	16.156.000,08
SKUPAJ - vse 3 prednostne naloge		13.767.544,37	10.291.457,66	4.924.033,98	21.923.778,08	50.946.804,09

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

V povezavi s prednostno nalogo 1 skupna sredstva, namenjena strateškemu projektu, znašajo 19.554.944,51 EUR. Tudi po spremembah pri prerezporeditvi sredstev po PP, odstotek sredstev, dodeljenih italijanskim upravičencem, znaša 51,99% oziroma 10.166.680,00 EUR, brez sredstev

⁵ Skupne vrednosti vključujejo tudi izdatke po projektnih partnerjih (na primer italijansko Ministrstvo za okolje ter italijansko Ministrstvo za infrastrukturo in promet), ki niso vključeni v porazdelitev po geografskih območjih, prikazano v tabeli.



namenjenih italijanskim ministrstvom (glej opombo), ki znašajo 39.990,00 EUR⁶. Podrobneje, upravičencem iz Furlanije Julijske krajine je dodeljenih 28,46% sredstev prednostne naloge 1, upravičencem iz Veneta nekaj več kot 16%, medtem ko je upravičencem iz Emilije Romagne dodeljenih 7,41% sredstev. Slovenskim upravičencem so dodeljena sredstva v skupni višini 9.348.274,51 EUR, kar znaša 47,81%.

V povezavi s prednostno nalogo 2 skupna sredstva, namenjena strateškimi projektom, znašajo nekoliko več kot 15 milijonov EUR. Odstotek sredstev, dodeljenih italijanskim upravičencem, znaša 61,14%, oziroma 9.314.727,67 EUR in minimalno presega zneske, navedene v poročilu o izvajanju za leto 2011. Tudi v tem primeru, finančne spremembe pri PP vplivajo na prerezporeditev sredstev po posameznih deželah, ki sodelujejo kot programski partnerji. Upravičencem iz Furlanije Julijske krajine je dodeljenih nekaj več kot 28%, upravičencem iz Veneta nekaj manj kot 20%, medtem ko je upravičencem iz Emilije Romagne dodeljeno nekaj več kot 13% sredstev. Slovenskim upravičencem so dodeljena sredstva v višini 5.921.131,83 EUR, kar znaša 38,86%.

V povezavi s prednostno nalogo 3 skupna sredstva, namenjena strateškimi projektom, znašajo približno 16,15 milijonov EUR. Odstotek sredstev, dodeljenih italijanskim upravičencem znaša 58,81% oziroma 9.501.628,34 EUR. Natančneje je upravičencem iz Furlanije Julijske krajine dodeljenih nekaj več kot 24%, upravičencem iz Veneta nekaj manj kot 26%, upravičencem iz Emilije Romagne skoraj 9%. Republikli Sloveniji so dodeljena sredstva v višini 6.654.362,74 EUR, kar znaša 41,19%.

Podrobneje, v okviru prednostne naloge 1 projekt Adria A beleži najvišji delež sredstev (52,92% celotne vrednosti projekta), namenjenih upravičencem iz Furlanije Julijske krajine, pri katerem tudi VP prihaja iz tega območja. Dežela Veneto pa ima največji delež sredstev pri projektu Safeport (35,90%) in tudi v tem primeru VP prihaja z istega programskega območja. Emilia Romagna beleži najvišji odstotek sredstev pri projektu Climaparks (20,24%), čeprav je VP projekta iz Slovenije. Z vidika slovenskega partnerstva je projekt z najvišjim odstotkom sredstev, dodeljenih slovenskemu upravičencu, projekt Sigma 2 z 68,41% deležem (tudi v tem primeru VP prihaja z istega območja).

V okviru prednostne naloge 2 je pri projektu Trans2care najvišji delež sredstev (47,66% celotne vrednosti projekta) namenjen Avtonomni deželi Furlaniji Julijski krajini (VP omenjenega projekta prihaja z istega območja). Dežela Veneto ima največji delež sredstev pri projektu Know Us (33,52%), pri katerem VP prihaja iz Dežele Veneto. Emilia Romagna pa beleži najvišji odstotek sredstev pri projektu Slowtourism (33,51%) (pri omenjenem projektu VP prihaja iz istega programskega območja). Z vidika slovenskega partnerstva je projekt z najvišjim odstotkom sredstev, namenjenih slovenskim upravičencem, projekt Icon z 52,23% deležem (tudi v tem primeru VP prihaja z istega območja).

V okviru prednostne naloge 3 projekt Jeziklingua beleži najvišji delež sredstev (65,55% celotne vrednosti projekta), dodeljenih upravičencem Dežele Furlanije Julijske krajine (VP projekta prihaja z istega območja). Dežela Veneto ima največji delež sredstev pri projektu Shared Culture (51,46%), pri katerem pa VP prihaja iz Slovenije. Emilia Romagna beleži pa najvišji odstotek sredstev pri projektu Openmuseums (23,65%), pri katerem VP prihaja z istega

⁶ Odstotek sredstev, ki so bila dodeljena italijanskim upravičencem, vključno s sredstvi, dodeljenimi italijanskim ministrstvom znaša 52,19% oziroma 10.206.670,00 EUR.



programskega območja. Z vidika slovenskega partnerstva je projekt z najvišjim odstotkom sredstev, namenjenih slovenskim upravičencem ravno tako projekt Openmuseums z 49,13% deležem, VP projekta pa prihaja iz Italije.

Sredstva, dodeljena območjem, vključenim na osnovi »načela fleksibilnosti«, v skladu s 1. točko 21. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006 in določili javnega razpisa št. 01/2009, ne presegajo omejitve 20% prispevka ESRR sredstev na ravni posameznega projekta.

V spodnji tabeli so za javni razpis za strateške projekte št. 01/2009 po posamezni prednostni nalogi navedeni podrobnejši podatki o sredstvih, dodeljenih območjem, vključenim na osnovi »načela fleksibilnosti«. Skupni znesek sredstev znaša 3.580.522,13 EUR. Območjem, vključenim na osnovi »načela fleksibilnosti« v Republiki Italiji, in sicer Pokrajini Pordenone, je dodeljenih 11,93% sredstev, Pokrajini Treviso pa 8,57% sredstev. Območjem, vključenim na osnovi »načela fleksibilnosti« v Republiki Sloveniji, in sicer Osrednjeslovenski statistični regiji, je dodeljenih 79,50% sredstev.

Javni razpis št. 01/2009. Posamezne prednostne naloge - porazdelitev sredstev sofinanciranih strateških projektov po območjih, vključenih na osnovi »načela fleksibilnosti«, na dan 31.12.2012.

Prednostna naloga	ITALIJA		SLOVENIJA	
	Pordenone (v €)	Treviso (v €)	Osrednjeslovenska (v €)	Notranjsko-kraška (v €)
1	327.000,00	0	688.980,00	0
2	100.000,00	306.930,00	667.620,50	0
3	0	0	1.489.991,63	0
Skupaj	427.000,00	306.930,00	2.846.592,13	0

Vir: pripravi STS na podlagi podatkov o strateških projektih

JAVNI RAZPIS ŠT. 02/2009 ZA PREDLOŽITEV STANDARDNIH PROJEKTOV

Tabela v nadaljevanju vsebuje pregled 51 odobrenih standardnih projektov in odobreno vrednost za posamezni projekt.

Na dan 31.12.2012 je bilo podpisanih 49 od 51 Pogodb o dotaciji sofinanciranja za izvedbo sofinanciranih projektov. Podpisovanje prvih pogodb se je pričelo novembra 2011, ko so bile s strani OU podpisane pogodbe z VP projektov Julijus, Croctal, Tip in Alisto. Podpisovanje pogodb se je nadaljevalo v letu 2012, in sicer od meseca februarja dalje, s podpisom pogodbe z VP projektov Heritaste in Macc. Podpisovanje se je zaključilo 3. septembra 2012 s podpisom pogodbe za projekt Tessi. Pogodbi o dotaciji sofinanciranja za zadnja dva projekta, odobrena v okviru javnega razpisa za standardne projekte št. 02/2009, CAMAA in MODEF, sta bili podpisani 18.02.2013.

Vrednost dodeljenih sredstev oz. podpisanih Pogodb o dotaciji sofinanciranja za izvedbo 45 projektov v letu 2012 znaša 14.151.537,76 EUR, od katerih je 12.028.807,10 EUR ESRR sredstev.



Javni razpis št. 02/2009. Sofinancirani projekti in odobrena vrednost.

Prednostna naloga	Akronim projekta	Odobrena vrednost projekta (v €)	Sredstva ESRR (v €)	Datum podpisa Pogodbe o dotaciji sofinanciranja
1	CroCTaL	1.349.100,00	1.146.735,00	19.12.2011
1	TIP	1.326.990,00	1.127.941,50	20.12.2011
1	SALTWORKS	1.260.000,00	1.071.000,00	23.05.2012
1	BioDiNet	1.334.993,33	1.134.744,33	24.05.2012
1	ISO - TO	1.157.850,35	984.172,80	18.06.2012
1	ISO - PRE	1.139.347,80	968.445,63	12.06.2012
1	GOTRAWAMA	1.209.150,00	1.027.777,50	15.05.2012
1	ISO - PRA	1.144.956,48	973.213,01	12.06.2012
1	ISO - GIO	1.121.621,43	953.378,22	12.06.2012
1	ISO - RE	1.164.398,90	989.739,07	12.06.2012
1	ISO - PA	1.150.353,73	977.800,67	12.06.2012
1	GEP	1.349.300,17	1.146.905,14	29.03.2012
1	ASTIS	1.099.890,00	934.906,50	27.06.2012
1	IDAGO	1.282.888,98	1.090.455,63	12.03.2012
1	ADRIAWET 2000	1.062.000,00	902.700,00	12.03.2012
1	EnergyViLLab	1.341.000,00	1.139.850,00	30.03.2012
1	FUTURELIGHTS	1.157.000,00	983.450,00	17.04.2012
1	HYDRO KARST	1.079.435,30	917.520,01	18.07.2012
1	TESSI	998.580,87	848.793,74	03.09.2012
1	MODEF	724.582,66	615.895,26	18.02.2013
Prednostna naloga 1		23.453.440,00	19.935.424,00	
2	PROFILI	1.345.500,00	1.143.675,00	12.07.2012
2	MACC	1.341.003,02	1.139.852,57	24.02.2012
2	MOTOR	1.287.000,00	1.093.950,00	16.05.2012
2	WINE NET	1.184.679,00	1.006.977,15	16.07.2012
2	AGROTUR	1.045.003,16	888.252,69	08.03.2012



Prednostna naloga	Akronim projekta	Odobrena vrednost projekta (v €)	Sredstva ESRR (v €)	Datum podpisa Pogodbe o dotaciji sofinanciranja
2	Heritaste	1.334.999,11	1.134.749,24	24.02.2012
2	STUDY CIRCLES	714.971,63	607.725,89	27.04.2012
2	TRANSARMON	792.100,00	673.285,00	24.05.2012
2	UE LI JE II	959.706,50	815.750,53	08.03.2012
2	LANATURA	418.819,14	355.996,27	13.04.2012
2	IPforSMEs	1.350.000,00	1.147.500,00	12.07.2012
2	GLIOMA	1.320.000,00	1.122.000,00	05.06.2012
2	SOLUM	1.300.318,31	1.105.270,56	12.04.2012
2	T-lab	1.178.963,65	1.002.119,10	21.05.2012
2	INNOVAQUA	1.332.000,00	1.132.200,00	05.06.2012
2	BELLIMPRESA	614.100,00	521.985,00	04.04.2012
Prednostna naloga 2		17.519.163,52	14.891.288,99	
3	PESCA	954.000,00	810.900,00	16.04.2012
3	JULIUS	1.313.140,50	1.116.169,43	17.11.2011
3	EDUKA	1.335.000,00	1.134.750,00	15.03.2012
3	ALISTO	1.350.000,00	1.147.500,00	28.12.2011
3	IntegrAid	1.350.000,00	1.147.500,00	19.03.2012
3	Living Fountains	904.699,11	768.994,24	16.04.2012
3	LEX	538.272,00	457.531,20	28.03.2012
3	SIIT	1.350.000,00	1.147.500,00	29.06.2012
3	PANGeA	1.253.752,35	1.065.689,50	18.05.2012
3	SIGN	1.285.441,20	1.092.625,02	03.07.2012
3	e-surgerynet	1.135.008,10	964.756,89	23.05.2012
3	S.HO.W.	1.350.000,00	1.147.500,00	20.03.2012
3	SEA	1.345.500,00	1.143.675,00	28.05.2012
3	e-cardionet	1.349.865,00	1.147.385,25	31.08.2012
3	CAMAA	1.185.321,74	1.007.523,48	18.02.2013
Prednostna naloga 3		18.000.000,00	15.300.000,00	
Skupaj		58.972.603,52	50.126.712,99	

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

Spodnja tabela povzema stanje prevzetih obveznosti in izdatkov, vključenih v poročilo in potrjenih s strani prvostopenjskih kontrolorjev na dan 31.12.2012, kot tudi napredek v



primerjavi s skupno višino sredstev, dodeljenih standardnim projektom skladno s Pogodbami o dotaciji sofinanciranja, sklenjenimi med OU in VP.

Stanje je predstavljeno tudi po prednostnih nalogah in po posameznih projektih.

Primerjava skupnega zneska nastalih izdatkov, vključenih v poročila, s celotnim zneskom sredstev, namenjenih projektom, kaže zmogljivost porabe v višini nekaj več kot 10%. Odstotek prevzetih obveznosti s strani upravičencev znaša približno 25% oz. četrtno vrednosti sredstev, namenjenih sofinanciranju standardnih projektov.

Glede porabe sredstev (izdatki, vključeni v poročilo in potrjeni s strani prvostopenjske kontrole) sta najbolj učinkoviti prednostna naloga 2 (12,29%) in 3 (12,37%) v primerjavi s skupno vrednostjo dodeljenih sredstev. Prva prednostna naloga pa beleži porabo sredstev, ki je nekoliko nižja od 8%. Glede prevzetih obveznosti s strani upravičencev sta najbolj učinkoviti prednostna naloga 2 (30,44%), ki beleži najboljši finančni napredek, in prednostna naloga 3 (25,01%). Najnižji odstotek prevzetih obveznosti beleži prednostna naloga 1 s približno 21%.

Natančneje, v okviru prednostne naloge 1 projekt GEP beleži najbolj učinkovito črpanje sredstev z vidika porabe sredstev (21,63%) s strani upravičencev (izdatki, vključeni v poročilo in potrjeni s strani prvostopenjskih kontrolorjev). Projekt Energyvillab beleži najvišji odstotek prevzetih obveznosti, saj na dan 31.12.2012 prevzete obveznosti presegajo polovico dodeljenih sredstev.

Upravičencem »ISO projektov« je NO znižal sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, zato so morali preurediti načrte izvajanja, posledično je prišlo do zamud pri podpisu Pogodb o dotaciji sofinanciranja, investicije pa bodo izvedene do konca 2014, zato beležijo nizek odstotek porabe (1%) in nizek odstotek prevzetih obveznosti (8%).

V zvezi s prednostno nalogo 2 projekta Agrotur in Glioma beležita najboljše rezultate glede porabe sredstev, in sicer je pri prvem projektu poraba 24,88% pri drugem pa 25,25% skupne odobrene vrednosti projekta. Projekt Solum beleži 2,85% porabo, in sicer zelo nizek odstotek v primerjavi z ostalimi vrednostmi omenjene prednostne naloge, ki je posledica težav, povezanih z izvajanjem aktivnosti, ki zahtevajo izvedbo kompleksnih postopkov javnega naročanja. V okviru Programa, beleži najvišji odstotek prevzetih obveznosti standardni projekt T-lab (69,15%), sledi mu projekt MACC (52,81%).

V okviru prednostne naloge 3 beleži najboljše rezultate pri finančnem napredku projekt S.HO.W., s 30,96% porabe. Navedeni projekt, med vsem sofinanciranimi standardnimi projekti, beleži najvišjo porabo sredstev. Projekti Pesca (65,45%), Eduka (53,99%) in Lex (52,58%) beležijo pomemben napredek, saj presegajo 50% prevzetih obveznosti.

Projekt e-cardionet pa beleži malenkost višji odstotek porabe sredstev (1,57%) v primerjavi z »ISO projekti«. Na izvajanje aktivnosti projekta e-cardionet so namreč pomembno vplivale spremembe v sestavi partnerstva. Odstotek prevzetih obveznosti za projekt e-cardionet pa znaša nekaj manj kot 4%.



Javni razpis št. 02/2009. Finančni napredek pri izvajanju sofinanciranih standardnih projektov po posameznih projektih in prednostnih nalogah na dan 31.12.2012.

Prednostna naloga	Akronim projekta	Odobrena vrednost projekta v € (A)	Prevzete obveznosti v € (B)	Zahtevani in potrjeni izdatki v € (C)	% prevzetih obveznosti (B/A)	% porabe sredstev (C/A)
1	CroCTaL	1.349.100,00	185.142,15	185.142,15	13,72%	13,72%
1	TIP	1.326.990,00	295.509,87	124.905,22	22,27%	9,41%
1	SALTWORKS	1.260.000,00	153.311,08	44.302,43	12,17%	3,52%
1	BioDiNet	1.334.993,33	167.757,52	101.756,61	12,57%	7,62%
1	ISO - TO	1.157.850,35	41.885,90	3.188,92	3,62%	0,28%
1	ISO - PRE	1.139.347,80	-	-	0,00%	0,00%
1	GOTRAWAMA	1.209.150,00	418.093,20	95.185,01	34,58%	7,87%
1	ISO - PRA	1.144.956,48	42.474,27	889,92	3,71%	0,08%
1	ISO - GIO	1.121.621,43	46.963,82	1.309,19	4,19%	0,12%
1	ISO - RE	1.164.398,90	90.224,92	608,49	7,75%	0,05%
1	ISO - PA	1.150.353,73	6.000,00	889,92	0,52%	0,08%
1	GEP	1.349.300,17	624.537,02	291.842,10	46,29%	21,63%
1	ASTIS	1.099.890,00	124.111,81	124.111,81	11,28%	11,28%
1	IDAGO	1.282.888,98	327.826,59	180.717,32	25,55%	14,09%
1	ADRIAWET 2000	1.062.000,00	521.547,26	100.416,49	49,11%	9,46%
1	EnergyViLLab	1.341.000,00	677.886,55	176.038,92	50,55%	13,13%
1	FUTURELIGHTS	1.157.000,00	578.077,03	113.131,37	49,96%	9,78%
1	HYDRO KARST	1.079.435,30	412.175,35	167.835,78	38,18%	15,55%
1	TESSI	998.580,87	189.081,78	115.926,39	18,94%	11,61%
1	MODEF	724.582,66	-	-	0,00%	0,00%
Prednostna naloga 1		23.453.440,00	4.902.606,12	1.828.198,04	20,90%	7,80%
2	PROFILI	1.345.500,00	188.923,23	82.787,66	14,04%	6,15%
2	MACC	1.341.003,02	708.121,15	210.941,17	52,81%	15,73%
2	MOTOR	1.287.000,00	304.237,39	162.466,75	23,64%	12,62%
2	WINE NET	1.184.679,00	207.358,96	143.478,21	17,50%	12,11%
2	AGROTUR	1.045.003,16	487.837,60	259.985,30	46,68%	24,88%



Prednostna naloga	Akronim projekta	Odobrena vrednost projekta v € (A)	Prevzete obveznosti v € (B)	Zahtevani in potrjeni izdatki v € (C)	% prevzetih obveznosti (B/A)	% porabe sredstev (C/A)
2	Heritaste	1.334.999,11	149.364,25	68.629,33	11,19%	5,14%
2	STUDY CIRCLES	714.971,63	302.094,99	97.804,01	42,25%	13,68%
2	TRANSARMON	792.100,00	361.038,43	110.203,85	45,58%	13,91%
2	UE LI JE II	959.706,50	57.241,96	57.241,96	5,96%	5,96%
2	LANATURA	418.819,14	118.285,80	43.953,40	28,24%	10,49%
2	IPforSMEs	1.350.000,00	324.460,93	91.335,70	24,03%	6,77%
2	GLIOMA	1.320.000,00	333.258,66	333.258,66	25,25%	25,25%
2	SOLUM	1.300.318,31	357.272,61	37.070,78	27,48%	2,85%
2	T-lab	1.178.963,65	815.199,64	220.448,50	69,15%	18,70%
2	INNOVAQUA	1.332.000,00	337.733,83	177.525,28	25,36%	13,33%
2	BELLIMPRESA	614.100,00	281.013,98	55.662,23	45,76%	9,06%
Prednostna naloga 2		17.519.163,52	5.333.443,41	2.152.792,79	30,44%	12,29%
3	PESCA	954.000,00	624.395,69	103.197,80	65,45%	10,82%
3	JULIUS	1.313.140,50	276.529,95	100.162,85	21,06%	7,63%
3	EDUKA	1.335.000,00	720.709,07	260.318,61	53,99%	19,50%
3	ALISTO	1.350.000,00	348.094,53	215.908,16	25,78%	15,99%
3	IntegrAid	1.350.000,00	164.787,88	164.787,88	12,21%	12,21%
3	Living Fountains	904.699,11	66.232,87	66.232,87	7,32%	7,32%
3	LEX	538.272,00	283.017,42	85.638,23	52,58%	15,91%
3	SIIT	1.350.000,00	549.259,58	145.413,85	40,69%	10,77%
3	PANGeA	1.253.752,35	264.250,44	264.250,44	21,08%	21,08%
3	SIGN	1.285.441,20	175.834,48	175.834,48	13,68%	13,68%
3	e-surgerynet	1.135.008,10	82.636,84	78.009,13	7,28%	6,87%
3	S.HO.W.	1.350.000,00	417.986,87	417.986,87	30,96%	30,96%
3	SEA	1.345.500,00	474.647,62	127.771,42	35,28%	9,50%
3	e-cardionet	1.349.865,00	53.084,96	21.126,28	3,93%	1,57%



Prednostna naloga	Akronim projekta	Odobrena vrednost projekta v € (A)	Prevzete obveznosti v € (B)	Zahtevani in potrjeni izdatki v € (C)	% prevzetih obveznosti (B/A)	% porabe sredstev (C/A)
3	CAMAA	1.185.321,74	-	-	0,00%	0,00%
Prednostna naloga 3		18.000.000,00	4.501.468,20	2.226.638,87	25,01%	12.37%
Skupaj		58.972.603,52	58.972.603,52	14.737.517,73	6.207.629,70	24,99%

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

V nadaljevanju so predstavljeni podrobnejši podatki z namenom natančnega pregleda vpliva na upravičeno območje. Navedena je natančna porazdelitev sredstev med geografskimi področji programskih partnerjev, v zvezi s sofinanciranimi strateškimi projekti. Analiza prikazuje podatke tako na ravni posameznega projekta kot na ravni prednostne naloge.

Javni razpis št. 02/2009. Porazdelitev sredstev za sofinanciranje odobrenih standardnih projektov glede na geografsko območje po posameznih projektih in prednostni nalogah na dan 31.12.2012.

Prednostna naloga	Akronim projekta	ITALIJA			SLOVENIJA (v €)	SKUPAJ (v €)
		Furlanija Julijska krajina (v €)	Veneto (v €)	Emilia Romagna (v €)		
1	CroCTaL	558.000,00	117.000,00	108.000,00	566.100,00	1.349.100,00
1	TIP	804.990,00	49.500,00	-	472.500,00	1.326.990,00
1	SALTWORKS	-	-	810.000,00	450.000,00	1.260.000,00
1	BioDiNet	367.677,50	183.800,00	75.431,55	708.084,28	1.334.993,33
1	ISO - TO	556.962,50	4.800,00	4.800,00	591.287,85	1.157.850,35
1	ISO-PRE	556.973,47	4.800,00	4.800,00	572.774,33	1.139.347,80
1	GOTRAWAMA	554.373,00	-	39.825,00	614.952,00	1.209.150,00
1	ISO - PRA	557.019,64	4.800,00	4.800,00	578.336,84	1.144.956,48
1	ISO-GIO	557.042,24	4.800,00	4.800,00	554.979,19	1.121.621,43
1	ISO - RE	559.196,07	4.800,00	4.800,00	595.602,83	1.164.398,90
1	ISO-PA	557.070,59	4.800,00	4.800,00	583.683,14	1.150.353,73
1	GEP	413.556,32	63.000,00	63.000,00	809.743,85	1.349.300,17
1	ASTIS	446.823,00	69.075,00	109.848,00	474.144,00	1.099.890,00
1	IDAGO	738.580,06	-	-	544.308,92	1.282.888,98
1	ADRIAWET 2000	504.000,01	288.000,00	-	269.999,99	1.062.000,00



Prednostna naloga	Akronim projekta	ITALIJA			SLOVENIJA (v €)	SKUPAJ (v €)
		Furlanija Julijska krajina (v €)	Veneto (v €)	Emilia Romagna (v €)		
1	EnergyViLLab	112.500,00	661.500,00	72.000,00	495.000,00	1.341.000,00
1	FUTURELIGHTS	511.200,00	-	191.570,00	454.230,00	1.157.000,00
1	HYDRO KARST	591.330,32	-	-	488.104,98	1.079.435,30
1	TESSI	543.335,40	-	176.060,97	279.184,50	998.580,87
1	MODEF	139.997,05	276.045,99	130.984,00	177.555,63	724.582,67
<i>Prednostna naloga 1</i>		9.630.627,17	1.736.720,99	1.805.519,52	10.280.572,33	23.453.440,01
2	PROFILI	220.400,00	585.750,00	104.500,00	434.850,00	1.345.500,00
2	MACC	306.000,00	490.500,90	157.500,00	387.002,12	1.341.003,02
2	MOTOR	144.000,00	144.000,00	432.000,00	567.000,00	1.287.000,00
2	WINE NET	106.800,00	641.690,00	124.600,00	311.589,00	1.184.679,00
2	AGROTUR	343.199,52	-	-	701.803,64	1.045.003,16
2	Heritaste	716.684,78	89.000,00	-	529.314,33	1.334.999,11
2	STUDY CIRCLES	395.088,88	100.108,78	-	219.773,97	714.971,63
2	TRANSARMON	493.500,00	53.000,00	35.600,00	210.000,00	792.100,00
2	UE LI JE II	353.540,90	60.883,00	-	545.282,60	959.706,50
2	LANATURA	144.402,50	-	-	274.416,64	418.819,14
2	IPforSMEs	364.500,00	580.500,00	-	405.000,00	1.350.000,00
2	GLIOMA	571.600,00	26.400,00	-	722.000,00	1.320.000,00
2	SOLUM	397.590,00	-	249.702,72	653.025,59	1.300.318,31
2	T-lab	215.980,00	360.005,00	134.999,18	467.979,47	1.178.963,65
2	INNOVAQUA	765.000,00	234.000,00	-	333.000,01	1.332.000,01
2	BELLIMPRESA	476.149,99	-	-	137.950,00	614.099,99
<i>Prednostna naloga 2</i>		6.014.436,57	3.365.837,68	1.238.901,90	6.899.987,37	17.519.163,52
3	PESCA	464.390,00	81.500,00	72.400,00	335.710,00	954.000,00
3	JULIUS	672.750,50	45.000,00	135.000,00	460.390,00	1.313.140,50
3	EDUKA	816.157,52	69.598,00	40.050,00	409.194,48	1.335.000,00
3	ALISTO	244.000,00	550.507,00	74.243,00	481.250,00	1.350.000,00
3	IntegrAid	348.952,03	182.594,40	-	818.453,57	1.350.000,00



Prednostna naloga	Akronim projekta	ITALIJA			SLOVENIJA (v €)	SKUPAJ (v €)
		Furlanija Julijska krajina (v €)	Veneto (v €)	Emilia Romagna (v €)		
3	Living Fountains	363.258,00	-	63.000,00	478.441,11	904.699,11
3	LEX	393.894,20	-	-	144.377,80	538.272,00
3	SIIT	548.535,37	267.491,70	104.359,50	429.613,43	1.350.000,00
3	PANGeA	279.006,64	78.829,10	142.703,47	753.213,15	1.253.752,36
3	SIGN	365.053,50	134.376,30	57.745,80	728.265,60	1.285.441,20
3	e-surgerynet	239.543,50	598.436,00	-	297.028,60	1.135.008,10
3	S.HO.W.	818.250,00	4.000,00	4.000,00	523.750,00	1.350.000,00
3	SEA	663.750,00	134.325,00	173.250,00	374.175,00	1.345.500,00
3	e-cardionet	369.450,00	625.680,00	-	354.735,00	1.349.865,00
3	CAMAA	159.314,00	473.404,00	156.650,00	395.953,74	1.185.321,74
Prednostna naloga 3		6.746.305,26	3.245.741,50	1.023.401,77	6.984.551,48	18.000.000,01
Skupaj		22.391.369,00	8.348.300,17	4.067.823,19	24.165.111,18	58.972.603,52

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

V zvezi s prednostno nalogo 1 višina sredstev, namenjenih standardnim projektom, znaša v celoti 23.453.440,01 EUR. Delež sredstev, namenjenih italijanskim upravičencem znaša 56,17%, oziroma 13.172.867,68 EUR. Slovenskim upravičencem je dodeljenih 43,83% sredstev, kar je enako skupnemu znesku v višini 10.280.572,33 EUR. Upravičencem posameznih dežel, ki sodelujejo v okviru Programa je dodeljenih 41,06% sredstev - upravičencem Dežele Furlanije Julijske krajine in nekoliko manj od 8% sredstev - upravičencem Dežele Veneto in Dežele Emilia Romagna.

V zvezi s prednostno nalogo 2 višina sredstev, namenjenih standardnim projektom, znaša v celoti približno od 17,5 milijonov EUR. Delež sredstev, dodeljenih italijanskim upravičencem znaša 60,61% oziroma 10.619.176,15 EUR. Podrobneje, po upravičencih posameznih dežel, ki sodelujejo v okviru Programa, je upravičencem Dežele Furlanije Julijske krajine dodeljen nekaj več kot 34% delež, upravičencem Veneta nekaj manj kot 20% delež, medtem ko prejmejo upravičenci Dežele Emilia Romagna nekoliko več od 7%. Slovenskim upravičencem je dodeljenih 39,39% sredstev, kar je enako skupnemu znesku v višini 6.899.987,37 EUR.

V zvezi s prednostno nalogo 3 višina sredstev, namenjenih standardnim projektom, znaša 18 milijonov EUR. Delež sredstev, dodeljenih italijanskim upravičencem znaša 61,20% oziroma 11.015.448,53 EUR. Podrobneje, po upravičencih posameznih dežel, ki sodelujejo v okviru Programa, je upravičencem Dežele Furlanije Julijske krajine dodeljen delež sredstev, ki je nekoliko višji od 37%, upravičencem Dežele Veneto 18,03% sredstev, medtem ko prejmejo



upravičenci Dežele Emilia Romagna skoraj 6% sredstev. Slovenskim upravičencem je dodeljenih 38,80% sredstev, kar je enako skupnemu znesku v višini 6.984.551,48 EUR.

Podrobneje, v okviru prednostne naloge 1, projekt Tip beleži najvišji delež sredstev (60,66% celotne vrednosti projekta), namenjenih upravičencem iz Furlanije Julijske krajine (VP omenjenega projekta prihaja z istega območja). Dežela Veneto prejme največji delež sredstev v okviru projekta EnergyVillab (49,33%) in tudi v tem primeru VP prihaja z istega programskega območja. Emilia Romagna beleži najvišji odstotek sredstev v okviru projekta Saltworks (64,29%), pri katerem tudi VP prihaja z istega programskega območja. Z vidika slovenskega partnerstva je projekt z najvišjim odstotkom dodeljenih sredstev, namenjenih slovenskim upravičencem, projekt Gep, s 60,01% deležem. Tudi v tem primeru VP prihaja z istega programskega območja.

V okviru prednostne naloge 2 projekt Innovaqua beleži najvišji delež sredstev (57,43% celotne vrednosti projekta), namenjenih deželi Furlaniji Julijski krajini (VP prihaja z istega območja). Dežela Veneto prejme najvišji delež sredstev v okviru projekta Winenet (54,17%), pri katerem tudi VP prihaja iz Dežele Veneto. Emilia Romagna pa beleži najvišji odstotek sredstev pri projektu Motor (33,57%), VP pa v tem primeru prihaja iz Republike Slovenije. Z vidika slovenskega partnerstva je projekt z najvišjim odstotkom sredstev, namenjenih slovenskim upravičencem, projekt Agrotur s 67,16% deležem. Tudi v tem primeru VP prihaja z istega programskega območja.

V okviru prednostne naloge 3 projekt S.HO.W beleži najvišji delež sredstev (60,61% celotne vrednosti projekta), dodeljenih upravičencem Dežele Furlanije Julijske krajine (VP je z istega območja). Dežela Veneto pa ima najvišji delež sredstev pri projektu e-cardionet (46,35%), katerega VP prihaja z istega programskega območja. Emilia Romagna beleži pa najvišji odstotek sredstev v okviru projekta Sea (12,88%), katerega VP prihaja iz Dežele Furlanije Julijske krajine. Z vidika slovenskega partnerstva je projekt z najvišjim odstotkom sredstev, namenjenih slovenskim upravičencem projekt Integraid s 60,63% deležem. VP projekta prihaja iz Republike Slovenije.

Sredstva dodeljena območjem, vključenim na osnovi »načela fleksibilnosti«, v skladu s 1. točko 21. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006 in določili javnega razpisa št. 02/2009, ne presegajo omejitve 20% prispevka ESRR sredstev na ravni posameznega projekta.

V spodnji tabeli so za javni razpis za standardne projekte št. 02/2009, po posamezni prednostni nalogi, navedeni podrobnejši podatki o sredstvih, dodeljenih območjem, vključenim na osnovi »načela fleksibilnosti«. Skupni znesek sredstev znaša 6.507.797,61 EUR. Območjem, vključenim na osnovi »načela fleksibilnosti« v Republiki Italiji, in sicer Pokrajini Pordenone, je dodeljenih 5,71% sredstev, Pokrajini Treviso pa 8,36% sredstev. Območjem, vključenim na osnovi »načela fleksibilnosti« v Republiki Sloveniji je dodeljenih 85,93% sredstev, in sicer 76,54% sredstev Osrednjeslovenski statistični regiji in 9,39% sredstev Notranjsko-kraški statistični regiji.



Javni razpis št. 02/2009. Posamezne prednostne naloge - porazdelitev sredstev sofinanciranih standardnih projektov po območjih, vključenih na osnovi »načela fleksibilnosti«, na dan 31.12.2012.

Prednostna naloga	ITALIJA		SLOVENIJA	
	Pordenone (v €)	Treviso (v €)	Osrednjeslovenska (v €)	Notranjsko-kraška (v €)
1	39.551,25	45.000,00	1.303.760,66	363.221,62
2	156.000,05	225.000,00	2.105.532,96	76.500,00
3	75.859,20	274.000,00	1.572.075,47	171.296,40
Skupaj	371.410,50	544.000,00	4.981.369,09	611.018,02

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

JAVNI RAZPIS ŠT. 03/2011 ZA PREDLOŽITEV STANDARDNIH PROJEKTOV - SREDSTVA NAMENJENA OŽJEMU KOPENSKEMU OBMOČJU

Tabela navedena v nadaljevanju vsebuje pregled 20 odobrenih standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju in vrednost odobrenih sredstev za posamezni projekt.

Vrednost dodeljenih sredstev za izvedbo 20 sofinanciranih projektov v okviru javnega razpisa št. 03/2011 znaša nekaj več kot 18 milijonov EUR, od tega je 15,4 milijonov EUR ESRR sredstev.

V okviru prednostne naloge 1 je Pogodbe o dotaciji sofinanciranja sklenilo 5 projektov, katerim je dodeljenih 42% sredstev javnega razpisa. V okviru prednostne naloge 2 je sofinanciranih 9 projektov, katerim je dodeljenih 35,30% sredstev, v okviru prednostne naloge 3 pa je 6 sofinanciranih projektov dodeljenih 22,70% sredstev.

Povprečna vrednost projekta v okviru prednostne naloge 1 je približno 1,5 milijonov EUR, v okviru prednostne naloge 2 približno 700 tisoč EUR, v okviru prednostne naloge 3 pa nekaj manj kot 690 tisoč EUR.

Javni razpis št. 03/2011. Sofinancirani projekti in odobrena vrednost.

Prednostna naloga	Akronim projekta	Odobrena vrednost projekta (v €)	Sredstva ESRR (v €)	Datum podpisa Pogodbe o dotaciji sofinanciranja
1	Treccorala	1.430.000,00	1.215.500,00	19.10.2012
1	BIMOBIS	1.500.000,00	1.275.000,00	26.10.2012
1	TRADOMO	2.662.989,50	2.263.541,08	22.10.2012
1	ENRI	605.000,00	514.250,00	18.10.2012
1	CAMIS	1.431.258,99	1.216.570,14	26.10.2012
5	Skupaj PN 1	7.629.248,49	6.484.861,22	
2	SHARTEC	998.300,00	848.555,00	26.10.2012
2	FarMeat	969.600,00	824.160,00	28.11.2012
2	VISO	700.000,00	595.000,00	07.11.2012
2	NUVOLAK	407.550,00	346.417,50	22.10.2012
2	Mina	998.293,18	848.549,20	18.10.2012
2	OGV	495.400,00	421.090,00	21.11.2012



Prednostna naloga	Akronim projekta	Odobrena vrednost projekta (v €)	Sredstva ESRR (v €)	Datum podpisa Pogodbe o dotaciji sofinanciranja
2	Proteo	1.000.000,00	850.000,00	21.12.2012
2	RURAL	450.693,00	383.089,05	19.10.2012
2	EnjoyTour	391.374,32	332.668,17	07.11.2012
9	Skupaj PN 2	6.411.210,50	5.449.528,93	
3	POT MIRU-VIA DI PACE	1.000.000,00	850.000,00	19.10.2012
3	ZBORZBIRK	999.725,00	849.766,25	22.10.2012
3	LIVING LANDSCAPE	390.000,00	331.500,00	24.10.2012
3	AGRI-KNOWS	389.600,00	331.160,00	24.10.2012
3	PratiCons	689.700,00	586.245,00	19.10.2012
3	ECHOS	654.900,00	556.665,00	02.11.2012
6	Skupaj PN 3	4.123.925,00	3.505.336,25	
20	Skupaj - vse PN	18.164.383,99	15.439.726,39	

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju

Kot navedeno v povzetku odločitev, ki jih je sprejel NO (tabela v poglavju 2.1.1), so bile v okviru 34. dopisne seje, dne 2. oktobra 2012, odobrene spremembe partnerstva projekta PratiCons. Na 35. dopisni seji z dne 6. novembra 2012, je NO odobril spremembe partnerstva projekta PROTEO ter se seznanil z manjšimi spremembami projektov TRADOMO in BIMOBIS. Na 38. dopisni seji z dne 6. februarja 2013 je NO odobril spremembe projekta MINA, na 39. dopisni seji z dne 26. februarja 2013 pa se je seznanil s spremembami projekta CAMIS.

Pogodba o dotaciji sofinanciranja za projekt PROTEO je bila zaradi pozne predložitve izjav o državnih pomočeh podpisana 21. decembra 2012.

Vse Pogodbe o dotaciji sofinanciranja so bile podpisane do konca leta 2012, skladno z določili 16. poglavja javnega razpisa št. 03/2011.

Dokumentacija posameznih projektov (Prijava, Opis stroškovnega načrta, Pogodba o partnerstvu in Pogodba o dotaciji sofinanciranja) je bila za potrebe sklenitve pogodb o slovenskem nacionalnem sofinanciranju objavljena na portalu »4PM«, v uporabi od leta 2012.

V nadaljevanju so predstavljeni podrobnejši podatki z namenom natančne analize vpliva na upravičeno območje, pri tem je navedena natančna finančna porazdelitev med geografskimi področji programskih partnerjev (Republika Italija - le Furlanija Julijska krajina - in Republika Slovenija) za sofinancirane standardne projekte - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju. Tabela vsebuje podatke na ravni posameznega projekta ter na ravni prednostne naloge.



Javni razpis št. 03/2011. Porazdelitev sredstev za sofinanciranje odobrenih standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju - glede na geografsko območje po posameznih projektih in prednostni nalogah na dan 31.12.2012.

Prednostna naloga	Akronim projekta	Furlanija Julijska krajina (v €)	Republika Slovenija (v €)
1	Trecorala	1.156.300,00	273.700,00
1	BIMOBIS	700.000,00	800.000,00
1	TRADOMO	1.010.162,00	1.652.827,50
1	ENRI	311.000,00	294.000,00
1	CAMIS	668.128,06	763.130,93
5	Skupaj PN 1	3.845.590,06	3.783.658,43
2	SHARTEC	359.050,00	639.250,00
2	FarMeat	500.600,00	469.000,00
2	VISO	475.000,00	225.000,00
2	NUVOLAK	139.000,00	268.550,00
2	Mina	608.338,03	389.955,15
2	OGV	295.000,00	200.400,00
2	Proteo	700.000,00	300.000,00
2	RURAL	297.893,00	152.800,00
2	EnjoyTour	168.109,92	223.264,40
9	Skupaj PN 2	3.542.990,95	2.868.219,55
3	POT MIRU-VIA DI PACE	550.000,00	450.000,00
3	ZBORZBIRK	346.205,00	653.520,00
3	LIVING LANDSCAPE	180.000,00	210.000,00
3	AGRI-KNOWS	196.160,00	193.440,00
3	PratiCons	340.500,00	349.200,00
3	ECHOS	405.000,00	249.900,00
6	Skupaj PN 3	2.017.865,00	2.106.060,00
20	Skupaj - vse PN	9.406.446,01	8.757.937,98

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju

V zvezi s prednostno nalogo 1 višina sredstev, namenjenih standardnim projektom - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju -, znaša 7.629.248,49 EUR. Delež sredstev italijanskih upravičencev znaša 50,41%, oziroma 3.845.590,06 EUR. Slovenskim upravičencem je dodeljenih 49,59% sredstev, kar je enako skupnemu znesku v višini 3.783.658,43 EUR.

V zvezi s prednostno nalogo 2 višina sredstev, namenjenih standardnim projektom, znaša v celoti približno od 6,4 milijonov EUR. Delež sredstev, dodeljenih italijanskim upravičencem znaša 55,26% oziroma 3.542.990,95 EUR. Slovenskim upravičencem je dodeljenih 44,74% sredstev, kar je enako skupnemu znesku v višini 2.868.219,55 EUR.

V zvezi s prednostno nalogo 3 višina sredstev, namenjenih standardnim projektom, znaša 4.123.295,00 EUR. Delež sredstev, dodeljenih italijanskim upravičencem znaša 48,93% oziroma 2.017.865,00 EUR. Slovenskim upravičencem je dodeljenih 51,07% sredstev, kar je enako skupnemu znesku v višini 2.106.060,00 EUR.



V okviru prednostne naloge 1 projekt Treccorale beleži najvišji delež sredstev (80,86 % celotne vrednosti projekta), dodeljenih italijanskim upravičencem iz Dežele Furlanije Julijske krajine (VP projekta prihaja iz istega območja). Z vidika slovenskega partnerstva je projekt z najvišjim odstotkom celotnih dodeljenih sredstev, namenjenih slovenskim upravičencem, projekt Tradomo, z 62,07% deležem sredstev. Tudi v tem primeru VP prihaja z istega programskega območja.

V okviru prednostne naloge 2 projekt Proteo beleži najvišji delež sredstev (70% celotne vrednosti projekta), namenjenih italijanskim upravičencem iz Dežele Furlanije Julijske krajine. Pri omenjenem projektu VP prihaja iz istega območja. Z vidika slovenskega partnerstva je projekt z najvišjim odstotkom celotnih dodeljenih sredstev, namenjenih slovenskim upravičencem, projekt Shartec, s 64,03% deležem sredstev. Tudi v tem primeru VP prihaja z istega programskega območja.

V okviru prednostne naloge 3 projekt POT MIRU - VIA DI PACE beleži najvišji delež sredstev (55% celotne vrednosti projekta), dodeljenih italijanskim upravičencem iz Dežele Furlanije Julijske krajine. VP projekta prihaja z istega območja. Z vidika slovenskega partnerstva je projekt z najvišjim odstotkom sredstev, namenjenih slovenskim upravičencem, projekt Zborzbirk s 65,37% deležem sredstev. Tudi v tem primeru VP projekta prihaja z istega programskega območja.

Sredstva dodeljena območjem, vključenim na osnovi »načela fleksibilnosti«, v skladu s 1. točko 21. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006 in določili javnega razpisa št. 03/2011, ne presegajo omejitve 20% prispevka ESRR sredstev na ravni posameznega projekta.

Sredstva, dodeljena območjem, vključenim na osnovi »načela fleksibilnosti« znašajo skupno 546.400,00 EUR, t.j. 3,01% sredstev, namenjenih projektom, ki se izvajajo na ožjem kopenskem območju. Štirje projekti vključujejo upravičence, ki prihajajo z območij, vključenih na osnovi »načela fleksibilnosti«: trije v okviru prednostne naloge 1 in en v okviru prednostne naloge 2. Območja, vključena na osnovi »načela fleksibilnosti«, ki so prejela sredstva so Pokrajina Pordenone za Republiko Italijo (projekt Enri) in Osrednjeslovenska statistična regija za Republiko Slovenijo (projekti Camis, Bimobis, OGV).



2.1.3 Informacije o razdelitvi uporabe skladov

- Navedite informacije v skladu z delom c) Priloge II

Javne razpise za strateške (JR št. 01/2009) in standardne (JR št. 02/2009 in JR št. 03/2011) projekte je zaznamoval velik in pozitiven odziv, zahvaljujoč tudi intenzivnemu informiranju in pomoči predlagateljem ter potencialnim upravičencem na upravičenem območju, ki jih je izvajal OU s STS, v sodelovanju s programskimi partnerji (glej prejšnje tabele iz tega poglavja in tiste v 6. poglavju).

V spodnji tabeli je prikazana porazdelitev evropskih finančnih sredstev ESRR po prednostnih temah, ki so bile prvotno predvidene v O.P.

Prednostna tema	Šifra	Okvirna razdelitev (% prispevka ESRR)
Raziskave in tehnološki razvoj	03 Prenos tehnologije in izboljšanje omrežij sodelovanja med malimi in srednje velikimi podjetji (MSP), med temi podjetji in drugimi podjetji in univerzami, posrednješolskimi izobraževalnimi ustanovami vseh vrst, regionalnimi organi, raziskovalnimi, znanstvenimi in tehnološkimi središči (znanstveni in tehnološki parki itd.)	5
	04 Pomoč R&TR, zlasti v MSP (vključno z dostopom do storitev R&TR v raziskovalnih središčih)	3
	05 Izpopolnjene pomožne storitve za podjetja in skupine podjetij	2
Informacijska družba	11 Informacijske in komunikacijske tehnologije (dostop, varnost, interoperabilnost, preprečevanje tveganja, raziskave, inovacije, spletne vsebine itd.)	4
Promet	26 Multimodalni prevoz	13
Energetika	43 Učinkovita raba in soproizvodnja energije, gospodarjenje z njo	7
Varstvo okolja in preprečevanje tveganja	51 Spodbujanje biološke raznovrstnosti in varstva narave (vključno z Naturo 2000)	6
	53 Preprečevanje tveganja (vključno s pripravo ter izvajanjem načrtov in ukrepov za preprečevanje in obvladovanje naravnih in tehnoloških tveganj)	5
	54 Drugi ukrepi za ohranjanje okolja in preprečevanje tveganja	5
Turizem	57 Druga podpora za izboljšanje turističnih storitev	10
Kultura	60 Druga podpora za izboljšanje kulturnih storitev	10



Prednostna tema	Šifra	Okvirna razdelitev (% prispevka ESRR)
<i>Povečevanje prilagodljivosti delavcev in gospodarskih družb, podjetij in podjetnikov</i>	62 Razvoj sistemov in strategij vseživljenjskega učenja v podjetjih; usposabljanje in storitve za zaposlene za povečanje njihove prilagodljivosti na spremembe; spodbujanje podjetništva in inovacij	2
<i>Izboljšati dostop do zaposlitve in trajnostno udeležbo</i>	69 Ukrepi za izboljšanje dostopa do zaposlitve in povečanje obsega trajnostne udeležbe in napredka žensk v zaposlovanju za zmanjšanje razlik med spoloma na trgu dela ter ukrepi, s pomočjo katerih je lažje usklajevati delo in zasebno življenje, denimo lažje dostopno varstvo otrok in skrb za nepreskrbljene osebe	4
<i>Izboljšanje človeškega kapitala</i>	73 Ukrepi za povečanje udeležbe pri izobraževanju in usposabljanju skozi vsa življenjska obdobja, tudi z ukrepi za zmanjšanje predčasne opustitve šolanja in razlikovanja predmetov glede na spol, ter za boljše kakovost začetnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izobraževanja in usposabljanja odraslih oziroma za boljši dostop do takšnega izobraževanja in usposabljanja	2
	74 Razvijanje človeških virov na področju raziskav in inovacij, zlasti s pomočjo podiplomskih študijev in usposabljanja raziskovalcev, ter mrežnih aktivnosti med visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi centri in podjetji	2
<i>Naložbe v socialno infrastrukturo</i>	76 Zdravstvena infrastruktura	8
	79 Druga socialna infrastruktura	6
<i>Tehnična pomoč</i>	85 Priprava, izvajanje, spremljanje in pregled	4
	86 Ocena in študije; informacije in komunikacija	2

Razmerje med indikativnimi odstotki v tabeli in dejansko realizacijo v okviru sofinanciranih projektov, bo vključeno v letno poročilo 2013, ko bodo upoštevani podatki o vseh sofinanciranih projektih.

Za sofinancirane strateške projekte, je prikazana porazdelitev sredstev ESRR po kategorijah za vsak posamezni projekt, kot navedeno v Prijavnici s strani VP.



Javni razpis št. 01/2009 Strateški projekti. Sofinancirani projekti in porazdelitev sredstev.

Prednostna naloga	Akronim projekta	Vrednost projekta (v €)	Od teh sredstev ESRR (v €)	Prednostna tema	Šifra
1	Climaparks	3.239.513,01	2.753.586,06	Varstvo okolja in preprečevanje tveganja	51 Spodbujanje biološke raznovrstnosti in varstva narave (vključno z Naturo 2000) 53 Preprečevanje tveganja (vključno s pripravo ter izvajanjem načrtov in ukrepov za preprečevanje in obvladovanje naravnih in tehnoloških tveganj)
1	Sigma 2	3.697.431,50	3.142.816,78		
1	Carso - Kras	3.085.000,00	2.622.250,00		
1	Safeport	2.730.000,00	2.320.500,00		
1	Adria A	3.289.000,00	2.795.650,00	Promet	26 Multimodalni prevoz
1	Interbike	3.514.000,00	2.986.900,00		24 Kolesarske steze
2	Slowtourism	3.815.700,00	3.243.345,00	Turizem	57 Druga podpora za izboljšanje turističnih storitev
2	Citius	2.810.946,50	2.389.304,53	Raziskave in tehnološki razvoj	01 Dejavnosti na področju R&TR v raziskovalnih centrih
2	Icon	3.167.095,00	2.692.030,75		05 Izpopolnjene pomožne storitve za podjetja in skupine podjetij
2	Know Us	2.831.000,00	2.406.350,00		03 Prenos tehnologije in izboljšanje omrežij sodelovanja med malimi in srednje velikimi podjetji (MSP), med temi podjetji in drugimi podjetji in univerzami, posrednješkimi izobraževalnimi ustanovami vseh vrst, regionalnimi organi, raziskovalnimi, znanstvenimi in tehnološkimi središči (znanstveni in tehnološki parki itd.)
2	Trans2Care	2.611.118,00	2.219.450,30		
3	E-Health	3.000.000,00	2.550.000,00	Naložbe v socialno infrastrukturo	76 Zdravstvena infrastruktura
3	Jeziklingua	3.000.000,00	2.550.000,00	Kultura	58 Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine
3	Shared Culture	3.500.000,07	2.975.000,06		
3	Parsjad	2.800.000,00	2.380.000,00		
3	Openmuseums	3.856.000,00	3.277.600,00		60 Druga podpora za izboljšanje kulturnih storitev

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih



Za sofinancirane standardne projekte, je prikazana porazdelitev finančnih sredstev ESRR po kategorijah za vsak posamezni projekt, kot navedeno v Prijavnici s strani VP.

Javni razpis št. 02/2009 - Standardni projekti. Sofinancirani projekti in porazdelitev sredstev.

Prednostna naloga	Akronim projekta	Vrednost projekta (v €)	Od teh sredstev ESRR (v €)	Prednostna tema	Šifra
1	CroCTaL	1.349.100,00	1.146.735,00	Promet	24 Kolesarske steze
1	TIP	1.326.990,00	1.127.941,50		26 Multimodalni prevoz
1	EnergyViLLab	1.341.000,00	1.139.850,00	Energetika	43 Učinkovita raba in sproizvodnja energije, gospodarjenje z njo
1	FUTURELIGHTS	1.157.000,00	983.450,00		
1	HYDRO KARST	1.079.435,30	917.520,00	Varstvo okolja in preprečevanje tveganja	45 Upravljanje in distribucija vode (pitne vode)
1	ISO - TO	1.157.850,35	984.172,79		46 Čiščenje vode (odpadne vode)
1	ISO-PRE	1.144.956,48	973.213,00		
1	ISO - PRA	1.139.347,80	968.445,63		
1	ISO-GIO	1.121.621,43	953.378,21		
1	ISO - RE	1.164.398,91	989.739,07		
1	ISO-PA	1.150.353,73	977.800,67		
1	GOTRAWAMA	1.209.150,00	1.027.777,50		48 Celovito preprečevanje in nadzor onesnaževanja
1	ASTIS	1.099.890,00	934.906,50		51 Spodbujanje biološke raznovrstnosti in varstva narave (vključno z <i>Naturo 2000</i>)
1	SALTWORKS	1.260.000,00	1.071.000,00		
1	BioDiNet	1.334.993,33	1.134.744,33		
1	ADRIAWET 2000	1.062.000,00	902.700,00		53 Preprečevanje tveganja (vključno s pripravo ter izvajanjem načrtov in ukrepov za preprečevanje in obvladovanje naravnih in tehnoloških tveganj)
1	TESSI	998.580,87	848.793,73		
1	GEP	1.349.300,17	1.146.905,14	Obnova mest in podeželja	61 Celostni projekti za obnovo mest in podeželja
1	IDAGO	1.282.888,98	1.090.455,63		



Prednostna naloga	Akronim projekta	Vrednost projekta (v €)	Od teh sredstev ESRR (v €)	Prednostna tema	Šifra
2	MACC	1.341.003,02	1.139.852,56	<i>Raziskave in tehnološki razvoj (RTR), inovacije in podjetništvo</i>	03 Prenos tehnologije in izboljšanje omrežij sodelovanja med malimi in srednje velikimi podjetji (MSP), med temi podjetji in drugimi podjetji in univerzami, posrednješolskimi izobraževalnimi ustanovami vseh vrst, regionalnimi organi, raziskovalnimi, znanstvenimi in tehnološkimi središči (znanstveni in tehnološki parki itd.)
2	IPforSME	1.350.000,00	1.147.500,00		
2	GLIOMA	1.320.000,00	1.122.000,00		
2	WINE NET	1.184.679,00	1.006.977,15		
2	INNOVAQUA	1.332.000,00	1.132.200,00		
2	BELLIMPRESA	614.100,00	521.985,00		
2	PROFILI	1.345.500,00	1.143.675,00		05 Izpopolnjene pomožne storitve za podjetja in skupine podjetij
2	TRANSARMON	792.100,00	673.285,00	<i>Turizem</i>	09 Drugi ukrepi za spodbujanje raziskav, inovacij in podjetništva v MSP
2	LANATURA	418.819,14	355.996,26		55 Poudarjanje pomena naravnih dobrin
2	SOLUM	1.300.318,31	1.105.270,56		57 Druga podpora za izboljšanje turističnih storitev
2	T-lab	1.179.000,00	1.002.150,00		
2	MOTOR	1.287.000,00	1.093.950,00		
2	AGROTUR	1.045.003,50	888.252,97		
2	Heritaste	1.334.999,11	1.134.749,24		
2	UE LI JE II	959.706,50	815.750,52		



Prednostna naloga	Akronim projekta	Vrednost projekta (v €)	Od teh sredstev ESRR (v €)	Prednostna tema	Šifra
2	STUDY CIRCLES	714.971,63	607.725,88	<i>Izboljšanje človeškega kapitala</i>	73 Ukrepi za povečanje udeležbe pri izobraževanju in usposabljanju skozi vsa življenjska obdobja, tudi z ukrepi za zmanjšanje predčasne opustitve šolanja in razlikovanja predmetov glede na spol, ter za boljšo kakovost začetnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izobraževanja in usposabljanja odraslih oziroma za boljši dostop do takšnega izobraževanja in usposabljanja
3	EDUKA	1.335.000,00	1.134.750,00	<i>Informacijska družba</i>	11 Informacijske in komunikacijske tehnologije (dostop, varnost, interoperabilnost, preprečevanje tveganja, raziskave, inovacije, spletne vsebine itd.)
3	SIIT	1.350.000,00	1.147.500,00		
3	PESCA	954.000,00	810.900,00	<i>Kultura</i>	58 Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine
3	Living Fountains	904.699,11	768.994,24		59 Razvoj kulturne infrastrukture
3	JULIUS	1.313.140,50	1.116.169,42		
3	LEX	538.272,00	457.531,20		
3	ALISTO	1.350.000,00	1.147.500,00		
3	PANGeA	1.253.752,35	1.065.689,50	<i>Izboljšanje dostopa do zaposlitve in trajnostne udeležbe</i>	67 Ukrepi za spodbujanje aktivnega staranja in podaljševanja delovne dobe
3	SEA	1.345.500,00	1.143.675,00	<i>Povečanja socialne vključenosti prikrajšanih oseb</i>	71 Možnosti vključevanja in ponovnega zaposlovanja za prikrajšanje ljudi; boj proti diskriminaciji pri dostopu in napredovanju na trgu dela ter spodbujanje sprejemanja različnosti na delovnem mestu
3	e-surgerynet	1.135.008,10	964.756,88	<i>Izboljšanje človeškega kapitala</i>	72 Načrtovanje, uvajanje in izvajanje reform v sistemih izobraževanja in usposabljanja
3	e-cardionet	1.349.865,00	1.147.385,25		
3	IntegrAid	1.350.000,00	1.147.500,00	<i>Naložbe v socialno infrastrukturo</i>	76 Zdravstvena infrastruktura
3	SIGN	1.285.441,20	1.092.625,02		



Prednostna naloga	Akronim projekta	Vrednost projekta (v €)	Od teh sredstev ESRR (v €)	Prednostna tema	Šifra
3	S.HO.W.	1.350.000,00	1.147.500,00	Krepitev institucionalne zmogljivosti na nacionalni, regionalni in lokalni ravni	81 Mehanizmi za izboljšanje dobrega načrtovanja, spremljanja in ocenjevanja

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

Za sofinancirane standardne projekte - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju - je prikazana porazdelitev finančnih sredstev ESRR po kategorijah za vsak posamezni projekt, kot navedeno v Prijavnici s strani VP.

Javni razpis št. 03/2011 - Standardni projekti - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju. Sofinancirani projekti in porazdelitev sredstev.

Prednostna naloga	Akronim projekta	Vrednost projekta (v €)	Od teh sredstev ESRR (v €)	Prednostna tema	Šifra
1	BIMOBIS	1.500.000,00	1.275.000,00	Promet	24 Kolesarske steze
1	ENRI	605.000,00	514.250,00	Energetika	43 Učinkovita raba in soproizvodnja energije, gospodarjenje z njo
1	CAMIS	1.431.258,99	1.216.570,14	Varstvo okolja in preprečevanje tveganja	45 Upravljanje in distribucija vode (pitne vode)
1	TRECORALA	1.430.000,00	1.215.500,00		51 Spodbujanje biološke raznovrstnosti in varstva narave (vključno z Naturo 2000)
1	TRADOMO	2.662.989,50	2.263.541,08		52 Spodbujanje čistega mestnega prevoza
2	PROTEO	1.000.000,00	850.000,00	Raziskave in tehnološki razvoj (R&ST), inovacije in podjetništvo	02 Infrastruktura za RTR (vključno z opremo in objektom, instrumenti ter računalniškimi omrežji za hitri prenos, ki povezujejo raziskovalna središča) in pristojna središča za določeno tehnologijo
2	SHARTEC	998.300,00	848.555,00		06 Pomoč MSP za spodbujanje okolju prijaznih izdelkov in proizvodnih procesov (uvajanje učinkovitega sistema upravljanja okolja, sprejetje in uporaba tehnologij za preprečevanje onesnaženja, vključevanje čistih tehnologij v proizvodnjo v podjetjih)
2	VISO	700.000,00	595.000,00		
2	FARMEAT	969.600,00	824.160,00		



Prednostna naloga	Akronim projekta	Vrednost projekta (v €)	Od teh sredstev ESRR (v €)	Prednostna tema	Šifra
2	NUVOLAK	407.550,00	346.417,50	Informacijska družba	14 Storitve in aplikacij za MSP (<i>e-poslovanje, izobraževanje in usposabljanje, povezovanje v mreže itd.</i>)
2	OGV	495.400,00	421.090,00		
2	ENJOY TOUR	391.374,32	332.668,17	Turizem	57 Druga podpora za izboljšanje turističnih storitev
2	RURAL	450.693,00	383.089,05		
2	MINA	998.293,18	848.549,20	Izboljšanje človeškega kapitala	74 Razvijanje človeških virov na področju raziskav in inovacij, zlasti s pomočjo podiplomskih študijev in usposabljanja raziskovalcev, ter dejavnosti mrežnega povezovanja med univerzami, raziskovalnimi centri in podjetji
3	ZBORZBIRK	999.725,00	849.766,25	Kultura	58 Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine
3	ECHOS	654.900,00	556.670,04		
3	POT MIRU - VIA DI PACE	1.000.000,00	850.000,00		
3	PRATICON	689.700,00	586.245,00		
3	LIVING LANDSCAPE	390.000,00	331.500,00		
3	AGRI-KNOWS	389.600,00	331.160,00	Izboljšanje človeškega kapitala	72 Načrtovanje, uvajanje in izvajanje reform v sistemih izobraževanja in usposabljanja, da se poveča možnost zaposlitve, ustreznost začetnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja za trg dela ter da izobraževalni kadri nadgrajujejo znanja zaradi inovacij in na znanju temelječega gospodarstva

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju

V okviru vseh treh razpisov so najbolj zastopane sledeče **prednostne teme**:

- "Varstvo okolja in preprečevanje tveganja" z 21-imi sofinanciranimi projekti,
- "Raziskave in tehnološki razvoj" s 16-imi sofinanciranimi projekti,
- "Kultura" s 14-imi sofinanciranimi projekti.

Po 3 projekti se izvajajo v okviru prednostnih tem "Energetika" in "Naložbe v socialno infrastrukturo", medtem ko se 4 posamezne prednostne tematike izvajajo v okviru enega samega projekta.

Glede prikazanega pregleda **šifer projektov** lahko ugotovimo, da so najbolj zastopane sledeče šifre:

- “58 Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine” z 10-imi projekti,
- “57 Druga podpora za izboljšanje turističnih storitev” z 9-imi projekti,
- “03 Prenos tehnologije in izboljšanje omrežij sodelovanja med malimi in srednje velikimi podjetji (MSP), med temi podjetji in univerzami, posredniškimi izobraževalnimi ustanovami vse vrst, regionalnimi organi, raziskavami, znanstvenimi in tehnološkimi središči (znanstveni parki in tehnološki parki itd.)« in »51 Spodbujanje biološke raznovrstnosti in varstva narave (vključno z Natura 2000)« vsaka z 8-imi projekti.

Najmanj zastopanih je 11 šifer, in sicer se v okviru le-teh izvaja po 1 projekt.



2.1.4 Pomoč ciljnim skupinam

- Za operativne programe, ki jih sofinancira ESRR: predstaviti vse ustrezne informacije o posebnih ciljnih skupinah, sektorjih ali področjih (če je ustrezno).

V okviru 16 strateških projektov sofinanciranih iz sredstev javnega razpisa št. 01/2009 projektne aktivnosti izvaja skupno 229 PP: pri vsakem projektu poleg VP povprečno sodeluje približno 14 PP, vključno z VP. Partnerstva obsegajo najmanj 6 in največ 30 subjektov.

Najnižja vrednost sofinanciranja, t.j. 4.980,00 EUR, je bila dodeljena Občini Sežana, kot projektnemu partnerju v okviru projekta ADRIA-A, najvišja vrednost sofinanciranja, v višini 2.463.331,50 EUR, pa Univerzi na Primorskem, kot VP projekta SIGMA2.

Število VP oz. glavnih upravičencev, ki prihajajo iz obeh držav je uravnoteženo: 9 VP prihaja iz Republike Italije in 7 VP prihaja iz Republike Slovenije.

Za Italijo:

- 4 VP iz Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine;
- 3 VP iz Dežele Veneto;
- 2 VP iz Dežele Emilia Romagna.

Za Republiko Slovenijo:

- 2 VP iz Goriške statistične regije;
- 1 VP iz Gorenjske statistične regije;
- 4 VP iz Obalno-kraške statistične regije.



Javni razpis št. 01/2009. Sofinancirani projekti in partnerstvo.

Prednostna naloga	Akronim projekta	Datum podpisa Pogodbe o dotaciji sofinanciranja	Območje izvora VP	Št. projektnih partnerjev (VKLJUČNO Z VP)
1	Climaparks	29.07.2010	SLO	9
1	Sigma 2	26.07.2010	SLO	12
1	Carso - Kras	27.07.2010	SLO	17
1	Adria A	15.07.2010	ITA	28
1	Interbike	08.09.2011	SLO	23
1	Safeport	26.09.2011	ITA	8
Prednostna naloga 1				97
2	Slowtourism	20.07.2010	ITA	30
2	Citius	04.08.2010	SLO	6
2	Icon	19.07.2010	SLO	15
2	Trans2care	26.07.2011	ITA	13
2	Know Us	30.12.2010	ITA	16
Prednostna naloga 2				80
3	Jeziklingua	26.07.2010	ITA	12
3	E-Health	13.07.2010	ITA	13
3	Openmuseums	22.08.2011	ITA	11
3	Shared Culture	26.07.2010	SLO	7
3	Parsjad	05.08.2010	ITA	9
Prednostna naloga 3				52
Skupno št. projektnih partnerjev				229

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

Spodnja tabela prikazuje območja, s katerih prihajajo PP, ki sodelujejo v okviru sofinanciranih strateških projektov:

- v okviru prednostne naloge 1 sodeluje 59 italijanskih PP in 38 slovenskih PP;
- v okviru prednostne naloge 2 sodeluje 45 italijanskih PP in 35 slovenskih PP;
- v okviru prednostne naloge 3 sodeluje 28 italijanskih PP in 24 slovenskih PP.

Iz italijanskih dežel torej skupno prihaja 132 PP, iz slovenski statističnih regij pa 97 PP.

**Javni razpis št. 01/2009. Sofinancirani projekti in partnerstvo. Območje izvora PP.**

Pred. naloga	ITALIJA				SLOVENIJA						Skupno
	Furlanija Julijska krajina	Veneto	Emilia Romagna	Drugo	Goriška	Gorenjska	Obalno-kraška	Notranjsko kraška	Osrednje slovenska	Drugo	
1	35	14	8	2	11	3	20	0	4	0	97
2	19	15	11	0	8	13	7	1	6	0	80
3	11	10	7	0	2	1	16	0	5	0	52
Skupno	65	39	26	2	21	17	43	1	15	0	229

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

V okviru 49 standardnih projektov, sofinanciranih iz sredstev javnega razpisa št. 02/2009 (kot že navedeno nista vključena projekta MODEF in CAMAA, za katera je bilo sofinanciranje odobreno v drugi polovici leta 2012 in je bila Pogodba o dotaciji sofinanciranja podpisana v letu 2013), sofinanciranje prejme 508 PP: pri posameznem projektu poleg VP povprečno sodeluje približno 10 PP. Partnerstva obsegajo najmanj 3 in največ 16 subjektov (brez VP).

Najnižja vrednost sofinanciranja, t.j. 539,20 EUR, je bila dodeljena Javnemu podjetju Kraški vodovod Sežana, d.o.o., kot projektnemu partnerju v okviru projektov ISO-TO, ISO-PA, ISO-RE, ISO-PRA, ISO-PRE in ISO-GIO, najvišja vrednost sofinanciranja, v višini 738.580,06 EUR, pa občini »Comune di Tarvisio«, VP projekta IDAGO.

Število VP oz. glavnih upravičencev, ki prihajajo iz obeh držav je sledeče: 32 VP prihaja iz Republike Italije in 17 VP prihaja iz Republike Slovenije.

Za Italijo:

- 23 VP iz Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine;
- 8 VP iz Dežele Veneta;
- 1 VP iz Dežele Emilia Romagna.

Za Republiko Slovenijo:

- 9 VP iz Goriške statistične regije;
- 1 VP iz Gorenjske statistične regije;
- 3 VP iz Obalno-kraške statistične regije;
- 4 VP iz Osrednjeslovenske statistične regije.



Javni razpis št. 02/2009. Sofinancirani projekti in partnerstvo.

Prednostna naloga	Akronim projekta	Datum podpisa Pogodbe o dotaciji sofinanciranja	Območje izvora VP	Št. projektних partnerjev (VKLUČNO Z VP)
1	CroCTaL	19.12.2011	ITA	14
1	TIP	20.12.2011	ITA	10
1	SALTWORKS	23.05.2012	ITA	5
1	BioDiNet	24.05.2012	SLO	12
1	ISO-TO	18.06.2012	SLO	17
1	ISO-PRE	12.06.2012	ITA	17
1	GOTRAWAMA	15.05.2012	SLO	10
1	ISO-PRA	12.06.2012	ITA	17
1	ISO-GIO	12.06.2012	ITA	17
1	ISO-RE	12.06.2012	ITA	17
1	ISO-PA	12.06.2012	ITA	17
1	GEP	29.03.2012	SLO	10
1	ASTIS	27.06.2012	SLO	6
1	IDAGO	12.03.2012	ITA	4
1	ADRIAWET 2000	12.03.2012	ITA	4
1	EnergyViLLab	30.03.2012	ITA	16
1	FUTURELIGHTS	17.04.2012	SLO	7
1	HYDRO-KARST	18.07.2012	ITA	7
1	TESSI	03.09.2012	ITA	5
Prednostna naloga 1				212
2	PROFILI	12.07.2012	ITA	14
2	MACC	24.02.2012	ITA	10
2	MOTOR	16.05.2012	SLO	9
2	WINENET	16.07.2012	ITA	10
2	AGROTUR	08.03.2012	SLO	6
2	Heritaste	24.02.2012	ITA	10
2	STUDY CIRCLES	27.04.2012	ITA	11
2	TRANSARMON	24.05.2012	ITA	14
2	UE LI JE II	08.03.2012	SLO	12
2	LANATURA	13.04.2012	SLO	12
2	IPforSMEs	12.07.2012	ITA	12
2	GLIOMA	05.06.2012	SLO	5
2	SOLUM	12.04.2012	SLO	8
2	T-lab	21.05.2012	SLO	7
2	INNOVAQUA	05.06.2012	ITA	8
2	BELLIMPRESA	04.04.2012	ITA	6
Prednostna naloga 2				154
3	PESCA	16.04.2012	ITA	12
3	JULIUS	17.11.2011	ITA	12
3	EDUKA	15.03.2012	ITA	10
3	ALISTO	28.12.2011	ITA	8
3	IntegrAid	19.03.2012	SLO	8
3	Living Fountains	16.04.2012	SLO	12
3	LEX	28.03.2012	ITA	8
3	SIIT	29.06.2012	ITA	11
3	PANGeA	18.05.2012	SLO	10
3	SIGN	03.07.2012	SLO	8
3	e-surgerynet	23.05.2012	ITA	8
3	S.HO.W.	20.03.2012	ITA	10
3	SEA	28.05.2012	ITA	14
3	e-cardionet	31.08.2012	ITA	11
Prednostna naloga 3				142
Skupno št. projektnih partnerjev				508

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih



Spodnja tabela prikazuje območja, iz katerih prihajajo PP, ki sodelujejo v okviru sofinanciranih standardnih projektov:

- v okviru prednostne naloge 1 sodeluje 118 italijanskih PP in 93 slovenskih PP;
- v okviru prednostne naloge 2 sodeluje 89 italijanskih PP in 65 slovenskih PP;
- v okviru prednostne naloge 3 sodeluje 79 italijanskih PP in 63 slovenskih PP.

Iz italijanskih dežel torej skupno prihaja 286 PP, iz slovenskih statističnih regij pa 222 PP.

Javni razpis št. 02/2009. Sofinancirani projekti in partnerstvo. Območje izvora PP.

Prednostna naloga	ITALIJA			SLOVENIJA					Skupno
	Furlanija Julijska krajina	Veneto	Emilia Romagna	Goriška	Gorenjska	Obalno- kraška	Notranjsko kraška	Osrednje slovenska	
1	82	19	17	50	4	16	1	23	212
2	51	28	10	32	6	8	1	18	154
3	48	18	13	13	7	22	3	18	142
Skupno	181	65	40	95	17	46	5	59	508

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

Po zaključku postopka podpisovanja posameznih Pogodb o dotaciji sofinanciranja za 20 standardnih projektov v okviru javnega razpisa št. 03/2011, je bilo sofinanciranje dodeljeno skupno 156 projektnim partnerjem: pri vsakem projektu poleg VP povprečno sodeluje približno 8 PP. Partnerstva obsegajo najmanj 2 in največ 15 subjektov, vključno z VP.

Najnižja vrednost sofinanciranja, t.j. 5.000,00 EUR, je bila dodeljena Občini Šempeter pri Gorici, projektni partner v okviru projekta POT MIRU - VIA DI PACE, najvišja vrednost sofinanciranja, v višini 1.494.110,50 EUR, pa Mestni občini Koper, VP projekta TRADOMO.

Število VP oz. glavnih upravičencev, ki prihajajo iz obeh držav je sledeče: 11 VP prihaja iz Republike Italije in 9 VP prihaja iz Republike Slovenije.

Za Italijo:

- 11 VP iz Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine;

Za Republiko Slovenijo:

- 58 VP iz Goriške statistične regije;
- 2 VP iz Gorenjske statistične regije;
- 12 VP iz Obalno-kraške statistične regije;
- 5 VP iz Osrednjeslovenske statistične regije⁷.

⁷ Upravičeno območje javnega razpisa št. 03/2011, v skladu z določili 6. poglavja omenjenega javnega razpisa, za Republiko Slovenijo ne vključuje Osrednjeslovenske statistične regije, vendar 7. poglavje javnega razpisa določa, da



Javni razpis št. 03/2011. Sofinancirani projekti in partnerstvo.

Prednostna naloga	Akronim projekta	Datum podpisa Pogodbe o dotaciji sofinanciranja	Območje izvora VP	Št. projektних partnerjev (VKLJUČNO Z VP)
1	CAMIS	26.10.2012	SLO	11
1	TRADOMO	22.10.2012	SLO	7
1	BIMOBIS	26.10.2012	SLO	14
1	ENRI	18.10.2012	ITA	6
1	TRECORALA	19.10.2012	ITA	11
Prednostna naloga 1				49
2	NUVOLAK	22.10.2012	SLO	5
2	OGV	21.11.2012	ITA	12
2	VISO	07.11.2012	ITA	7
2	FARMEAT	28.11.2012	ITA	6
2	ENJOY TOUR	07.11.2012	SLO	11
2	RURAL	19.10.2012	ITA	2
2	SHARTEC	26.10.2012	SLO	7
2	PROTEO	21.12.2012	ITA	5
2	MINA	18.10.2012	ITA	4
Prednostna naloga 2				58
3	Agri-Knows	24.10.2012	SLO	7
3	ZBORZBIRK	22.10.2012	SLO	11
3	ECHOS	02.11.2012	ITA	4
3	POT MIRU-VIA DI PACE	19.10.2012	ITA	15
3	PRATICONS	19.10.2012	ITA	6
3	LIVING LANDSCAPE	24.10.2012	SLO	6
Prednostna naloga 3				49
Skupno št. projektnih partnerjev				156

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju

lahko ministrstva, javni subjekti, univerze, fakultete (za italijansko upravičeno območje določeno v tem javnem razpisu: oddelki fakultet) ter državne in deželne raziskovalne institucije, ki opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na upravičenem območju določenem v javnem razpisu, sodijo med vodilne ali projektne partnerje v primeru, da z izvedenimi aktivnostmi ustvarjajo takojšen učinek na upravičenem območju in je njihova vključenost potrebna za doseganje ciljev projekta.



Spodnja tabela prikazuje območja, iz katerih prihajajo PP, ki sodelujejo v okviru sofinanciranih standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju:

- v okviru prednostne naloge 1 sodeluje 24 italijanskih PP in 25 slovenskih PP;
- v okviru prednostne naloge 2 sodeluje 30 italijanskih PP in 28 slovenskih PP;
- v okviru prednostne naloge 3 sodeluje 25 italijanskih PP in 24 slovenskih PP.

Iz italijanskih dežel torej skupno prihaja 79 PP, iz slovenski statističnih regij pa 77 PP.

Javni razpis št. 03/2011. Sofinancirani projekti in partnerstvo. Območje izvora PP.

Prednostna naloga	ITALIJA	SLOVENIJA				Skupaj
	Furlanija Julijska krajina	Goriška	Gorenjska	Obalno-kraška	Osrednjeslovenska	
1	24	17	0	5	3	49
2	30	22	1	3	2	58
3	25	19	1	4	0	49
Skupaj	79	58	2	12	5	156

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju

Pri analizi upravičenih subjektov, ki sodelujejo pri izvajanju projektov, sofinanciranih v okviru javnih razpisov št. 01/2009, št. 02/2009 in št. 03/2011, smo upoštevali tudi morebitne spremembe partnerstva, našteje v tabeli v poglavju 2.1.1 tega poročila ter Letnega poročila o izvajanju za leto 2011. Tabela vsebuje podatke o postopku odločanja NO ter podatke o spremembah.



2.1.5 Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč

- Informacije o uporabi povrnjene ali ponovno uporabljene pomoči po preklicu pomoči iz 57. člena in 2. odstavka 98. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.

OU preverja in nadzoruje trajnost operacij, skladno z določili 57. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 ter izvaja finančne popravke, ki jih določa 98. člen omenjene Uredbe. Skladno z navedenim v poglavju 1.2. tega poročila, z naslovom »Delo struktur upravljanja Programa«, v delu, ki se nanaša na aktivnosti RO, je bila, v primerjavi z letom 2011 ugotovljena višja zanesljivost sistema upravljanja Programa za leto 2012.

V okviru revizije italijanske prvostopenjske kontrolne enote št. 2012/REGIO/J3/1002/1, ki jo je opravila Evropska komisija, in sicer v vzorcu 6-ih operacij, pri katerih so revizorji Komisije opravili kontrolo na kraju samem, ni bilo ugotovljenih neupravičenih izdatkov.

Revizija operacij je zajemala skupno vrednost izdatkov, nastalih v okviru treh vzorčno izbranih operacij, v višini 2.249.935,27 EUR (28,20% certificiranih izdatkov v letu 2011). V revizijskem obdobju 2011 so bili s strani OP na dan 31. decembra 2011 certificirani izdatki 18 operacij, v skupni vrednosti 7.978.367,90 EUR. Z naključnim vzorčenjem je bilo izbranih 10% certificiranih operacij oz. dve operaciji. Operacijama je bila dodana »high value« operacija št. 1083, ki ni bila izbrana v vzorec in predhodno ni bila predmet revizije. Omenjene tri vzorčno izbrane operacije vključujejo 25 podprojektov. V letu 2011 so bili certificirani izdatki 19 od omenjenih 25 operacij (4 s slovenskimi upravičenci in 15 z italijanskimi upravičenci, od tega 3 iz Dežele Emilia Romagna, 4 iz Dežele Veneto in 8 iz Dežele Furlanije Julijske krajine). OP je določil, da se v okviru 12. zahtevka za plačilo zniža znesek zahtevanih izdatkov za višino neupravičenih izdatkov za sledeče projekte:

PREDNOSTNA NALOGA	PROJEKT	UPRAVIČENEC	ZNESEK ODBITKA (v €)
1	SIGMA2	Univerza na Primorskem, Znanstveno - raziskovalno središče Koper	162.592,32
1	SIGMA2	Regione del Veneto - Direzione Produzioni alimentari	21,06
1	SIGMA2	Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (VeGAL)	694,69
3	OPENMUSEUMS	Provincia di Rovigo	3.572,52
4	TEHNIČNA POMOČ	Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)	500,00
Skupaj			167.380,59

Vir: pripravil STS

Vrednost zahtevkov za izplačilo je bila pred dejanskim izplačilom upravičencem znižana za navedene zneske. Dne 4. marca 2013 so bili podatki o omenjenih zneskih vneseni v informacijski sistem IGRUE, povezan s SFC, in sicer v del »Izterjave in korekcije«, v tabelo o preklicanih izplačilih.



V zvezi z neupravičenimi izdatki, nastalimi v okviru postopka javnega naročanja, ki ga je izvedla Univerza na Primorskem, Znanstveno - raziskovalno središče Koper v okviru projekta SIGMA 2, je prvostopenjska kontrolna enota, skladno z ugotovitvami RO, uvedla ustrezne finančne korekcije, tudi za predhodna in kasnejša poročila, nastala pred in po opravljeni reviziji, ter opravila 25% pavšalni finančni popravek na celotno vrednost javnega naročila. Obenem je prvostopenjska kontrolna enota izvedla poravnavo neupravičenih izdatkov, ugotovljenih s strani RO. Tudi za preostale projekte so predvidene poravnave neupravičenih izdatkov, ki jih je ugotovil RO, in sicer pri prvem naslednjem izplačilu.

V okviru projekta SIGMA 2 je bila po opravljeni reviziji Evropske komisije, s strani italijanske prvostopenjske kontrolne enote ugotovljena nepravilnost tudi pri PP Pokrajina Trst, in sicer v višini 250,00 EUR. Tudi za te izdatke je bila izvedena poravnava pri prvem naslednjem poročilu.

V referenčnem obdobju tega Letnega poročila je RO ugotovil nepravilnosti v okviru petih projektov, naštetih v zgornji tabeli, in s pomočjo Skupine revizorjev določil stopnjo napake v višini 0,27% ter izdal mnenje brez zadržkov.

V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi je OU, skladno z določili 98. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, dne 22. marca 2012 prišel 42. dopisno sejo NO za odobritev predloga o ponovni določitvi finančnih načrtov projektov, v okviru katerih so bile ugotovljene nepravilnosti. Datum zaključka dopisne seje je 8. april 2013. O odobritvi predloga bomo poročali v Letnem poročilu o izvajanju za leto 2013.



2.1.6 Kakovostna analiza

- Analiza dosežkov, izmerjenih s fizičnimi in finančnimi kazalniki, vključno s kakovostno analizo o doseženem napredku v zvezi s prvotno zastavljenimi cilji ter s posebnim poudarkom na prispevku operativnega programa k lizbonskemu procesu, vključno s prispevkom k doseganju ciljev iz 3. odstavka 9. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.

- Ustrezen prikaz, kjer je primerno, učinkov izvajanja operativnega programa na spodbujanje enakih možnosti med moškimi in ženskami ter opis partnerskih sporazumov.

Evropska komisija je leta 2010 sprejela novo Strategijo Evropa 2020 kot nadaljevanje Lizbonske strategije. Potrdila je glavne usmeritve predhodne strategije, s tem da so cilji, ki jih je potrebno doseči še bolj ambiciozno zastavljeni. Smernice, ki jih je določila Komisija v Strategiji Evropa 2020, so povzete v 10-ih točkah:

1. zagotoviti kakovost in trajnost javnega proračuna;
2. nadzor makroekonomskega neravnovesja;
3. zmanjšanje neravnovesja v evrskem območju;
4. promocija inovacij, raziskav in razvoja; okrepitev znanja in uporaba digitalnega poslovanja;
5. izboljšanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov;
6. izboljšanje pogojev za podjetja in potrošnike, modernizacija in razvoj industrijske baze zaradi zagotavljanja polnega delovanja notranjega trga;
7. povečanje vključenosti moških in žensk na trgu delovne sile, zmanjšanje strukturne brezposelnosti in promocija kakovosti zaposlitev;
8. razvoj kvalificirane delovne sile, ki bo zmožna odgovoriti na potrebe trga dela in promoviranje vseživljenjskega izobraževanja;
9. izboljšanje kakovosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh in povečanje vključenost v univerzitetno izobraževanje;
10. promocija socialne vključenosti in boja proti revščini.

Navedene točke so aktualne tudi v okviru izvajanja O.P., ki v pomembni meri prispeva k doseganju ciljev Lizbonske in prenovljene Strategije Evropa 2020.

Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006, z nadaljnimi spremembami in dopolnitvami, določa, da morajo sofinancirane aktivnosti prispevati k doseganju prednostnih ciljev Evropske unije, in sicer h krepitvi konkurenčnosti in ustvarjanju delovnih mest, vključno s cilji, določenimi v smernicah za rast in zaposlovanje v okviru Lizbonske agende. Prenovljena Lizbonska strategija (2005) je med drugim predvidevala »ad hoc« program ukrepov (Lizbonski akcijski načrt - Lisbon Action Plan), temelječ na treh prednostnih nalogah:

- 1) ustvarjanje Evrope, ki bo privlačnejša za investicije in delo;



- 2) znanje in inovacije za gospodarsko rast;
- 3) ustvarjanje novih in boljših delovnih mest.

Skladno z navedenim (prenovljena Lizbonska Strategija in izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006) naj bi tudi programi Evropskega teritorialnega sodelovanja igrali pomembno vlogo pri izvajanju Lizbonske strategije, zlasti pri povečanju konkurenčnosti čezmejnih območij ter krepitvi gospodarske in socialne vključenosti teh območij. O.P. čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013 omenjenim ciljem sledi preko svojih prednostnih nalog, v okviru katerih se izvajajo sofinancirani projekti.

Z metodološkega vidika, je pomen prispevka Programa k doseganju ciljev prenovljene Lizbonske strategije in prenovljene strategije Evropa 2020 razviden iz analiz glavnih programskih dokumentov (Operativni program, Okoljsko poročilo, Komunikacijski načrt) ter priročnikov in obrazcev, pripravljenih v okviru Programa, iz logičnih povezav med prednostnimi nalogami Programa, cilji Lizbonske strategije in vsebino nove strategije Evropa 2020, kakor tudi iz vsebin sofinanciranih projektov in vmesnih poročil o izvajanju projektov, ki jih posredujejo Vodilni partnerji in ki vsebujejo pregled napredka izvajanja projektnih aktivnosti (in s tem tudi napredka pri doseganju omenjenih ciljev).

Projekti, ki se sofinancirajo iz ESRR v okviru O.P. v letu 2012 so različne narave in heterogeni v smislu čezmejnega partnerstva, finančnih in časovnih okvirov ter predvidenih aktivnosti, kar omogoča dejansko transverzalno delovanje glede na cilje Lizbonske strategije in na zgoraj navedene cilje nove strategije Evropa 2020.

V zvezi s prispevkom O.P. k doseganju ključnih ciljev evropske politike, vseh 20 podpisanih Pogodb o dotaciji sofinanciranja standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju - v okviru razpisa št. 03/2011, tako kot prejšnjih 16 podpisanih pogodb v okviru razpisa št. 01/2009 in 49 podpisanih pogodb v okviru razpisa št. 02/2009, vsebuje določila o spoštovanju načel, navedenih v 3. odstavku 9. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, še posebej glede trajnostnega razvoja in enakih možnosti in nediskriminacije (spoštovanje omenjenih načel je bilo tudi v fazi ocenjevanja visoko točkovano).

Kar se tiče splošnih kazalnikov, se le-ti nanašajo na vseh 85 sofinanciranih projektov. Podatki na dan 31.12.2012 kažejo v večini primerov vrednosti, ki presegajo ciljne vrednosti, predvidene za Program.

Zlasti kar zadeva kazalnik »Spodbujanje trajnostnega razvoja« velja opozoriti, da 84 od 85 (99%) sofinanciranih projektov prispeva k doseganju zahtev, določenih za omenjeni kazalnik. Navedeni odstotek presega ciljno vrednost (45%), ki je določena v O.P.

V zvezi s kazalnikom »Projekti, ki spodbujajo in izboljšujejo skupno varstvo in upravljanje okolja« velja izpostaviti, da 70 od 85 (82%) sofinanciranih projektov prispeva k doseganju ciljev, ki jih določa omenjeni kazalnik. Navedeni odstotek presega ciljno vrednost (15%), ki je določena v O.P.

Kazalnik »Spodbujanje enakih pogojev (za moške in ženske ter nediskriminacije)«, katerega ciljna vrednost na ravni Programa znaša 10% glede na celotno število projektov, trenutno izkazuje vrednost 91% (77 od 85 projektov), kar pomeni pozitivno razliko v višini 81%.

Ob upoštevanju prednostnih nalog O.P., meril za izbor projektov in vsebin sofinanciranih projektov lahko trdimo, da bo izvedba predvidenih projektih aktivnosti pozitivno vplivala na doseganje navedenih ciljev.

Predhodno vrednotenje programa, ki je bilo dodeljeno zunanjim izvajalcem konec leta 2012 na osnovi javnega razpisa, je namenjeno izboljšanju kakovosti načrtovanja in izvajanja bodočega O.P. Slovenija-Italija 2014-2020 ter vrednotenju uspešnosti, učinkovitosti in vpliva Programa. Obenem je predvideno tudi vrednotenje vpliva Programa v skladu s poslanstvom zadevnih Skladov SSO (SWD[2012] 61 final), in sicer v zvezi z izvajanjem ciljev strategije Evropa 2020, v zvezi z bruto domačim proizvodom (BDP) ter stopnjo brezposelnosti, kjer je to smiselno. Predhodno vrednotenje bo torej tudi v prihodnje zagotovilo dodatne in ustrezne elemente analize glede izvajanja O.P. in njegove skladnosti s cilji Lizbonske strategije, prenovljene in razširjene v strategiji Evropa 2020.

V nadaljevanju so predstavljeni primeri projektov po prednostnih nalogah, katerih vsebine in izvajanje pomembno prispevajo k doseganju ciljev prenovljene Lizbonske strategije in prenovljene strategije Evropa 2020 na čezmejnem območju.

Večina odobrenih projektov v okviru prednostne naloge 1 se osredotoča na dva operativna cilja: "Varovati biotsko raznovrstnost in zagotoviti trajnostno izkoriščanje naravnih virov" in "Zaščititi okolje pred naravnim in tehnološkim tveganjem ter pred onesnaževanjem, zmanjšati porabo energije in povečati uporabo obnovljivih virov energije".

V zvezi z izboljšavo energetske učinkovitosti na upravičenem območju programa, velja izpostaviti standardi projekt EnergyViLLab, sofinanciran v okviru javnega razpisa št. 02/2009, ki predvideva ustanovitev mreže živih laboratorijev (Living Lab - LL), imenovano EnergyViLLab (Energy Virtuous Living Lab - energetske virtuozi živih laboratorijev, ki bo omogočala preizkušanje inovativnih aplikacij in rešitev, osredotočenih na uporabo energije iz obnovljivih virov, na varčevanje z energijo in na oblike trajne mobilnosti (RRM - RES:Renewable Energy Sources - obnovljivi viri energije, RUE: Rationale Use of Energy - učinkovita raba energije, MOB: Sustainable Mobility System - trajnostni sistem mobilnosti) z vključitvijo MSP, proizvodnih okrajev, univerz, centrov inovativnosti, občin in občanov. Projektne aktivnosti se izvajajo v deželah Veneto, Furlanija-Juljska krajina, Emilia Romagna ter v Obalno-kraški, Goriški in Osrednjeslovenski statistični regiji.

Evropska unija si je zastavila cilj, da povsem odpravi odpadke in zapre odlagališča do leta 2020. Ravnanje z odpadki je le delno zajeto v projektu TESSI, ki predvideva pripravo poljudnega gradiva o vprašanjih energetike, odpadkov in vodnih virov, namenjenega mladim in deloma tudi lokalnim oblastem.

Naslov prednostne naloge 2 "Konkurenčnost in na znanju temelječa družba" se neposredno navezuje na Lizbonsko strategijo in na določene cilje strategije Evropa 2020. V sklopu ciljev Strategije Evropa 2020 se je Slovenija zavezala, da bo do leta 2020 namenila 3 % BDP za naložbe v raziskave in razvoj, Italija pa 1,57 %. V številnih sofinanciranih projektih sodelujejo podjetja, zbornice, občinske in regionalne oblasti, razvojne agencije, inovacijski centri, tehnološki parki, raziskovalni inštituti in znanstveni parki ter fakultete. Odobreni projekti s področja konkurenčnosti MSP se namreč v svojih aktivnostih v veliki meri navezujejo na operativni cilj »Spodbujati raziskave in razvoj ter na znanju temelječe gospodarstvo«.



Aktivnosti, ki jih v okviru strateškega projekta CITIUS (projekt se sofinancira v okviru javnega razpisa št. 01/2009) izvaja šest projektnih partnerjev, so usmerjene v vzpostavitev čezmejnega clusterja za realizacijo visoko inovativnih svetlobnih virov za neprofitno uporabo pri raziskavah in razvoju na različnih področjih, pomembnih z vidika znanosti in tehnologije. Vzpostavitev visoko specializiranega laboratorija in redna izmenjava znanj med raziskovalci na čezmejnem območju spodbuja inovacije in razvoj na programskem območju ter ima pozitivne učinke na evropski ravni.

Prednostna naloga 3 "Socialna integracija" zajema več operativnih ciljev, na katere se nanašajo sofinancirani projekti. V zvezi s ciljem strategije Evropa 2020, in sicer zmanjšati delež mladih, ki opustijo šolanje za vsaj 5 % v Sloveniji in za vsaj 15-16 % v Italiji, na dan priprave tega poročila še ni možno oceniti neposreden vpliv programa, vendar velja izpostaviti projekt EDUKA (standardni projekt, sofinanciran v okviru javnega razpisa št. 02/2009), ki prispeva k izboljšanju kvalitete izobraževalnega sistema na različnih ravneh (od osnovnošolske do univerzitetne ravni) ter prispeva k izobraževanju in izpopolnjevanju človeškega kapitala na programskem območju. Cilj projekta je ustvariti znanje in orodja (didaktično in informativno gradivo, priročnike, publikacije, igre itd.) za vzgajanje k različnosti in medkulturnosti v šolskem in univerzitetnem okolju ter jih posredovati predvsem mladim in pedagoškemu kadru na vseh stopnjah izobraževanja. V ta namen delujejo mreže čezmejnega sodelovanja med šolami na vseh ravneh, med raziskovalnimi ustanovami in univerzami, med javnimi upravami in ustanovami, ki delujejo na področju medkulturne vzgoje, ter med organizacijami znotraj tradicionalnih in novih etničnih manjšin. Te bodo izvajale izobraževalne, informativne, promocijske in raziskovalne aktivnosti. Posebna pozornost bo namenjena uveljavljanju medkulturne vzgoje ob upoštevanju bodisi tradicionalnih manjšin (še posebej italijanske v Sloveniji ter slovenske in furlanske v Italiji) bodisi novih manjšin oziroma skupin migrantov.

V zvezi z doseganjem ciljev, povezanih z Lizbonsko strategijo in zgoraj navedenih ciljev nove strategije Evropa 2020, je potrebno poudariti in izpostaviti, da je zaznati vpliv finančne in svetovne krize na posamezne upravičence (bodisi zasebne ali javne ustanove), posebno v smislu nizke likvidnosti ali omejene možnosti vlaganja javnih proračunskih sredstev, kar pomembno zmanjšuje kupno moč potrošnikov. Italijanski upravičenci pogosto obveščajo STS in OU o težavah, ki jih prinašajo omejitve, določene v »paktu o stabilnosti«. Opisana situacija bi lahko povzročila dodatno upočasnitev izplačevanja in torej tveganje za dodatne zamude pri črpanju sredstev oziroma težave pri zagotavljanju kakovosti in trajnosti javnih sredstev. Vpliv gospodarske krize je neposredno povezan s ciljem ustvarjanja večjega števila in boljših delovnih mest: iz sprememb, za katere so zaprosili vodilni partnerji izhaja, da ostaja ohranjanje stopnje zaposlenosti prednostni cilj, ki ga narekujejo gospodarske razmere.



2.2 Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti

- Kakršnekoli večje težave v zvezi s skladnostjo z zakonodajo Skupnosti, ki so nastopile pri izvajanju operativnega programa in ukrepi sprejeti za odpravo teh težav.

Zahteva po spoštovanju zakonodaje EU je v okviru Programa izrecno navedena v vseh objavljenih javnih razpisih v delu, ki se nanaša na pravno podlago. Enako velja za priročnike za predlagatelje in upravičence, še posebno pa za Navodila za pripravo in predložitev projektnih predlogov ter Priročnik o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju.

Zaradi zagotavljanja skladnosti z veljavnimi predpisi na področju konkurence in državnih pomoči, javnih naročil, prihodkov, trajnosti operacij, okolja in enakih možnosti, je OU s pomočjo STS v letu 2012 sprejel ukrepe na različnih ravneh izvajanja Programa. V prvi vrsti je bilo vsem subjektom, vključenim v izvajanje in nadzor operacij, omogočeno čim širše seznanjanje z informacijami in smernicami, bodisi preko navedenih programskih dokumentov, bodisi preko uradne spletne strani www.ita-slo.eu (dela »Dokumentacija Evropske unije« in »Drugi dokumenti«). Posebna pozornost je bila namenjena pogosto zastavljenim vprašanjem o temah, kot so javna naročila, upravljanje prihodkov, itd., ki so predmet stalnih zakonodajnih sprememb na ravni zakonodaje Skupnosti in nacionalne zakonodaje.

Program se izvaja v skladu z načeli Skupnosti, ki so namenjena zagotavljanju dobrega delovanja notranjega trga. Vsi programski dokumenti in priročniki/obrazci, ki jih za upravičence - tako za VP kot za PP - pripravlja STS, so usklajeni z nacionalnimi zakonodajami. Ob tem se upošteva in zagotavlja tudi izvajanje predpisov Evropske unije s področja državnih pomoči, javnega naročanja in notranjega trga.

Glede upoštevanja zakonodaje Skupnosti in nacionalne zakonodaje s področja javnega naročanja, organi, odgovorni za pravilno izvajanje Programa spodbujajo spoštovanje omenjene zakonodaje in nad tem izvajajo nadzor. Pripravljeni dokumenti vsebujejo navodila, ki temeljijo na spoštovanju zakonodaje Skupnosti. Na primer v »Priročniku o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju«, ki je priloga k javnemu razpisu št. 1/2009, k javnemu razpisu št. 2/2009 in k javnemu razpisu št. 3/2011 ter v »Navodilih in obrazcih za poročanje za upravičence« je navedeno, da morajo upravičenci v okviru izvajanja projekta spoštovati določila posameznega javnega razpisa in veljavno nacionalno zakonodajo ter zakonodajo Skupnosti s področja javnega naročanja. Priročnik izrecno navaja tudi direktivi 2004/17/ES in 2004/18/ES, pravila za izvajanje direktiv (npr. Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v zvezi z oddajo javnih naročil, v skladu z direktivama Evropskega parlamenta in Sveta št. 2004/17/ES in 2004/18/ES); razlage (razlagalno sporočilo Komisije 2006/C 179/02 o zakonodaji Skupnosti, ki velja za oddajo javnih naročil, ki niso zajeta ali so samo delno zajeta v direktivah o javnih naročilih, in razlagalno sporočilo Komisije 2008/C 91/02 o uporabi zakonodaje Skupnosti v zvezi z javnimi naročili in koncesijami za institucionalizirana javno-zasebna partnerstva) ter specifične nacionalne predpise.

V letu 2012 je bila okrepljena podpora upravičencem na področju postopkov javnega naročanja, upoštevajoč ugotovitve revizije (ki je potekala med 12. in 16. marcem 2012 in so jo opravili revizorji DG Regio) operacij, ki so bile vključene v vzorec za leto 2011. Ugotovljeni so bili neupravičeni izdatki zaradi neupoštevanja določil s področja javnega naročanja storitev in blaga, ki so bili povrnjeni skladno z Uredbo Sveta (ES) št. 1083/2006, čl. 61 - črka f, (strateška projekta



Slowtourism in Icon, poglavje 2.1.5 Letnega poročila 2011). Posledično je bil zahtevek za plačilo znižan za višino ugotovljenih neupravičenih izdatkov.

Sistem upravljanja in nadzora, potrjen 19.11.2009, je bil med izvajanjem Programa posodobljen. Evropska komisija je z dopisom št. Ares(2012)226234 z dne 28.02.2012 obvestila RO o sprejetju mnenja brez zadržkov, ki ga je le-ta izdal in je obenem zaprosila za oblikovanje korektivnih ukrepov, zaradi preprečevanja ponavljanja napak na področju javnih naročil in preverjanja morebitnih nepravilnosti pri certificiranih izdatkih v letu 2010 ter posledične uvedbe morebitnih finančnih popravkov.

Obenem se je OU dne 28.09.2012 odzval na zahtevo Evropske komisije iz avgusta 2012 v zvezi s korektivnimi ukrepi sistema upravljanja in nadzora ter pojasnil, da je v predhodno določenem roku oblikoval zahtevane korektivne ukrepe in izvedel 14 dodatnih kontrol na kraju samem. Kontrole so bile izvedene pri projektih, ki so visok delež izdatkov namenili javnim naročilom, pri tem pa ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Rezultati dodatnega preverjanja izdatkov, ki so bili certificirani v letu 2010 in predhodno niso bili zajeti v vzorec, so bili dne 21.09.2012 posredovani tudi RO. NO, upravičenci in v kolikor je bilo potrebno tudi tretje osebe, so bile o omenjenih postopkih ustrezno obveščeni.

OU s pomočjo STS in v sodelovanju s slovensko Info točko, OP in RO zagotavlja upravičencem vse potrebne informacije za zagotavljanje spoštovanja predpisov EU. S tem namenom so bili v letu 2012 sprejeti in vključeni v priročnike korektivni ukrepi za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo Evropske unije. Omenjeni dokumenti so objavljeni na uradni spletni strani Programa in so bili predstavljeni na različnih delavnicah, ki so potekale v letu 2012.

V novembru in decembru 2012 je bilo za upravičence Programa organizirano usposabljanje s področja javnih naročil del in/ali storitev, ki ne presegajo mejne vrednosti EU in nabave blaga ter storitev v skladu s postopkom, ki ga določa 125. člen italijanskega zakona o javnem naročanju. V okviru sklopa »Javna naročila del in storitev pod mejno vrednostjo EU in vodenje postopkov oddaje naročil« so bile obravnavane naslednje teme: veljavna italijanska zakonodaja - predvsem Odlok predsednika Republike 207/10 - Uredba o javnih naročilih ter analiza njenih smernic, kritičnih točk in novosti; nova pravila za poenostavitev naročil pod mejno vrednostjo EU; elektronsko vodenje postopkov javnega naročanja; kriteriji izbire ponudnika in neobičajno nizke ponudbe. V sklopu »Javno naročanje del in storitev v skladu s 125. členom italijanskega zakona o javnem naročanju« je bilo obravnavano načrtovanje nabave blaga in storitev, zakonska pravila za oddajo naročil v skladu s 125. členom italijanskega zakona o javnem naročanju, oddaja naročil za storitve svetovanja, obvezna in neobvezna objava, podaljšanje pogodbe o naročilu in sklenitev aneksov k pogodbi.

Po sprejetju navodil RO glede ukrepov za preprečevanje nepravilnosti na področju javnih naročil je OU z okrožnico z dne 11. junija 2012 obvestil upravičence o dveh novih kontrolnih listih za kontrolo pravilnosti izvedbe postopka oddaje javnega naročila (za italijanske in slovenske upravičence). V omenjeni okrožnici je OU opozoril na evropsko zakonodajo za področje javnega naročanja oz. na obvestila Komisije, ki se nanašajo na javna naročila, ki jih ne oz. jih deloma urejata »Direktiva o javnih naročilih 2006/C 179/02« in direktiva, ki se nanaša na evropsko zakonodajo za javna naročila in koncesije javno/zasebnim institucionaliziranim partnerstvom 2008/C 91/02. Obenem velja izpostaviti smernice Evropske komisije z dne 22.11.2011 o 125. členu Zakonodajnega odloka 163/2006 za italijanske upravičence in usmeritve COCOF

07/0037/03 glede načel, kriterijev in odstotkov, ki jih uporabljajo službe Komisije za popravke in pavšalne korekcije v primeru, da načelo javnosti ni upoštevano.

Navedene kontrolne liste upravičenci priložijo k poročilom, ki jih posredujejo pristojni prvostopenjski kontrolni enoti. Posledično je bil z dvema novima kontrolnima listoma (splošen kontrolni list za oddajo javnih naročil in kontrolni list za preverjanje postopkov javnega naročanja), ki se nanašata na naročila pod in nad mejno vrednostjo EU, dopolnjen tudi Priročnik za izvajanje prvostopenjske kontrole, ki ga je italijanska prvostopenjska kontrola odobrila s sklepom namestnika generalnega direktorja Direkcije za mednarodne odnose in odnose z EU št. 534 z dne 30.09.2010. Dopolnjen priročnik je vodja prvostopenjske kontrolne enote sprejel s sklepom št. 2146/UO/DIR/CPL z dne 13. avgusta 2012.

Tudi Priročnik o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju je bil dopolnjen s podrobnejšimi opisi načinov vodenja izdatkov za delo zaposlenih in zunanjih svetovalcev ter postopkov javnega naročanja blaga in storitev (naročila nad in pod mejno vrednostjo EU).

Glede načela trajnosti operacij, ki ga določata 57. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, spremenjen s 1. členom Uredbe (ES) št. 539/2010 Evropskega parlamenta in Sveta, je OU skladno s priporočili, ki jih je Evropska komisija podala po opravljeni reviziji Programa (12-16. marec 2012), v svoji okrožnici z dne 14. avgusta 2012 pozval upravičence k upoštevanju roka za izpolnitev predvidenih obveznosti.

Uradni vzorci Pogodbe o partnerstvu - ki jo VP sklene s PP - in Pogodbe o dotaciji sofinanciranja - ki jo podpišeta OU in VP - vsebujejo določila, ki se sklicujejo na spoštovanje zakonodaje Skupnosti, na primer 1. člen »Pravna podlaga«, 3. člen »Znesek sofinanciranja«, ki ureja skladnost s pravili o državnih pomočeh, 11. člen »Vračilo neupravičeno izplačanih izdatkov« in 14. člen »Pravica do odstopa od pogodbe«, ki med vzroki za odstop od pogodbe navaja kršitev evropske, nacionalne in deželne zakonodaje vezane na konkurenco, varovanje okolja in enake možnosti.

Tako imenovana »horizontalna načela« enakih možnosti med spoloma in nediskriminacije so skupna vsem prednostnim nalogam in aktivnostim v okviru Programa. Na omenjena načela se sklicujejo razni dokumenti pripravljeni v okviru Programa. V okviru prednostne naloge 3 »Socialna integracija« so med upravičenimi projekti tudi projekti, ki podpirajo aktivnosti usmerjene v promocijo socialne kohezije in v integracijo »prikrajšanih skupin«. Načelo enakih možnosti in nediskriminacije se torej v okviru teh aktivnosti izvaja kot specifični ukrep.

Izvajanje načel enakih možnosti in nediskriminacije ter zakonodaja Skupnosti s področja okolja in okoljske trajnosti sta še posebej pomembna. V obrazcu za predložitev projektnih predlogov je poseben del namenjen vplivom in učinkom projekta na omenjena načela, ki so vključena tudi v merila za ocenjevanje kakovosti projekta (del B.3 »Dodana vrednost projekta« - merilo 1 »Prispevek projekta k enakim možnostim in nediskriminaciji« in merilo 2 »Prispevek projekta k okoljski trajnosti«).

Predstavniki okoljskih organov programskih partnerjev sodelujejo tudi pri ocenjevanju vpliva na okoljske cilje, v skladu z določili O.P.

Ob tem velja poudariti, da v skladu s poslovníkom, v okviru NO sodelujeta tudi dva predstavnika okoljskih oblasti, italijanski (ki se izmenično izbira med italijanskimi deželami) in slovenski



(Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) ter izmenično po en predstavnik Deželne komisije za enake možnosti dežel Furlanije Julijske krajine, Veneta in Emilije Romagne in en predstavnik Urada Vlade Republike Slovenije za enake možnosti.

V zvezi s posameznimi projekti in skladnosti z zakonodajo Skupnosti je v nadaljevanju podan povzetek stanja sofinanciranih projektov po posameznih javnih razpisih.

V zvezi s pravili o državnih pomočeh je bilo ugotovljeno, da šest (ADRIA-A, CITIUS, KNOW-US, Safeport, SLOWTOURISM in ICON) od 16 projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 1/2009, zapade pod pravila o državnih pomočeh. Pri prvih štirih zapade pod pravila o državnih pomočeh sofinanciranje aktivnosti, ki jih izvajajo nekateri slovenski PP, medtem ko pri projektu SLOWTOURISM in pri projektu ICON zapadejo pod pravila o državnih pomočeh (neposredna državna pomoč) tudi nekatere aktivnosti, ki jih izvajajo italijanski PP. Pri projektih KNOW-US in ICON je bila ugotovljena tudi posredna državna pomoč v korist tretjih subjektov, vključenih v projektne aktivnosti, in sicer italijanskega partnerja v primeru projekta KNOW-US ter italijanskih in slovenskih partnerjev v primeru projekta ICON. V vseh navedenih primerih pa so sredstva dodeljena na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« v okviru največjih dovoljenih zneskov. Za projekt SAFEPORT je sofinanciranje izdatkov za nakup opreme dodeljeno v okviru regionalne sheme pomoči glede na velikost upravičenca (BE01-1783262-2007).

Za 11 od 51 projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 02/2009, je bilo ugotovljeno, da določene projektne aktivnosti zapadejo pod pravila o državnih pomočeh. Tabela v nadaljevanju vsebuje podatke o projektih in projektnih partnerjih, katerim je bilo sofinanciranje dodeljeno v skladu s pravili o državnih pomočeh.

Javni razpis št. 02/2009. Projekti in projektni partnerji, ki zapadejo pod pravila o državnih pomočeh.

Akronim projekta	Projektni partner
FUTURELIGHTS	PP2-Društvo temno nebo
UE LI JE II	PP4-Labs d.o.o.
MOTOR	PP3-Ustanova fundacija BiT Planota
AGROTUR*	PP4-Združenje Konzorcij kraških pridelovalcev terana
Heritaste	PP7-Glasbena agencija Jota
INNOVAQUA	PP7-Vodomec d.o.o.
LANATURA	PP4-Invalidsko podjetje Posočje d.o.o.
LANATURA	PP6-Zveza društev rejcev drobnice Slovenije
WINE NET	PP10-Vinakras Sežana z.o.o.
WINE NET	PP11-Vinska klet Goriška Brda z.o.o.
LEX	PP6-Inštitut za upravno pravo
ALISTO	PP7-Ustanova »Fundacija poti miru v Posočju«

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

*V primeru projekta AGROTUR projektne aktivnosti PP4 ne zapadejo pod pravila o državnih pomočeh, v kolikor bo le-ta upošteval postopke javnega naročanja, določene v Navodilih za poročanje za upravičence.

V vseh navedenih primerih so bila sredstva dodeljena na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« do najvišjega dovoljenega zneska.

V postopku ocenjevanja projektov je bilo glede relevantnosti za državne pomoči ugotovljeno, da sofinanciranje določenih aktivnosti v okviru projektov PROFILI, MACC in WINE NET lahko predstavlja posredno državno pomoč tretjim osebam, ki niso neposredni upravičenci programskih sredstev. Izvajanje aktivnosti v okviru omenjenih projektov trenutno preverja in nadzoruje STS.

V okviru javnega razpisa št. 03/2011, je bilo v postopku ocenjevanja projektov glede relevantnosti za državne pomoči, ki so ga izvedli slovenski in italijanski ocenjevalci, ugotovljeno da projekti oz. aktivnosti, ki jih izvajajo projektni partnerji naštetih v spodnji tabeli zapadejo pod pravila o državnih pomočeh.

Javni razpis št. 03/2011. Projekti in projektni partnerji, ki zapadejo pod pravila o državnih pomočeh.

Akronim projekta	Projektni partner
NUOVOLAK	PP1 - Plan e, d.o.o. PP2 - UIP - Primorske, d.o.o.
OGV	PP9 - Vinska klet Goriška Brda
VISO	PP6 - Konzorcij Brda
SHARETEC	PP3 - Hidria Rotomatika d.o.o.
FARmEAT*	PP3 - Kmetijska Zadruga Tolmin PP3 - Kmetijska Zadruga Tolmin PP1- Kmečka Zveza PP5 - Latteria sociale di Cividale


Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju

*V primeru projekta FARmEAT aktivnosti, ki jih izvaja PP3, zapadejo pod pravila o državnih pomočeh, in sicer se sofinanciranje dodeli po pravilu »de minimis« ter po regionalni shemi državnih pomoči.

V zvezi s spremljanjem državnih pomoči v okviru Programa velja izpostaviti, da so bila junija 2012 izdana in objavljena »Navodila za spremljanje posrednih državnih pomoči« (verzija št. 01/2012) za italijanske upravičence; za slovenske upravičence veljajo navodila Ministrstva za finance Republike Slovenije.

V letu 2012 je Evropska komisija posredovala priporočila, v skladu z ugotovitvami opravljene revizije. STS je na osnovi priporočil pripravil in objavil »Smernice za upravljanje projektov, ki ustvarjajo prihodek«. Ob tem sta bila objavljena tudi dva pomembna dokumenta Evropske komisije: »Metodološke smernice za izdelavo analize stroškov in koristi« in »Priročnik za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov«. Tudi vmesna/zaključna poročila upravičenca in vodilnega partnerja so bila dopolnjena s kontrolnim listom za preverjanje morebitnih prihodkov v okviru projekta. Na uradni spletni strani Programa pa so bili objavljeni tudi odgovori na tri najbolj pogosto zastavljena vprašanja v zvezi s to problematiko. V »Navodila in obrazce za poročanje za upravičence Programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013 za strateške projekte - Javni razpis št. 01/2009« (verzija št. 4/2013) s pripadajočimi prilogi

(veljavna od 25. februarja 2013 dalje) so bila vključena navodila za izpolnjevanje kontrolnega lista v formatu Excel. V »Navodila in obrazce za poročanje za upravičence Programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013 za standardne projekte - Javni razpis št. 02/2009 in Javni razpis št. 03/2011« (verzija št. 1/2013) s prilogami (veljavna od 25. februarja 2013 dalje) pa so bila vključena navodila za izpolnjevanje kontrolnih listov v elektronskem formatu, v okviru sistema za elektronsko poročanje GOLD MIS. V okviru Programa je tako omogočeno celovito in natančno spremljanje projektov, ki ustvarjajo prihodek, skozi celotno življenjsko dobo projektov.

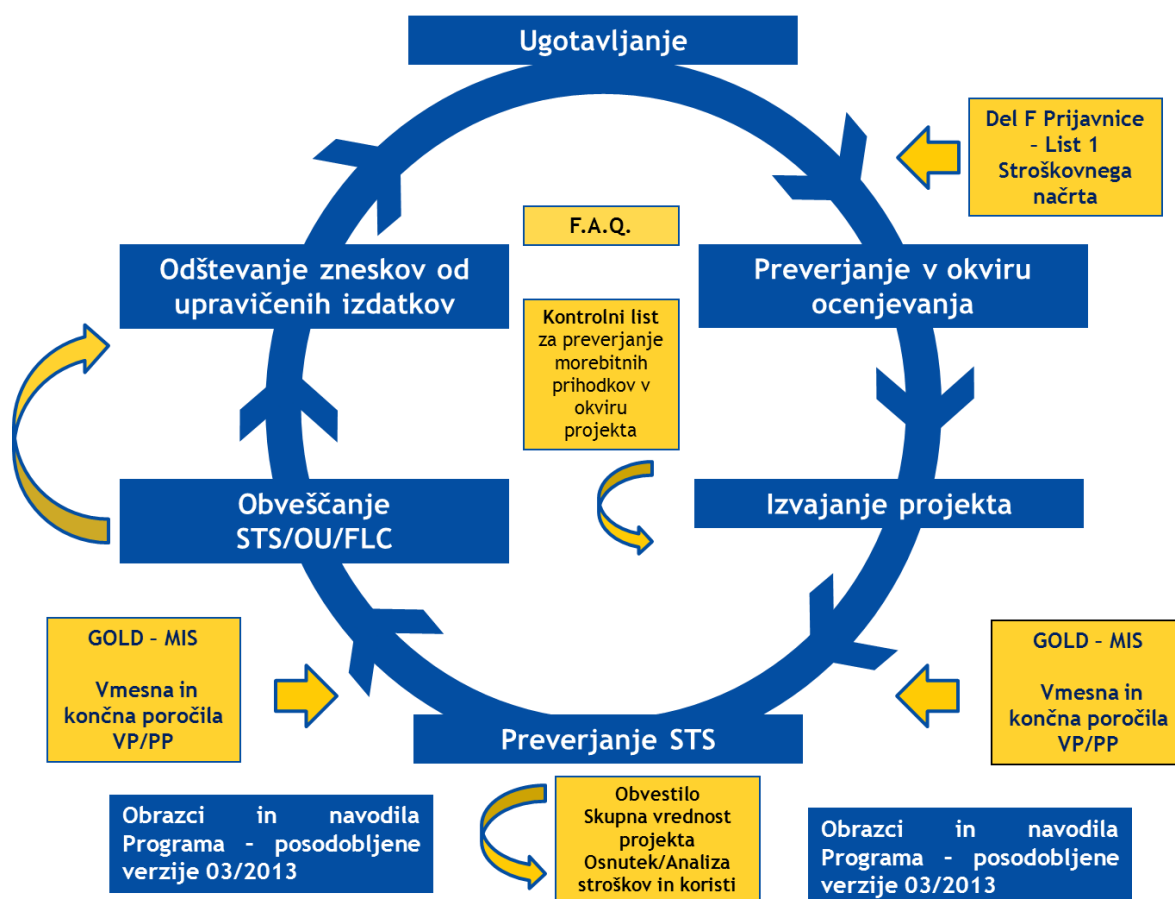

V letu 2012 ni bilo večjih težav pri izvajanju in upoštevanju evropske zakonodaje, tako na ravni Programa, kot na ravni posameznih projektov. Kljub temu je potrebno opozoriti na težavo, povezano z gospodarsko-finančno krizo in evropskimi smernicami za nadzor javne porabe. V Sloveniji na tem področju velja nacionalni »Zakon za uravnoteženje javnih financ - ZUJF«. V Italiji je potrebno upoštevati določila »Pakta o notranji stabilnosti«, ki je zavezujoč na evropski ravni in določa nujnost konvergence med gospodarskimi strategijami držav članic, in sicer zaradi doseganja določenih parametrov, ki naj bi zagotovili večjo prilagodljivost pri opredelitvi evropskih gospodarskih politik. V tem kontekstu je glavni parameter, ki ga je potrebno kontrolirati, neto dolg lokalnih ustanov (razlika med končnimi prihodki in odhodki, brez finančnih operacij).

Upoštevanje »Pakta o notranji stabilnosti« posledično pomeni splošno krčenje porabe organov lokalne javne uprave, med katerimi je veliko upravičencev Programa. Znatno krčenje porabe se je nadaljevalo tudi v letu 2012, predvsem zaradi vpliva svetovne ekonomsko-finančne krize na gospodarstvo, kar je povzročilo zamude tako pri izvajanju projektnih aktivnosti, kakor na ravni celotnega Programa. Obenem to predstavlja resno tveganje za doseganje ciljne porabe in s tem

preprečitev samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti, kot ga določa 93. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, v letu 2013.



2.3 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

- Kakršne koli večje težave, ki so nastopile pri izvajanju operativnega programa, vključno s povzetkom resnih težav skladno s postopkom iz člena 62(1)(d)(i) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, kjer je primerno, in ukrepi, ki jih je sprejel organ upravljanja ali nadzorni odbor, da težave odpravi.

V času priprave tega letnega poročila je v obravnavi na Deželnem upravnem sodišču Furlanije Julijske krajine (v nadaljevanju DUS FJK) ena pritožba, ki se nanaša na projekt, predložen v okviru javnega razpisa za strateške projekte št. 01/2009.

V nadaljevanju je podan pregled stanja v povezavi z omenjenim pritožbenim postopkom pri DUS FJK, ki se še ni zaključil. Opis celotnega postopka vsebujeta letni poročili 2010 in 2011.

Občina Salzano (Venezia) je kot VP projektnega predloga z akronimom »CULTUREMUS«, predloženega v okviru javnega razpisa za strateške projekte št. 01/2009, vložila izredno pritožbo pri predsedniku Republike Italije. Pritožba je bila vročena odvetniški pisarni Dežele Furlanije Julijske krajine 16. junija 2010. Zaradi nasprotovanja pritožbi in postopka, ki ga je vložila Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina, je bil 4. oktobra 2010 pritožbeni postopek prenesen v pristojnost DUS FJK s strani občine pritožnice. Predmet pritožbe je neupravičenost omenjenega projektnega predloga zaradi ugotovljenih zadržkov, ki jih ni mogoče odpraviti (pomanjkanje dokumentacije v tiskani obliki). Tako odločitev je sprejel NO v okviru dopisne seje št. 13/2010. V času priprave tega letnega poročila datum obravnave na DUS FJK še ni določen.

V zvezi s standardnimi projekti sta prijavitelja projektov MODEF in CAMAA (»Unindustria Rovigo«, kot VP projekta MODEF in »Direzione Lavori pubblici della Regione del Veneto«, kot VP projekta CAMAA), za katera sofinanciranje prvotno ni bilo odobreno, in sicer zaradi nezadostnih razpisanih sredstev za sofinanciranje v celoti, sta novembra 2011 vložila na DUS FJK pritožbi zoper sklep, ki ga je NO sprejel na seji z dne 29. julija 2012 (podrobnejše informacije vsebuje Letno poročilo 2011 v poglavju 2.3).

NO je v okviru 12. redne seje z dne 6. julija 2012 v zvezi s 1. in 3. prednostno nalogo odobril dodelitev preostankov sredstev omenjenih prednostnih nalog za sofinanciranje dodatnih upravičenih projektov, uvrščenih na prednostno lestvico navedenih prednostnih nalog javnega razpisa št. 02/2009 (projekt MODEF, uvrščen na 21. mesto prednostne lestvice prednostne naloge 1 in projekt CAMAA, uvrščen na 15. mesto prednostne lestvice prednostne naloge 3). NO je ob tem odločil, da je dodelitev sredstev pogojena z izidom sodnih postopkov.

Prijavitelja sta 10. in 20. septembra 2012 umaknili pritožbi in sta s formalno odpovedjo sporu izpolnila pogoje za odobritev sofinanciranja za projekta MODEF in CAMAA. Pogodbi o dotaciji sofinanciranja za omenjena projekta sta bili podpisani 18. februarja 2013.

V letu 2012 sta OU in STS, ob vodenju rednih programskih aktivnosti, vodila tudi postopke, ki zadevajo pravico dostopa do dokumentacije v povezavi s standardnimi projekti, predloženimi v okviru javnega razpisa št. 03/2011 - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju, kar je privedlo do nekaterih operativnih težav. Vloženih je bilo 6 zahtev za dostop do dokumentacije, kot navedeno v spodnji tabeli.



Javni razpis št. 03/2011. Zahteve za dostop do dokumentacije.

	Akronim	Prednostna naloga	Vodilni partner	Programsko območje
1	EKOKRAS CARSO	1	Občina Komen	Obalno-kraška statistična regija
2	TERRA D'AMAR 2	3	Pro Santa Croce - Združenje za Križ	Pokrajina Trst, Obalno-kraška statistična regija
3	HOLDA	2	Comune di Forni di Sotto	Pokrajina Videm, Goriška statistična regija
4	EGHO (postopek dostopa do dokumentacije ni bil izveden, ker je VP zahtevo preklical)	2	Občina Brda	Pokrajina Trst, Pokrajina Videm, Pokrajina Gorica, Goriška statistična regija
5	NET-IS-TRADE (postopek dostopa do dokumentacije ni bil izveden, ker se VP ni odzval na odgovor OU)	2	INFORMEST CONSULTING S.r.l.	Pokrajina Trst, Pokrajina Videm, Pokrajina Gorica, Goriška statistična regija, Obalno-kraška statistična regija, Gorenjska statistična regija
6	ConBIO (postopek dostopa do dokumentacije ni bil izveden, ker se VP ni odzval na odgovor OU)	1	Università di Trieste, Dipartimento di Scienze della Vita	Pokrajina Trst, Pokrajina Videm, Pokrajina Pordenone, Obalno-kraška statistična regija, Goriška statistična regija

Od 6 predloženih vlog za dostop do dokumentacije je bilo sprejetih 5 (dva postopka dostopa do dokumentacije nista bila izvedena, ker se VP ni odzval na odgovor OU). Štiri vloge so vložili subjekti iz Furlanije Julijske krajine, 2 vlogi pa subjekti iz Republike Slovenije. Zahtevki za dostop do dokumentacije so se večinoma nanašali na pregled prednostnih lestvic sofinanciranih projektov in ocenjevalnih listov. Dva postopka sta bila zahtevnejša, saj so prijavitelji zahtevali več dokumentov o projektih (poročila, zapisnike ocenjevalnih komisij, ocene posameznih ocenjevalcev, seznam imen ocenjevalcev itd.), upravičenih do sofinanciranja, ki so dosegli višje število točk napram projektnim predlogom, ki so jih sami predložili.

V povezavi z delovanjem prvostopenjske kontrole in potrebami po izboljšavi postopkov, opisanimi v Letnem poročilu 2011, velja izpostaviti, da sta bili v okviru italijanske prvostopenjske kontrolne enote v letu 2011 sklenjeni dve novi pogodbi za opravljanje nalog prvostopenjskega kontrolorja in v letu 2012 dve dodatni pogodbi. Ena od pogodb je bila sklenjena predvsem za izvajanje pregledov na kraju samem na celotnem italijanskem programskem območju, ki bodo pogostejši v zadnjih letih programskega obdobja 2007-2013. Velja izpostaviti, da je ob zaključku leta deželna uprava, v okviru katere deluje italijanska prvostopenjska kontrolna enota, zaradi povečanega obsega dela začasno zadolžila dodatne uslužbenke za izvajanje aktivnosti prvostopenjske kontrole.

Tudi v okviru slovenske prvostopenjske kontrolne enote sta s 01.02.2012 in 01.04.2012 nastopila delo dva nova uslužbenca.

Glede delovanja prvostopenjskih kontrolnih enot je OU večkrat v letu 2012 posredoval metodološke usmeritve z namenom poenostavitve in pospešitve postopkov potrjevanja izdatkov ter zagotavljanja ciljne porabe za leto 2012.



Obenem je OU, na podlagi priporočil za pospešitev postopkov poročanja o izdatkih, ki jih je po izvedeni reviziji (12.-16. marec 2012) izdala Evropska komisija, prvostopenjskima kontrolnima enotama v Sloveniji in Italiji posredoval obvestilo št. 12613/GFC/IT-SLO/07-13 z dne 25. maja 2012 o poenostavitvi postopkov preverjanja izdatkov, z navodilom, da se upravno preverjanje s strani prvostopenjske kontrole izvaja izključno na ravni vsote po kategorijah izdatkov (BL) za posameznega upravičenca/projektne partnerja.

Ob pogovorih, tudi neformalnih, z obema prvostopenjskima kontrolnima enotama in ukrepih, ki so bili uvedeni s strani OU in STS, je bilo glede na predvideno ciljno porabo na ravni Programa za leto 2012 in na napovedano revizijo Programa s strani Evropske komisije za mesec marec 2012, 10. januarja 2012, v Trstu, organizirano srečanje med OU, OP, STS, slovensko Info točko in obema prvostopenjskima kontrolnima enotama z namenom, da bi poiskali skupne rešitve, zagotovili boljše izvajanje Programa ter doseganje skupnih ciljev s pravočasnim načrtovanjem in s tem preprečili morebitno uvedbo naključnih oz. izrednih ukrepov.

Na srečanju so bili predlagani in dogovorjeni različni ukrepi za pospešitev črpanja sredstev in je bilo dogovorjeno tesnejše sodelovanje med STS in prvostopenjsko kontrolo, z namenom zagotovitve enotnih stališč v povezavi s težavami, ki se pojavljajo pri upravičencih; s spremembo navodil za poročanje skladno z rešitvami, ki jih narekujejo izkušnje pridobljene pri izvajanju kontrol; z zagotavljanjem učinkovite podpore STS vsem VP standardnih projektov pri pripravi prvih poročil in pozornega vodenja in spremljanja upravičencev strateških projektov. Omenjene tematike so bile obravnavane tudi v okviru delavnice, ki je potekala v Vidmu, 26. januarja 2012. 12. in 17. januarja 2012 pa so potekala srečanja s prvostopenjsko kontrolno enoto v Sloveniji.

Na pobudo OU je 12. junija 2012 v Trstu potekalo drugo srečanje med organi Programa, v okviru katerega so bila predstavljena nova »Navodila in obrazci za poročanje za upravičence«, ki se uporabljajo za izdatke, nastale pri izvajanju projektnih aktivnosti po 01.06.2012. Posebna pozornost je bila namenjena tudi izvajanju priporočil, ki jih je izdala EK v okviru revizijskega postopka ter pospešitvi postopkov potrjevanja izdatkov za zagotovitev ciljne porabe za leto 2012. Slovenski nacionalni organ je sodelujoče na sestanku seznanil s potekom postopka sklenitve nacionalnih pogodb.

Za redno usklajevanje slovenske in italijanske prvostopenjske kontrolne enote in STS ter z namenom odpraviti težave, povezane z dostopom do serverja Sharepoint, ki so ga uporabljali organi Programa, je bila v letu 2012, po zaključku postopka oddaje javnega naročila zunanjemu izvajalcu, vzpostavljena nova platforma web-based poimenovana »4pm«, ki se financira iz sredstev Tehnične pomoči. Po izvedenem testiranju delovanja in določitvi uporabniških imen in gesel, je »4pm« postal osrednje orodje za izmenjavo in skupno rabo podatkov o Programu. Od meseca junija 2012 je na portalu »4pm« dostopna vsa pomembnejša dokumentacija za posamezne projekte vseh treh javnih razpisov: Pogodba o dotaciji sofinanciranja (SC), Pogodba o partnerstvu (PA), zadnja veljavna Prijavnica (AF) in Opis stroškovnega načrta (FP), priložena k Pogodbi o dotaciji sofinanciranja. Nadaljnji razvoj platforme »4pm« bo določen po uvedbi informacijskega sistema za elektronsko poročanje o izdatkih.

Odpoved pogodbe in dolgotrajna odsotnost nekaterih članov STS sta vplivali na hkratno opravljanje rednega dela in dodatne ad hoc podpore delovanju OU, RO in NO ter upravičencem. OU je zato sklenil dodatne pogodbe o sodelovanju (glej poglavje 1.2 tega poročila). Tudi slovenska stran je, čeprav z zamudo, sklenila pogodbo o zaposlitvi za dodatnega uslužbenca v okviru STS, ki je nastopil delo v začetku meseca decembra 2011. Ob tem je programski partner



Republika Slovenija realiziral zaposlitev dodatnega uslužbenca v okviru slovenske Info točke (od januarja 2012) ter dveh uslužbencev v okviru slovenske prvostopenjske kontrolne enote (od decembra 2011 in od februarja 2012).

Korektivni ukrepi, uvedeni zaradi ponavljajočih napak v okviru postopkov javnega naročanja, so opisani v poglavju 2.2 tega poročila.



2.4 Spremembe v okviru izvajanja Operativnega programa (če je ustrezno)

- Dejavniki, ki niso neposredno vezani na ukrepe operativnega programa, vendar neposredno vplivajo na izvajanje programa (na primer zakonodajne spremembe ali nepričakovan socialno-ekonomski razvoj).

V letu 2012 so organi, odgovorni za upravljanje Programa, zaradi neposrednega negativnega vpliva gospodarske krize in drugih dogodkov - med temi je tudi majski potres na programskem območju (območja Pokrajin Ravenna, Ferrara in Rovigo) - na upravljanje Programa ter zaradi upočasnitve izvajanja projektov in črpanja sredstev, uvedli ustrezne ukrepe.

Že oktobra 2012 je OU na Evropsko komisijo naslovil prošnjo za upoštevanje izjeme od samodejne prekinitve obveznosti in začasno znižanje ciljne vrednosti porabe »N+2« zaradi višje sile, in sicer v višini 6.287.569,99 (ESSR sredstev), skladno s točko c) 96. člena Uredbe Sveta št. 1083/2006. Navedeni znesek predstavlja vsoto sredstev, dodeljenih upravičencem na območjih, ki jih je prizadel potres.

O tem je med uradnim srečanjem, ki je potekalo v Bruslju, 9. oktobra 2012, predsednik Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine obvestil tudi člana Komisije g. Johannesa Hahna. Zahvaljujoč posredovanju pristojnega odbornika Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine je bil o prošnji obveščen tudi glavni direktor Direktorata E pri Evropski komisiji, g. José Palma Andrés. Posredovanje pristojnega odbornika je omogočilo tudi uradno srečanje s predstavniki Evropske komisije, ki je potekalo v Bruslju, 29. januarja 2013, in v okviru katerega je bila posebna pozornost namenjena pomembnosti obravnave predložene prošnje ter je bilo podano ustrezno neformalno predhodno zagotovilo glede utemeljenosti izjeme.

Nato je Komisija z dopisom št. Ares(2013)269048 z dne 28. februarja 2013 potrdila podatke o certificiranem izdatkih (vrednost ESRR sredstev) na dan 31.12.2012 in zaprosila OU, da pripravi poročilo z utemeljitvijo razlogov za nedoseganje ciljne porabe za leto 2012 (razlika do vrednosti predvidene ciljne porabe znaša 2.454.495,46 EUR ESRR sredstev).

Z dopisom št. 8151 z dne 22. marca 2013 je OU posredoval utemeljitev razlogov za nedoseganje ciljne porabe za leto 2012. Obenem je OU predhodno obvestil tudi o namenu predložitve prošnje za znižanje ciljne porabe za leto 2013, in sicer za razliko med 6.287.569,99 EUR (skupna vrednost zahtevanega znižanja ciljne porabe 2012 - ESRR sredstva) in 2.454.495,46 EUR (dejanska vrednost razlike do ciljne porabe 2012 - ESRR sredstva).

Na dan priprave tega poročila uradni odgovor Komisije še ni prispel. Predvidoma bo Komisija ogovorila do konca meseca junija 2013. Izid postopka bo opisan v Letnem poročilu o izvajanju za leto 2013.



2.5 Bistvene spremembe v skladu s 57. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 (če je ustrezno)

- Primeri, pri katerih je bila ugotovljena bistvena sprememba v skladu s 57. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.

Glede na stanje izvajanja projektov v času priprave Letnega poročila informacije v skladu z zgoraj navedenim členom niso relevantne.



2.6 Dopolnjevanje z drugimi instrumenti

- Povzetek izvajanja določb, ki zagotavljajo usklajevanje med pomočmi iz ESRR, ESS, Kohezijskega sklada, EKSRP, ESR ter ukrepi EIB in drugih obstoječih finančnih instrumentov (4. odstavek 9. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006).

Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 določa, da strukturni skladi med seboj delujejo usklajeno ter dopolnjujejo druge obstoječe finančne instrumente in aktivnosti na regionalni in lokalni ravni. Obenem so usmerjeni v uresničevanje prednostnih nalog, določenih na ravni EU.

V okviru izvajanja Programa ni bilo potrebno uvesti dodatnih posebnih ukrepov za zagotavljanje razmejevanja in usklajevanja sredstev, ki jih prispevajo ESRR in drugi finančni instrumenti (evropski in ostali) na tem območju.

V zvezi s tem velja omeniti, da se na programskem območju izvajajo različne aktivnosti, od slovenskega programa »Konvergenca«, katerega prednostni cilji so v glavnem realizacija neposrednih naložb za podporo razvojnih in raziskovalnih aktivnosti na slovenskem ozemlju ter spodbujanje projektov na področju akademskega in podjetniškega raziskovanja, do italijanskega programa »Deželne konkurenčnosti« za okrepitev produktivnosti, širjenja inovacij in na znanju temelječe družbe ter okoljskih in energetskih izboljšav. Programi zaposlovanja, ki se sofinancirajo iz ESS na celotnem upravičenem območju, omogočajo strokovno usposabljanje nezaposlenih oseb in prekvalifikacijo delavcev, kot tudi aktivnosti za zmanjševanje vpliva diskriminacije na trgu dela in socialne izključenosti, skladno s smernicami Lizbonske strategije. V okviru programov Evropskega teritorialnega sodelovanja na programskem območju potekajo tudi programi čezmejnega sodelovanja Italija-Avstrija in IPA, Območje Alp, transnacionalni programi Srednja Evropa, Jugovzhodna Evropa in Mediteran in programi medregionalnega sodelovanja. Aktivnosti, ki se sofinancirajo iz skladov ESRR in ESR so med seboj usklajeni in se ne prekrivajo z aktivnostmi Programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013.

Na splošno velja omeniti, da sama narava, posebnosti in strogi pravni okvir čezmejnega sodelovanja, preprečujejo prekrivanje z drugimi ukrepi, ki se ravno tako financirajo iz strukturnih skladov v obeh državah članicah (Italiji in Sloveniji) ter spodbujajo vzpostavitev potrebnih sinergij za zagotavljanje »dodane vrednosti« družbeno-gospodarskega razvoja območja.

V zvezi s 87 projekti, za katere je bilo sofinanciranje odobreno velja opozoriti, da ne prihaja do podvajanja z aktivnostmi, ki se financirajo iz drugih skladov, navedenih v zgornjih odstavkih. Velja pa izpostaviti, da prihaja do sinergijskih povezav z drugimi skladi in specifičnimi prednostnimi nalogami, ki jih določajo dokumenti o izvajanju in med čezmejnimi projektnimi aktivnostmi v okviru treh prednostnih nalog Programa. Čezmejni ukrepi projektov, ki se sofinancirajo v okviru prednostne naloge 2 »Konkurenčnost in na znanju temelječa družba«, povečujejo učinke, ki jih spodbujajo enake prednostne naloge slovenskih nacionalnih in deželnih operativnih programov, namenjenih spodbujanju konkurenčnosti podjetij.



2.7 Spremljanje in ocenjevanje

- Ukrepi za spremljanje in ocenjevanje, ki jih je sprejel organ upravljanja ali nadzorni odbor, vključno s postopki zbiranja podatkov, težavami, ki so nastopile in ukrepi za odpravo teh težav.

NADZOR

V skladu z določili evropskih uredb je sistem nadzora v okviru Programa kompleksen in deluje na različnih ravneh.

V skladu s 16. členom Uredbe (ES) št. 1080/2006 in 13. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 zakonitost in pravilnost izdatkov, ki jih zahtevajo upravičenci, preverjajo prvostopenjski kontrolorji. Za kontrolo izdatkov italijanskih vodilnih in projektnih parterjev je pristojna Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina - Organizacijska enota za izvajanje prvostopenjske kontrole - programi, sofinancirani iz strukturnih skladov⁸, ustanovljena s sklepom Deželnega odbora Furlanije Julijske krajine št. 1228 z dne 28.06.2012, medtem ko kontrolo izdatkov slovenskih vodilnih in projektnih partnerjev opravlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Direktorat za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje, Sektor za kontrolo - programi ETS, IPA in MFM.

Z namenom usklajevanja postopkov izvajanja kontrole na italijanski in slovenski strani ter pojasnjevanja nekaterih kritičnih točk v okviru izvajanja posameznih projektov so med omenjenima organoma in STS potekali usklajevalni sestanki, in sicer 10. januarja 2012 in 12. junija 2012 v Trstu.

V okviru svojih nalog prvostopenjski kontrolorji preverjajo poročila, ki jih predložijo upravičenci in izdajo Izjavo o potrjenih izdatkih. Slednja se nanaša na izdatke, ki so upravičeni v skladu z veljavno zakonodajo Skupnosti in nacionalno zakonodajo, s »Priročnikom o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju«, ki ga je odobril NO in je bil objavljen kot priloga k javnim razpisom ter v skladu z »Navodili in obrazci za poročanje za upravičence« - verzija št. 04/2013 z dne 25.02.2013 (za strateške projekte) in verzija št. 01/2013 z dne 25.02.2013 (za standardne projekte).

Metodologija, sprejeta za izvajanje kontrol v skladu s »Priročnikom o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju«, je za italijansko prvostopenjsko kontrolo določena v »Priročniku za izvajanje prvostopenjskih kontrol«, potrjenim s sklepom št. 534/UO/DIR/CPL z dne 30. septembra 2010 in spremenjenim s sklepom št. 2146/UO/DIR/CPL z dne 13.08.2012 ter ponovno spremenjenim s sklepom št. 827/UO/DIR/CPL z dne 28.03.2013. Metodologija je skladna z nalogami, ki jih določajo uredbe, kar v okviru izvajanja kontrol in potrjevanja zagotavlja preverjanje dobave sofinanciranega blaga in storitev, verodostojnosti prijavljenih izdatkov za izvajanje odgovarjajočih projektnih aktivnosti, kakor tudi skladnost izdatkov in povezanih operacij, ali delov operacij, s predpisi Skupnosti in veljavnimi nacionalnimi predpisi.

⁸ Omenjena organizacijska enota »Posizione Organizzativa Controlli di I livello Programmi Fondi Strutturali« od 30.06.2012 nadomešča prejšnjo »Struttura stabile Controlli I livello Programmi Fondi strutturali«.



Na projektni ravni so upravičeni in zakoniti tisti izdatki, ki so navedeni v Prijavnici in v Opisu stroškovnega načrta, ki ju je odobril NO in se uvrščajo v kategorije izdatkov, predvidene v zgoraj omenjenem priročniku ter so potrebni za izvajanje projekta, so skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, učinkovitosti in gospodarnosti, so nastali pri VP in PP v obdobju upravičenosti, ki ga določa javni razpis in so bila zanje predložena ustrezna dokazila o plačilu ter so nastali skladno z veljavnimi predpisi s področja javnega naročanja, državnih pomoči, informiranja in obveščanja.

Prvostopenjska kontrola se je v letu 2012 izvajala v skladu z določeno metodologijo in sicer v dveh fazah: a) upravna oz. administrativna kontrola in b) kontrola na kraju samem.

- a. V okviru upravne oz. administrativne kontrole so bili pregledani vsi računi in druga dokazila enake dokazne vrednosti v izvirniku, kakor tudi kopije vseh drugih dokumentov, ki omogočajo izvedbo preverjanj. Zajetih je bilo 100% izdatkov, vključenih v posamezno poročilo, ki ga je predložil upravičenec.

V okviru izvajanja upravne oz. administrativne kontrole so kontrolorji izpolnili kontrolne sezname, kot določeno v omenjenem Priročniku za izvajanje prvostopenjske kontrole: zlasti so bili izpolnjeni kontrolni sezname za splošno in administrativno preverjanje posameznih izdatkov po kategorijah. V primeru preverjanja postopkov javnega naročanja, so bili uporabljeni tudi kontrolni sezname za javna naročila, splošni in podrobni, namenjeni naročilom vrednosti nad in pod pragom, ki ga določajo uredbe EU.

Po posameznem upravnem oz. administrativnem preverjanju so kontrolorji izdali Izjavo o potrjenih izdatkih, ki jo podpišeta kontrolor, ki je opravil preverjanje ter vodja kontrolne enote.

- b. Za Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 se kontrole na kraju samem opravijo za 100% operacij in sicer je v času trajanja projekta predvidena vsaj ena kontrola na kraju samem pri posameznem upravičencu. V primeru, da izdatki posameznega upravičenca navedeni v odobreni Prijavnici presegajo 1 milijon EUR, sta v času izvajanja projekta predvideni najmanj dve kontroli na kraju samem.

Ob tem je potrebno na letni ravni opraviti kontrole na kraju samem za vsaj 20% skupnih potrjenih izdatkov, v skladu s kriteriji navedenimi v nadaljevanju:

- i. 20% izdatkov za gradbena dela, nakup zemljišč in nepremičnin,
- ii. 20% izdatkov za opremo,
- iii. 20% izdatkov za zunanje sodelavce,
- iv. 20% izdatkov nastalih pri partnerju, za katerega so bili potrjeni izdatki v višini 50% celotne vrednosti projekta,
- v. izdatki vsaj enega upravičenca za vsako od 3 dežel, ki so partnerice v okviru Programa,
- vi. izdatki vsaj enega upravičenega za vsako od prednostnih nalog Programa,
- vii. izdatki vsaj enega VP za projekt.

Načela, ki urejajo način izvajanja kontrol na kraju samem, so določena v omenjenem priročniku, ki predvideva izpolnjevanje posebnega kontrolnega seznama s strani kontrolorjev.

V zvezi z italijansko prvostopenjsko kontrolo velja izpostaviti, da v letu 2012 nihče od upravičencev ni zaključil z izvajanjem predvidenih projektnih aktivnosti, zato so bile opravljene le vmesne kontrole na kraju samem, skladno z zgoraj opisano metodologijo in po opravljenem vzorčenju, na osnovi katerega je bilo predvidenih 14 kontrol izdatkov, potrjenih na dan 31.12.2011. V spodnji tabeli so v stolpcu G in stolpcu H prikazani skupno število izvedenih kontrol na kraju samem in zneski potrjenih izdatkov. Dejansko število opravljenih kontrol na kraju samem je nižje od predvidenega z vzorčenjem, ker je PP4 projekta TRANS2CARE, Univerza v Ferrari, z elektronskim sporočilom z dne 6. junija 2012, obvestila o težavah pri izvajanju aktivnosti, ki so nastale zaradi potresa v Deželi Emilia Romagna z dne 20. maja 2012 ter zaprosila za podaljšanje roka za predložitev poročil. Zaradi navedenega se kontrole na kraju samem ni opravilo. Izvedba le-te je prenesena na leto 2013.



Podatki o izvedenih prvostopenjskih kontrolah na italijanski strani v letu 2012

AKRONIM PROJEKTA	a) št. prejetih poročil	b) št. izdanih izjav o potrjenih izdatkih	c) višina zahtevanih izdatkov (v €)	d) višina potrjenih izdatkov (v €)	e) izdatki, za katere je bila potrditvev zadržana ali še ni bila izdana izjava o potrjenih izdatkih (v €)	f) preverjeni neupravičeni izdatki oz. izdatki, za katere je bila potrditvev zadržana (v €)	g) izvedene kontrole na kraju samem (v €)	h) potrjeni izdatki v okviru kontrole na kraju samem (v €)
ADRIA-A	26	26	479.331,89	473.555,68		5.776,21	1	1.895,62
AT FVG - ER - VEN	7	7	583.965,36	583.768,63		196,73		
CARSO-KRAS	20	13	559.130,82	418.264,85	97.553,77	43.312,20	3	101.127,02
CITIUS	7	7	477.817,95	476.807,55		1.010,40		
CLIMAPARKS	11	9	414.035,58	394.932,20	17.710,72	1.392,66	3	203.593,12
E-HEALTH	16	12	255.623,38	183.015,01	50.474,98	22.133,39		
ICON	13	13	377.978,74	322.035,97		55.942,77	1	138.924,53
INTERBIKE	21	21	92.517,59	89.088,67		3.428,92		
JEZIKLINGUA	4	1	483.557,16	448.132,45	28.156,78	7.267,93		
KNOW US	21	20	400.659,94	394.877,10	4.937,62	845,22		
OPENMUSEUMS	15	15	330.436,30	323.908,54		6.527,76		
PARSJAD	9	9	318.864,26	317.864,26		1.000,00	2	243.601,88
SAFEPORT	16	12	295.726,87	292.447,06		3.279,81		
SHARED CULTURE	6	6	268.497,33	260.134,41		8.362,92	2	199.155,12
SIGMA2	15	13	303.954,81	236.730,16	53.370,50	13.854,15		
SLOWTOURISM	23	23	437.413,51	419.584,11		17.829,40	1	74.710,09
TRANS2CARE	13	7	361.159,64	228.307,31	126.610,68	6.241,65		
SKUPNO STRATEŠKI	243	214	6.440.671,13	5.863.453,96	378.815,05	198.402,12	13	963.007,38
UELIJEII	3	3	35.001,04	31.313,32		3.687,72		
LIVING FOUNTAINS	0	0	-	-	-	-		
IDAGO	3	2	272.120,55	180.717,32	84.657,62	6.745,61		
MOTOR	9	9	52.426,05	51.687,03		739,02		
SHOW	8	8	136.290,15	130.954,66		5.335,49		



AKRONIM PROJEKTA	a) št. prejetih poročil	b) št. izdanih izjav o potrjenih izdatkih	c) višina zahtevanih izdatkov (v €)	d) višina potrjenih izdatkov (v €)	e) izdatki, za katere je bila potrditev zadržana ali še ni bila izdana izjava o potrjenih izdatkih (v €)	f) preverjeni neupravičeni izdatki oz. izdatki, za katere je bila potrditev zadržana (v €)	g) izvedene kontrole na kraju samem (v €)	h) potrjeni izdatki v okviru kontrole na kraju samem (v €)
SEA	18	9	177.667,35	100.468,23	65.666,89	11.532,23		
BELLIMPRESA	11	8	112.463,00	55.346,48	56.546,52	570,00		
SOLUM	4	3	31.832,06	27.390,98	785,38	3.655,70		
TRANSARMON	17	15	117.851,71	105.196,70	12.614,31	40,70		
GLIOMA	2	2	49.875,86	49.619,73		256,13		
LEX	7	7	88.292,15	80.914,87		7.377,28		
E-SURGERYNET	7	7	78.482,93	78.009,13		473,80		
E-CARDIONET	5	1	59.948,09	21.126,28	38.770,55	51,26		
STUDY CIRCLES	11	9	90.714,47	64.294,86	8.996,96	17.422,65		
CROCTAL	9	7	52.778,60	32.738,29	19.996,99	43,32		
ISO-TO	1	1	3.188,92	3.188,92		-		
ISO-PRA	1	1	889,92	889,92		-		
ISO-GIO	1	1	419,27	419,27		-		
ISO-RE	3	2	44.287,82	608,49	43.679,33	-		
ISO-PA	1	1	889,92	889,92		-		
EDUKA	13	10	221.125,53	169.466,05	46.730,85	4.928,63		
TESSI	6	6	116.457,54	115.926,39		531,15		
ENERGYVILLAB	32	32	186.026,07	164.883,41		21.142,66		
AGROTUR	5	5	72.663,81	66.300,56		6.363,25		
ALISTO	8	8	200.322,21	198.621,13		1.701,08		
PESCA	10	6	157.388,91	102.772,83	52.328,26	2.287,82		
HERITASTE	15	11	105.140,05	78.611,83	24.672,68	1.855,54		
HYDRO KARST	4	4	67.552,64	67.483,80		68,84		
INNOVACQUA	13	10	211.279,43	145.977,32	52.924,09	12.378,02		
SIIT	12	8	140.956,65	120.324,82	13.952,09	6.679,74		
BIODINET	5	4	79.600,64	63.695,62	15.803,76	101,26		



AKRONIM PROJEKTA	a) št. prejetih poročil	b) št. izdanih izjav o potrjenih izdatkih	c) višina zahtevanih izdatkov (v €)	d) višina potrjenih izdatkov (v €)	e) izdatki, za katere je bila potrditev zadržana ali še ni bila izdana izjava o potrjenih izdatkih (v €)	f) preverjeni neupravičeni izdatki oz. izdatki, za katere je bila potrditev zadržana (v €)	g) izvedene kontrole na kraju samem (v €)	h) potrjeni izdatki v okviru kontrole na kraju samem (v €)
PANGA	8	6	82.908,08	80.129,97	2.738,11	40,00		
JULIUS	10	7	119.269,24	95.069,51	24.199,72	0,01		
TIP	10	8	104.386,23	101.160,18	3.226,05	-		
T-LAB	10	9	86.347,46	83.713,63	2.633,83	-		
SIGN	9	9	99.852,62	97.376,21		2.476,41		
GEP	5	4	93.535,32	64.275,70	29.259,62	-		
LA NATURA	6	6	5.171,94	5.171,94		-		
IPFORSMES	9	9	90.929,69	81.878,31		9.051,38		
PROFILI	7	6	71.143,07	60.635,06	8.866,45	1.641,56		
WINE NET	6	5	91.053,80	65.582,10	10.171,70	15.300,00		
ADRIAWET2000	11	9	97.051,14	78.011,98	18.453,11	586,05		
MACC	14	10	241.212,19	156.904,79	83.784,34	523,06		
SALTWORKS	7	7	47.145,96	44.302,43		2.843,53		
ASTIS	5	5	96.107,47	89.720,54		6.386,93		
FUTURELIGHTS	5	5	82.069,13	82.069,13		-		
GOTRAWAMA	6	6	22.320,77	22.320,77		-		
INTEGRAID	4	4	72.910,90	72.794,26		116,64		
SKUPNO STANDARDNI	376	315	4.467.348,35	3.590.954,67	721.459,21	154.934,47	0	-
SKUPAJ 2012	619	529	10.908.019,48	9.454.408,63	1.100.274,26	353.336,59	13	963.007,38

Vir: pripravila italijanska prvostopenjska kontrolna enota

Tabela prikazuje število prejetih poročil v letu 2012 (stolpec a) in število izjav o potrjenih izdatkih, izdanih s strani prvostopenjske kontrolne enote (stolpec b), znesek zahtevanih izdatkov (stolpec c) in skupni znesek izdatkov potrjenih za leto 2012 (stolpec d).

Velja poudariti, da so v stolpec b) vključena tudi nekatera poročila upravičencev, ki so bila predložena v letu 2011 in za katera so bile Izjave o potrjenih izdatkih izdane v letu 2012. Odgovarjajoče zneske vsebuje stolpec d).

V stolpec b) so vključena tudi poročila, ki so bila predložena novembra in decembra 2012 in za katere se postopki preverjanja in potrjevanja niso zaključili do konca leta 2012. Zneski teh poročil so navedeni v stolpcu e), ki vsebuje:

- znesek izdatkov, za katere sta bila preverjanje in potrditev zadržana zaradi pomanjkljive dokumentacije ali zaradi drugih težav pri predložitvi poročila;
- poročila upravičencev z zelo nizkimi zahtevanimi izdatki. Pregled teh poročil je bil odložen, prednost pri pregledovanju so imela poročila z višjimi zneski;
- poročila, ki niso prispela v roku, ki bi omogočal potrditev do konca leta 2012.

V stolpcu f) so navedeni neupravičeni izdatki oz. preverjeni izdatki, za katere je bila potrditev zadržana zaradi pomanjkljive dokumentacije.

Zadnji stolpec (stolpec g) navaja število opravljenih preverjanj na kraju samem ter odgovarjajoče zneske upravičenih izdatkov (stolpec h) po opravljenih kontrolah na kraju samem.

V okviru italijanske prvostopenjske kontrolne enote sta se v letu 2012 zaposlila dva dodatna kontrolorja, vendar je vodja enote že posredoval dopis z dne 11.02.2013, z utemeljitvijo potrebe po dodatnih zaposlitvah zaradi velikega števila projektov, ki se izvajajo v letu 2013 in za katere bo potrebno preveriti izdatke. V letu 2013 se namreč zaključuje izvajanje aktivnosti strateških projektov, medtem ko je v polnem teku izvajanje aktivnosti standardnih projektov javnega razpisa št. 02/2009. Z izvajanjem aktivnosti so pričeli tudi standardni projekti javnega razpisa št. 03/2011 - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju.

V zvezi s težavami, ki so bile ugotovljene v okviru izvajanja prvostopenjske kontrole v letu 2012 velja izpostaviti, da je bilo potrebno pogosto zahtevati dopolnitve dokumentacije s strani PP (predvsem s strani upravičencev javnega razpisa št. 02/2009, ki so prvič poročali o izdatkih), tako v zvezi s poročili, kakor tudi v povezavi s pomanjkljivimi dokazili o izdatkih. Z namenom odpraviti omenjene težave in podati upravičencem vse potrebne informacije o upravičenosti izdatkov in pravilni pripravi poročil, so bile tudi v letu 2012 organizirane, v sodelovanju med italijansko prvostopenjsko kontrolno enoto in STS, izobraževalne delavnice za upravičence na celotnem italijanskem programskem območju.

V letu 2012 je bilo delo prvostopenjskih kontrolorjev oteženo tudi zaradi povečanega obsega novih predpisov, ki urejajo delovanje javne uprave, saj so nacionalni in deželni vladni organi uvedli številne reforme v povezavi z javno porabo. Prvostopenjski kontrolni enoti sta bili zato zelo zaposleni s seznanjanjem z novostmi in usposabljanjem zaposlenih, kakor tudi s prilagajanjem postopkov kontrole novi zakonodaji.



Slovenska prvostopenjska kontrolna enota opravlja delo skladno s »Priročnikom o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju« ter drugimi navodili OU. Delo slovenske nacionalne kontrolne enote pa je natančneje predstavljeno v »Navodilih za delo kontrolne enote za O.P. SI-IT 2007-2013«.

Zaradi velike količine dela je v letu 2012 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) sprejel ukrepe za povečanje števila pregledanih poročil in izvedel postopke za zaposlitev četrtega kontrolorja, ki je z delom pričel v februarju 2012. Z notranjimi prerazporeditvami pa je od aprila 2012 zagotovil še petega nacionalnega kontrolorja⁹. Kljub omenjenim ukrepom se je sredi leta 2012 izkazalo, da kontrola ne bo uspela pregledati vseh zahtevkov, zato je MRGT del pregleda predal zunanjim izvajalcem, ki so delovali po okriljem MGRT in vodjo slovenske prvostopenjske kontrolne enote. In sicer so bile sklenjene pogodbe za opravljanje storitev s podjetjem E-Zavod, Tehnološko agencijo Slovenije in Javno agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije.

Skupno je bilo v letu 2012 s strani upravičencev predloženih 665 poročil skupaj z zahtevki za izplačilo. Skupna vrednost zahtevanih izdatkov omenjenih poročil znaša 8.214.267,82 EUR, kot navedeno v spodnji tabeli.

Predložena poročila za projekte, sofinancirane v okviru javnih razpisov št. 01/2009, 02/2009 in 03/2011.

Javni razpis št.	Prejeta poročila v letu 2012	Zahtevani znesek (v €)
01/2009	216	4.744.103,36
02/2009	440	3.730.139,43
03/2011	9	54.401,71
Skupaj	665	8.528.644,50

Vir: pripravi slovenska prvostopenjska kontrolna enota

Skupno je v letu 2012 prvostopenjska kontrolna enota obravnavala 565 poročil (295 poročil projektov, odobrenih v okviru razpisa št. 01/2009 in 270 poročil projektov, odobrenih v okviru razpisa št. 02/2009), od tega je bilo 13 poročil zavrženih, 552 poročil pa potrjenih. Skupna vrednost v letu 2012 pregledanih poročil znaša 9.513.163,45 EUR, od tega je bilo potrjenih 8.214.267,82 EUR (6.723.909,01 EUR na razpisu št. 01/2009 in 2.789.254,44 EUR na razpisu št. 02/2009), 1.258.354,44 EUR je bilo neupravičenih izdatkov.

Poglavitni razlogi za neupravičenost izdatkov so bili: nepravilnosti v postopkih javnega naročanja, nepravilnosti pri izračunih urnih postavk in potnih stroškov, neustrezna dokazila in pravna podlaga, neustrezni ključ za izračun administrativnih stroškov, neustrezno pripravljena dokumentacija, drugo.

Tabele v nadaljevanju vsebujejo podatke o poročilih, predloženih s strani upravičencev projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 01/2009 in javnega razpisa št. 02/2009, ki jih je slovenska prvostopenjska kontrolna enota pregledala in odgovarjajoče potrjene zneske.

⁹ Na dan 31.12.2012 je bilo v Sektorju za kontrolo - programi ETS, IPA in MFM za O.P. Slovenija - Italija 2007-2013 zaposlenih 5 kontrolorjev.

**Javni razpis št. 01/2009. Zahtevani in potrjeni zneski ter neupravičeni izdatki.**

Št. potrjenih poročil 2012	Vrednost potrjenih poročil 2012 (v €)	
295	6.723.909,01	Zahtevani zneski
	5.680.067,53	Potrjeni zneski
	1.043.841,48	Neupravičeni izdatki

Vir: pripravila slovenska prvostopenjska kontrolna enota

Javni razpis št. 02/2009. Zahtevani in potrjeni zneski ter neupravičeni izdatki.

Št. potrjenih poročil 2012	Vrednost potrjenih poročil 2012 (v €)	
270	2.789.254,44	Zahtevani zneski
	2.574.741,48	Potrjeni zneski
	214.512,96	Neupravičeni izdatki

Vir: pripravila slovenska prvostopenjska kontrolna enota

Zaradi številnih napak ugotovljenih v letu 2011 je slovenska kontrola enota v sodelovanju z Info točko in STS v mesecu januarju 2012 pripravila dve delavnici, namenjeni izključno slovenskim partnerjem. Delavnici, na katerih je skupno sodelovalo 204 upravičencev, sta potekali v Ljubljani 12. in 17. 1. 2012.

V letu 2012 je slovenska nacionalna kontrolna enota pregledovala zahteve glede na datum prejema. V dogovoru z STS pa je v zadnjih dveh mesecih leta 2012 prednostno obravnavala višje zahteve, neglede na datum prejema, da bi bila do konca leta preverjena in potrjena najvišja možna vsota. Zaradi omenjenega ukrepa so zahtevki manjših vrednosti na pregled čakali dlje od povprečja.

Kljub sprejetim ukrepom je na dan 31.12.2012 na pregled čakalo še 132 zahtevkov (25 iz javnega razpisa št. 01/2009 in 107 iz javnega razpisa št. 02/2009) v skupni vrednosti 3.080.055,40 EUR (1.804.742,83 EUR iz javnega razpisa št. 01/2009 in 1.275.312,57 EUR iz javnega razpisa št. 02/2009).

V letu 2012 je slovenska nacionalna kontrola enota izvedla 5 kontrol na kraju samem (KKS), preverjeno je bilo 431.257,50 EUR že potrjenih izdatkov (144.044,68 EUR potrjenih v letu 2010, 249.164,58 EUR v letu 2011, 38.048,24 EUR v letu 2012 - pred izvedbo KKS) in 110.000,00 EUR izdatkov, ki so bili potrjeni po opravljeni KKS. Kontrolna enota se je odločila za izvedbo KKS pred potrditvijo zahtevka pri partnerju Občina Gorenja-vas Poljane, saj je bil zahtev enake vrednosti partnerjevega proračuna na projektu.

V tabeli v nadaljevanju so navedeni podatki o rednih kontrolah na kraju samem, ki jih je izvedla slovenska nacionalna kontrolna enota.



Projektni partner	Akronim projekta	Vrednost projekta po PP (v €)	Potrjeni znesek v letu 2010 (v €)	Potrjeni znesek v letu 2011 (v €)	Potrjeni znesek v letu 2012 - do izvedbe KKS (v €)	Datum izvedbe KKS
Občina Kobarid	SLOWTOURISM	40.000,00		0,00	38.048,24	9.2.2012
Občina Gorenja vas - Poljane	SLOWTOURISM	110.000,00		0,00	0,00	6.3.2012
Občina Miren-Kostanjevica	KRAS-CARSO	90.000,00		83.000,00	0,00	21.2.2012
Občina Sežana	KRAS-CARSO	1.228.000,00	144.044,68	127.972,60	0,00	9.1.2012
Občina Komen	KRAS-CARSO	90.000,00		38.191,98	0,00	17.2.2012
Skupaj			144.044,68	249.164,58	38.048,24	

Poleg rednih kontrol je v skladu z dopisom OU z dne 18.06.2012 slovenska prvostopenjska kontrolna enota v sodelovanju s STS izvedla še 5 dodatnih kontrol, v okviru katerih je preverjala predvsem izdatke, certificirane v letu 2010. Izredne kontrole so bile po navodilu OU izvedene na projektih CLIMAPARKS, KRAS-CARSO in JEZIK LINGUA. Ker je šlo za izredne kontrole na kraju samem s poudarkom na preverjanju izdatkov nastalih v letu 2010, bo slovenska nacionalna kontrola pri partnerjih pred zaključkom projektov opravila še redni KKS.

V tabeli v nadaljevanju so navedeni podatki o dodatnih kontrolah na kraju samem, ki jih je izvedla slovenska nacionalna kontrolna enota.

Projektni partner	Akronim	Vrednost projekta po PP (v €)	Potrjeni znesek v letu 2010 (v €)	Datum izvedbe KKS
Triglavski narodni park	CLIMAPARKS	925.405,12	63.302,82	14.8.2012
JZ Krajinski park Strunjan	CLIMAPARKS	212.000,00	11.115,28	28.8.2012
Občina Sežana	KRAS-CARSO	1.228.000,00	144.044,68	/*
Unione Italiana/Italijanska unija	JEZIKLINGUA	645.988,73	50.750,46	12.9.2012
Osrednja knjižnica 'Srečko Vilhar'	JEZIKLINGUA	123.491,20	23.992,97	28.8.2012
CAN Capodistia/SSIN Koper	JEZIKLINGUA	61.405,20	20.014,92	12.9.2012
Skupaj			313.221,13	

*Kontrola na kraju samem je bila že izvedena v okviru redno predvidenih kontrol.

V zvezi s sistemom drugostopenjske kontrole, RO izvaja naloge, ki jih določa 62. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. Pomaga mu skupina revizorjev, ustanovljena v skladu z 2. odstavkom 14. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006, kot podrobneje opisano v poglavju 1.2 tega poročila.

V zvezi z obveznostmi upravičencev je potrebno poudariti, da je v Pogodbi o partnerstvu in Pogodbi o dotaciji sofinanciranja navedeno, da morajo upravičenci, hraniti projektno dokumentacijo do 31. decembra 2020 oziroma, v primeru delne zaključitve Programa, v skladu z roki, ki so navedeni v 90. členu Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. Ta dokumentacija mora biti dostopna za morebitne kontrole, preverjanja in revizije s strani programskih, EU ali nacionalnih organov.

Ob tem lahko dodaten nadzor nad sofinanciranimi operacijami izvaja tudi Evropska komisija. Program je bil s strani Evropske komisije vzorčno izbran za revizijo v letu 2012 in sicer je med

12. in 16. marcem 2012 potekala revizija v okviru Programa, ki so jo izvedli revizorji Generalnega direktorata za regionalno politiko Evropske komisije. Ugotovitve revizorjev bodo opisane v Letnem poročilu o izvajanju za leto 2013, saj do datuma priprave tega poročila še ni bilo posredovano končno revizijsko poročilo.

VREDNOTENJE IN OCENJEVANJE

V skladu z uredbenimi določili in določili O.P., bosta sprotno vrednotenje Programa za obdobje 2012-2015, ki ga izvede neodvisen ocenjevalec, ločen od OP, RO in OU, izvedla »Associazione Temporanea d'Impresa« (ATI) »GRETA Associati in MK Projekt« iz Benetk. Izvajalca sta bila izbrana na javnem razpisu dne 26.09.2012; pogodba je bila podpisana 26.11.2012.

Javni razpis je bil 20. aprila 2012 objavljen v Uradnem listu Republike Italije št. 46, medtem ko je bila razpisna dokumentacija objavljena na uradni spletni strani Programa, na spletni strani Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine in na strani italijanskega Ministrstva za infrastrukturo. OU v okviru odprtega postopka ni prejel nobene ponudbe, zato je 20. junija 2012 pričel nov postopek oddaje javnega naročila s pogajanji, in sicer na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, v skladu s 83. členom zakonodajnega odloka št. 163/2006 z naknadnimi spremembami in dopolnitvami. Postopek se je zaključil z oddajo naročila izbranemu izvajalcu. Dne 14. decembra 2012 je bilo organizirano prvo srečanje med OU, STS in izbranim izvajalcem, v okviru katerega so bili predstavljeni prvi osnutki dokumentov in predlagan delovni načrt, ki ga je pripravil izvajalec.

Postopek ocenjevanja projektov, ki ga določajo priročniki za ocenjevanje projektov, odobreni za vsak posamezni javni razpis v okviru Programa, je podrobno opisan v Letnem poročilu o izvajanju za leto 2009.

Glede ocenjevanja projektov v letu 2012 velja izpostaviti, da po zaključku postopka preverjanja formalne administrativne ustreznosti in upravičenosti standardnih projektov, predloženih v okviru javnega razpisa št. 03/2011 za standardne projekte - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju, ki je potekal v letu 2011, je v mesecih od januarja do aprila 2012 potekal postopek ocenjevanja kakovosti 119 formalno ustreznih projektnih predlogov, skladno z merili, navedenimi v javnem razpisu in določili Priročnika za ocenjevanje, ki ga je potrdil NO.

Kakovost projektnih predlogov je bila ocenjena v skladu s skupinami meril za izbor, in sicer: kakovost vsebine in ustreznost predloga (B1), kakovost čezmejnega partnerstva in vodilnega VP (B2), dodana vrednost projekta (B3), merila izbor projekta glede na posamezno prednostno nalogo (B4).

Skladno z določili priročnika, je STS pred pričetkom ocenjevanja kakovosti organiziral pripravljalne delavnice za ocenjevalce, v okviru katerih so ocenjevalci prejeli vsa potrebna navodila za izvedbo ocenjevanja. Delavnice so potekale v Trstu (19.01.2012), v Vidmu (23.01.2012) in v Ljubljani (20. in 26.01.2012).

V postopku ocenjevanja je sodelovalo skupno 69 italijanskih in slovenskih ocenjevalcev.



Za vsak projekt je bila ob zaključku postopka izdelana končna ocena in sicer skupna ocena, ki izhaja iz seštevka točk dodeljenih s strani STS in povprečja točk, dodeljenih s strani posameznih ocenjevalcev, skladno s postopki, merili in točkovnikom, navedenim v Priročniku za ocenjevanje. Pri ocenjevanju skladnosti z merili B1, B2 in B3 so sodelovali tako STS kot ocenjevalci in sicer glede na pristojnost za posamezno merilo, v skladu z obrazci, priloženimi k Priročniku za ocenjevanje. Skladnost z merili dela B4 so ocenili le ocenjevalci. STS je nato pripravil poročilo o ocenjevanju meril v svoji pristojnosti, medtem ko je bila ocena o merilih, ki jih ocenjujejo ocenjevalci, pripravljena v skladu s pravilom »ena država, en glas«, veljavnim v okviru Programa. STS je nato pripravil oceno za vsak posamezni projektni predlog na podlagi izračuna aritmetične sredine skupne italijanske in slovenske ocene, ki predstavlja končno oceno ocenjevalcev za posamezno merilo (v primeru decimalnega zapisa se zaokrožuje navzgor na prvo najbližje celo število - 4,5 --- 5). V primeru, da je bila razlika števila točk med dvema predlogoma velika (t.j. če je razlika med dvema predlogoma števila točk več kot 20% glede na skupni seštevke točk dodeljenih merilom, ki jih ocenjujejo ocenjevalci) je bilo le-to posebej predstavljeno NO.

Ob koncu postopka je STS za vsako vlogo pripravil končno oceno (Poročilo o ocenjevanju), ki je rezultat seštevka ocene STS in skupne ocene ocenjevalcev, izračunane iz aritmetične sredine, in vsebuje morebitne komentarje.

Posameznemu upravičenemu projektnemu predlogu je bilo možno dodeliti največ 100 točk (največ 35 točk za kakovost vsebine in ustreznost predloga, največ 16 točk za kakovost čezmejnega partnerstva in VP, največ 19 točk za dodano vrednost projekta, največ 30 točk za skladnost z merili za izbor projekta glede na posamezno prednostno nalogo). Upravičeni projektni predlogi so bili uvrščeni na prednostno lestvico posamezne prednostne naloge, če so prejeli najmanj 75 točk, pri čemer je bilo potrebno zbrati najmanj 50%+1 točk v vsaki posamezni skupini meril (B.1, B.2, B.3, B.4).

V primeru, da je več vlog doseglo enako število točk, so imele prednost vloge z višjim številom točk v delu »Kakovost vsebine in ustreznost predloga«; v primeru, da je imelo še vedno več vlog enako število točk, so v nadaljnjem izboru imele prednost vloge z višjim številom točk v delu »Dodana vrednost projekta«; v primeru, da je imelo več vlog še vedno enako število točk, so imele prednost vloge z najvišjim številom meril glede na posamezno prednostno nalogo. Kot zadnje merilo se je upoštevalo datum prejema vloge, pri čemer je imela prednost vloga, ki je prej prispela na navedeni naslov.

Po zaključenem ocenjevanju kakovosti vlog je posebna delovna skupina za državne pomoči, ki jo sestavljajo slovenski in italijanski ocenjevalci, preverila skladnost projektnih predlogov z zakonodajo EU s področja državnih pomoči (glej poglavje 2.2). Po zaključenem preverjanju relevantnosti za državne pomoči je STS pripravil prednostne lestvice projektov za posamezno prednostno lestvico. Prednostne lestvice za posamezne prednostne naloge javnega razpisa št. 03/2011 je NO odobril na 12. redni seji, ki je potekala 6. julija 2012 v Novi Gorici, in sicer je bilo v okviru 1. prednostne lestvice odobreno sofinanciranje 4 projektov v celoti in delno sofinanciranje 1 projekta; v okviru 2. prednostne lestvice je bilo odobreno sofinanciranje 8 projektov v celoti in delno sofinanciranje 1 projekta; v okviru 3. prednostne lestvice je bilo odobreno sofinanciranje 5 projektov v celoti in delno sofinanciranje 1 projekta. Skupno je bilo odobreno sofinanciranje 20 projektov v skupni vrednosti 15.439.726,39 EUR.

V zvezi z 2. prednostno nalogo je NO sprejel odločitev o dodelitvi preostankov sredstev Programa v višini 600.000,00 EUR za sofinanciranje dodatnih upravičenih projektov na prednostni lestvici za omenjeno prednostno nalogo javnega razpisa št. 03/2011, in sicer za sofinanciranje projektov, uvrščenih na 8. in 9. mesto končne prednostne lestvice.

Za 7 projektov, pri katerih je bila ugotovljena najmanj 20% razlika med ocenama slovenskih in italijanskih ocenjevalcev (BIMOBIS, MINA, PRATICONS, LIVINGGLADNSCAPE, ZBORZBIRK, AGRIKNOWS in ECHOS), je NO sprejel pogoje, ki so bili vključeni v Pogodbo o dotaciji sofinanciranja in posebne korektivne ukrepe za izboljšanje doseganja določenih meril v okviru projekta, vključno z morebitnimi spremembami stroškovnega načrta.

Končne prednostne lestvice so bile nato objavljene v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine št. 29 z dne 18. julija 2012 in na uradni spletni strani Programa (www.ita-slo.eu), v delu »Javni razpisi«.

Nato je OU, s pomočjo STS, posredoval prijaviteljem obvestilo o rezultatih ocenjevanja in odobritvi sofinanciranja, pridobil izjave o sprejemu sofinanciranja s strani LP delno sofinanciranih projektov, nadzoroval potek postopka sklenitve Pogodb o partnerstvu in spoštovanje roka, ki ga določa javni razpis ter pridobil potrebno dokumentacijo za sklenitev Pogodb o dotaciji sofinanciranja med OU in LP (datumi podpisa Pogodb o dotaciji sofinanciranja so navedeni v poglavju 2.1.2 tega poročila, v delu, ki se nanaša na javni razpis za standardne projekte št. 03/2011 - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju).

SISTEM SPREMLJANJA IN NADZORA

V zvezi s sistemom spremljanja in nadzora mora OU v skladu s točko c) 60. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 zagotavljati »sistem za zapis in shranjevanje računovodskih podatkov za vsako operacijo v O.P. ter zbiranje podatkov o izvajanju, ki so potrebni za finančno upravljanje, spremljanje, nadzor in vrednotenje.«

Na osnovi novih evropskih in nacionalnih določil o nadzoru in ob upoštevanju potrebe po združitvi z informacijskim sistemom italijanskega Ministrstva za gospodarstvo in finance, je OU pripravil ter nadalje razvija informacijski sistem imenovan MIS - »Spremljanje Italija-Slovenija 2007-2013«, ki omogoča posredovanje italijanskemu nacionalnemu sistemu spremljanja, s strani organov Programa, informacij in podatkov, ki jih zahteva italijanski nacionalni protokol za posredovanje enotnih podatkov spremljanja projektov v obdobju 2007-2013. Omenjeni protokol, ki vsebuje opis postopkov in pravil za posredovanje podatkov italijanskemu nacionalnemu sistemu spremljanja NSO, je razvil IGRUE - »Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea« (Glavni inšpektorat za finančne odnose z Evropsko unijo).

Sistem spremljanja in nadzora Programa, imenovan MIS, omogoča vnos vseh podatkov o finančnem, postopkovnem in fizičnem napredku sofinanciranih projektov v okviru Programa. Vsaka 2 meseca, v določenih rokih, se preko protokola za posredovanje podatkov, podatke posreduje nacionalnemu centralnemu sistemu, ki jih nato posreduje Evropski komisiji. Tak postopek zagotavlja izpolnjevanje zahtev spremljanja in nadzora, skladno s predpisi Skupnosti, ki urejajo strukturne sklade.



Razvoj sistema poteka v sodelovanju z Insiel d.o.o., notranjo družbo Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, ki uporablja izvirno kodo, izdelano za ROP ESRR »Deželna konkurenčnost in zaposlovanje 2007-2013«. Ponovna uporaba izvirne kode je povzročila določene težave pri implementaciji sistema, obenem pa je prispevala k znatnemu zmanjšanju stroškov razvoja in realizacije sistema.

Do informacijskega sistema lahko organi in operative enote Programa (OU, STS, OP, RO in FLC - slovenski in italijanski) ter vsi programski partnerji dostopajo v skladu z avtorizacijo in predhodno prijavo, kar jim omogoča različne načine uporabe (upravljanje, vnos podatkov, prikazovanje).

Sistem omogoča prikazovanje in upravljanje podatkov v italijanskem in slovenskem jeziku. Glede na jezik, izbran ob dostopu do aplikacije, se samodejno prikazujejo oznake polj ter opisni podatki. Sistem omogoča, da se glede na izbrani jezik pridobi opis za vsako posamezno polje.

STS skrbi za upravljanje in preverjanje splošnega delovanja sistema. Organom Programa posreduje informacije glede načina uporabe samega sistema, preverjanja vnesenih podatkov in posredovanja le-teh nacionalnim sistemom spremljanja. Sektor za spremljanje, ki organizacijsko pripada STS, šteje 6 oseb - od teh 4 z italijanske strani in 1 s slovenske strani, saj je od meseca decembra 2012 ena od 2 slovenskih svetovalcev za spremljanje in finance odsotna zaradi porodniškega dopusta.

Za lažji dostop in uporabo sistema je STS pripravil priročnik za uporabnike z informacijami o funkcijah informacijskega sistema in pomenu zahtevanih informacij.

Programska oprema je realizirana v razvojnem okolju odjemalec/strežnik in v spletnem okolju za funkcije, ki so na voljo uporabnikom. Za dostop se morajo uporabniki predhodno prijaviti.

Programsko opremo je mogoče dopolnjevati z drugimi podatkovnimi bazami, vzpostavljenimi znotraj Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, kar omogoča uporabo podatkov že pridobljenih s strani deželne uprave, na primer podatkov o fizičnih in pravnih osebah ali informacij o kreditnih ustanovah in državnih pomočeh. V zvezi s tem je potrebno izpostaviti, da je STS v letu 2012 posredoval RO seznam operacij, v okviru katerih je bilo italijanskim upravičencem dodeljeno sofinanciranje iz naslova »de minimis« in za katere so podatki že prisotni v informacijskem sistemu MIS. To bo omogočilo posodobitev podatkov v italijanski nacionalni bazi podatkov o državnih pomočeh, dodeljenih upravičencem po pravilu »de minimis«.

Omenjeni sistem je neposredno povezan z deželnim računovodskim sistemom »COSMO«, kar omogoča povezovanje in poenotenje v sistemu prisotnih informacij, ki se nanašajo na plačila in na prenos sredstev upravičencem (na primer v primeru datuma izvedbe plačil), ter možnost za STS in OP, da neposredno v sistemu pripravita računovodsko dokumentacijo in se s tem izogneta podvajanju dela ter se tako poenostavi administrativne postopke (na primer z aktivacijo funkcije, ki bo omogočala avtomatsko nastavitve datuma potrditve prejetja plačila za pridobljene odredbe).



Sistem zagotavlja:

- upravljanje osnovnih podatkov vseh sofinanciranih projektov v okviru Programa ter osnovnih podatkov o subjektih, ki sodelujejo pri izvajanju projektov (upravičenci, izvajalci, predstavniki organov Programa);
- upravljanje podatkov o finančnem (obveznosti in plačila), fizičnem (kazalniki realizacije in rezultatov) in proceduralnem napredku projektov, skladno s pravili o delovanju nacionalnega sistema spremljanja in delno z zahtevami preverjanja izvajanja Programa. Sistem vključuje tudi finančne podatke o izdatkih in deležih izdatkov oziroma zneskih sofinanciranja;
- upravljanje podatkov o certificiranih izdatkih;
- upravljanje podatkov o prvostopenjskih kontrolah, ki jih opravijo nacionalne prvostopenjske kontrolne enote, vključno z ugotovitvami;
- upravljanje podatkov o revizijah, ki jih opravi RO, vključno z ugotovitvami ter o kontrolah, ki jih opravi OP;
- upravljanje podatkov o nepravilnostih;
- upravljanje drugih podatkov, ki jih določa Priloga III k Uredbi Komisije (ES) št. 1828/2006;
- posredovanje podatkov, zahtevanih na nacionalni ravni in tistih, ki jih lahko zahteva Evropska komisija v skladu s Prilogo III k Uredbi Komisije (ES) št. 1828/2006.

Dostop do informacijskega sistema imajo vsi organi Programa:

- OU: STS po pooblastilu neposredno upravlja s strukturo Programa (klasifikacije, finančni načrti, itd.), s postopki preverjanja podatkov in skrbi za posredovanje podatkov preko portala IGRUE. Pooblaščen je tudi za upravljanje s podatki, ki zadevajo potrjevanje izdatkov s strani OU. Sistem se uporablja tudi za preverjanje, koordiniranje in izmenjavo podatkov o sofinanciranjih iz evropskih strukturnih skladov - npr. letno preverjanje, pridobivanje in urejanje podatkov s strani STS v zvezi z zahtevami, povezanimi s sporazumom med Deželo Furlanijo Julijsko krajino in Regionalnim odborom Finančne policije ali za druga redna preverjanja, ki jih zahteva Republika Slovenija.
- OP: ima vpogled v podatke in lahko preverja vse podatke vnesene v podatkovno bazo. Aktivno upravlja s podatki, ki so v njegovi pristojnosti (podatki o certificiranih izdatkih za posamezno operacijo, povračila ESRR sredstev VP in povračila italijanskega nacionalnega sofinanciranja italijanskim upravičencem). OP lahko izvozi podatke o izplačilih upravičencem v formatu, ki je podoben delovnemu listu in omogoča dodatno obdelavo finančnih podatkov.
- RO: ima le vpogled v podatke in lahko preverja vse podatke vnesene v podatkovno bazo. Lahko jih uporablja kot osnovo za vzorčenje operacij, ki bodo predmet revizije in lahko



vnaša podatke o opravljenih revizijah, ki bodo dostopni v informacijskem sistemu Programa;

- FLC (prvostopenjska kontrola): vnaša podatke o izvedenih kontrolah poročil, ki jih predložijo upravičenci. Potrdi in označi vse upravičene izdatke ter priloži vsa potrebna dokazila oz. dokumentacijo. Sistem se uporablja tudi za pridobivanje podatkov o izdatkih, ki so potrebni za izvedbo vzorčenja, in sicer za izvajanje kontrol na kraju samem.

Sistem je na voljo tudi slovenskemu Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), in sicer za evidentiranje izdatkov projekta tehnične pomoči, kakor tudi za vnos podatkov o slovenskih nacionalnih pogodbah in zahtevkih za izplačilo odgovarjajočih deležev sredstev slovenskim PP. Vpogled v sistem je na voljo tudi programskim partnerjem in omogoča prikazovanje informacij o sofinanciranih projektih.

Informacijski sistem zagotavlja tudi t.i. »tiskanje projekta«, ki omogoča vpogled, shranjevanje in natis povzetka stanja ter fizičnega, finančnega in postopkovnega napredka sofinanciranega projekta.

Omenjeni povzetki stanja izvajanja projekta vsebujejo informacije na ravni celotnega projekta oziroma na ravni posameznega upravičenca.

V času priprave tega poročila so v informacijskem sistemu na voljo sledeče možnosti:

- Tiskanje povzetka projekta. To je povzetek stanja, ki na ravni posameznega upravičenca navaja najpomembnejše podatke o izvajanju projektnih aktivnosti. Razdeljen je na uvodni del splošnega značaja, ki vsebuje splošne podatke o projektu, imena referentov in funkcionarjev, ki delujejo v okviru prvostopenjskih kontrolnih enot, ter vključeno programsko območje. Tehnični del vsebuje podrobnejše informacije, med drugim podatke o finančnem napredku upravičenca in informacije o podpisu Pogodb o dodelitvi sofinanciranja, v primeru slovenskih upravičencev tudi podatke o pogodbi o nacionalnem sofinanciranju, o izplačilu deleža sredstev ESRR VP s strani OP in deleža italijanskega nacionalnega sofinanciranja italijanskim upravičencem, o izplačilih slovenskega nacionalnega sofinanciranja upravičencem s strani pristojnega slovenskega ministrstva, kakor tudi podatke o fizičnih kazalnikih.
- Tiskanje celotnega projekta. To je povzetek stanja, ki vključuje poročilo o izvajanju projekta, razdeljeno na dele, ki se nanašajo na povzetek projekta, na kazalnike (kazalniki rezultatov na programski ravni, CORE kazalniki realizacije in kazalniki zaposlovanja), na predstavitev upravičenih izdatkov po kategorijah in partnerjih (VP in PP), na stanje izvajanja in napredka projekta po upravičencih (upravičeni izdatki, odobrena sredstva, prevzete obveznosti in plačila tretjim osebam, potrjeni izdatki, povrnjeni zneski in delež izvajanja). Povzetek vsebuje tudi opis stanja izvajanja projekta z navedbo bistvenih realizacij.

Funkcija je uporabna tako za STS kot za druge organe Programa, saj po eni strani omogoča analizo in preverjanje izvajanja projekta (tako na ravni posameznega upravičenca,



opredeljenega kot subjekt-projekt, kot na ravni projekta kot celote in sicer kot skupek VP in PP istega projekta), po drugi strani pa omogoča preprost in hiter pregled najpomembnejših in najzanimivejših podatkov za spremljanje razvoja projekta.

MIS je povezan z aplikacijo »Business Object«, za katero je deželna uprava pridobila licenco, in omogoča izdelavo analiz ter podrobnejših poročil na podlagi podatkov, vnesenih v sistem, kot tudi zbiranje specifičnih podatkov o napredku izvajanja Programa. Aplikacijo uporabljata OU in STS.

V letu 2012 je bilo vzpostavljeno delovanje aplikacije »GOLD-MIS« za e-poročanje, ki je namenjena upravičencem standardnih projektov. Do posameznega projekta v sistemu je mogoče dostopati z uporabniškim imenom in geslom osebe, ki je odgovorna za predložitev poročila (postopek dodelitve uporabniškega imena in gesla vodi STS). Posamezni upravičenci lahko preko spletne aplikacije vnesejo vse podatke, ki so potrebni za pripravo in predložitev poročila pristojni prvostopenjski kontrolni enoti. Do sistema dostopajo tudi prvostopenjski kontrolorji in v okviru tega zaključijo postopek preverjanja in potrditve izdatkov.

V fazi zaključevanja je tudi vzpostavitev posebne aplikacije za predložitev poročila VP, ki omogoča celoten pregled informacij in zaključuje postopek za pridobitev povračila sofinanciranja izdatkov, zajetih v predloženo poročilo.

Aplikacija bo omogočala lažje in enostavnejše vodenje navedenih postopkov in posameznih faz spremljanja podatkov, ki jih bo možno pridobiti samodejno preko aplikacije »GOLD-MIS«. Uporaba aplikacije bo obenem preprečevala izgubo in razpršitev podatkov.

Sistem MIS, opremljen s certifikatom IGRUE, omogoča posredovanje podatkov od konca meseca decembra 2009.



2.8 Nacionalna rezerva na podlagi doseženih rezultatov (kjer je primerno in le za letno poročilo o izvajanju, predloženo za leto 2010)

- Informacije opisane v 50. členu Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.

Ne ustreza.



3. Izvajanje po prednostnih nalogah

Informacije navedene v nadaljevanju veljajo za vse prednostne naloge Programa.

Na dan priprave tega poročila poteka spremljanje napredka izvajanja 87 projektov, v okviru katerih sodeluje 914 upravičencev.

Pričujoče poročilo je pripravljeno na osnovi podatkov o spremljanju 85 projektov in 893 upravičencev na dan 31.12.2012.

Podatki, ki se nanašajo na standardna projekta javnega razpisa št. 02/2009 MODEF in CAMAA, ki skupno vključujeta 21 upravičencev in za katera je bilo sofinanciranje odobreno v drugi polovici leta 2012 ter sta bili Pogodbi o dotaciji sofinanciranja podpisani v mesecu februarju 2013, bodo upoštevani v okviru analize podatkov za Letno poročilo o izvajanju 2013.

Podatke, potrebne za spremljanje izvajanja Programa po prednostnih nalogah se zbira s pomočjo posebnih obrazcev, ki jih vsak upravičenec posreduje STS in službi pristojni za izvajanje prvostopenjske kontrole v določenih rokih. Tak postopek omogoča zbiranje vseh elementov, ki zadevajo fizično, finančno in postopkovno izvajanje Programa.

V zvezi s fizičnim izvajanjem vsak upravičenec v Prijavnici izbere in predhodno kvantificira kazalnike izvajanja in kazalnike rezultatov v skladu z O.P.

V zvezi s tabelami, ki vsebujejo kazalnike fizičnih rezultatov in kazalnike fizičnih rezultatov/učinkov, velja pojasniti, da je bila ciljna vrednost za vsak posamezni kazalnik določena v fazi opredelitve O.P. in da je bila sedanja vrednost pridobljena na osnovi podatkov, ki so jih upravičenci navedli v ustreznih obrazcih.

V zvezi z metodologijo zbiranja fizičnih podatkov, na katerih temeljijo kazalniki v tabelah, prikazanih v nadaljevanju, velja pojasniti, da so bile ciljne vrednosti kazalnikov, določene v O.P., primerjane s podatki, pridobljenimi na podlagi vrednosti, ki so navedene v Prijavnicah odobrenih projektov. Analiza in opredelitev le-teh sta bili izvedeni v fazi preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti/ocenjevanja kakovosti predloženih projektnih predlogov.

V zvezi s finančnim izvajanjem velja pojasniti, da so bili podatki o prevzetih obveznostih zbrani s pomočjo posebnih obrazcev. Podatke o plačilih pa je možno pridobiti iz obrazcev za poročanje. Kar zadeva finančno izvajanje, trenutno poteka preverjanje najustreznejše možnosti, ki bi omogočala, da bi tudi upravičenci uporabljali informacijski sistem spremljanja in vnašali potrebne podatke.

Po zaključenem zbiranju podatkov, STS vse pridobljene podatke sistemizira in vnese v informacijski sistem. Informacijski sistem omogoča obdelavo podatkov skladno z analizami, ki so potrebne za spremljanje poteka izvajanja projekta.

Kot opisano v prejšnjih poglavjih trenutno poteka obdelava podatkov za pripravo:

- finančnih poročil, v skladu z določbami 3. odstavka 9. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, pripravljenih na podlagi povezave finančnih podatkov odobrenih projektov s kategorijami izdatkov, navedenimi v Prilogi IV omenjene Uredbe;
- poročil, ki opisujejo razporeditev sredstev po različnih programskih območjih glede na vrsto upravičenca (javni, zasebni, MSP, ipd.), opredeljeno v klasifikaciji gospodarskih dejavnosti



ATECO ali glede na katerikoli drugi podatek naveden v delu Prijavnice, ki se nanaša na splošne podatke;

- poročil o napredku izvajanja projekta, ki temeljijo na spremljanju kazalnikov realizacije in kazalnikov rezultatov, s primerjavo začetnih vrednosti s končnimi vrednostmi, predvidenimi v okviru projekta, z doseženimi ob zaključku referenčnega leta, s predvidenimi ob zaključku prihodnjega leta in s skupnimi vrednostmi, predvidenimi na ravni Programa.

Spremljanje projektov poteka tudi z vidika doseganja pričakovanih rezultatov, ki jih prijavitelji opišejo v Prijavnici. Tak način spremljanja se izvaja vsakič, ko upravičenec predloži zahtevek za izplačilo, h kateremu priloži poročilo o izvajanju projekta glede na predvidene cilje, pričakovane rezultate in prvotno predvidene aktivnosti.

Za potrebe analize črpanja sredstev v skladu z 2. odstavkom 34. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 se podatki zbirajo ob vsakem poročilu, ki ga predloži upravičenec. Vsak upravičenec mora namreč predložiti izjavo s seznamom izdatkov, ki se sofinancirajo iz ESRR. Ti zneski so nato predmet sistemizacije in spremljanja.

V zvezi z oceno prispevka projekta k enakim možnostim med spoloma in k okoljski trajnosti je v Prijavnici predviden poseben del, ki ga prijavitelj/upravičenec izpolni ob predložitvi vloge za sofinanciranje projektnega predloga. Upravičenec navede na kakšen način projekt vpliva na cilja enakih možnosti in nediskriminacije ter na okoljsko trajnost, skladno z določili O.P.

V zvezi z vplivom projekta na načelo enakih možnosti in nediskriminacije je določen kazalnik kakovosti, ki predvideva:

- zelo pozitiven vpliv;
- pozitiven vpliv;
- nevtralen vpliv.

V zvezi s prispevkom projekta k okoljski trajnosti je ravno tako predviden:

- zelo pozitiven vpliv;
- pozitiven vpliv;
- nevtralen vpliv.

Kazalnika se nato vnese v informacijski sistem spremljanja, kar omogoča ocenjevanje vpliva na spodbujanje enakih možnosti in na okoljsko trajnost na ravni Programa.

Tabele v nadaljevanju vsebujejo podatke o obeh kazalnikih glede na celotno število sofinanciranih projektov (85 projektov na dan 31.12.2012) po posamezni prednostni nalogi.



Vpliv na cilja enakih možnosti in nediskriminacije ter na okoljsko trajnost na ravni Programa (projekti, sofinancirani v okviru prednostnih nalog 1, 2 in 3).

ENAKE MOŽNOSTI		OKOLJSKA TRAJNOST	
Vpliv	Št. projektov	Vpliv	Št. projektov
Zelo pozitivno	49	Zelo pozitivno	61
Pozitivno	28	Pozitivno	23
Nevtralno	8	Nevtralno	1
	85		85

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o sofinanciranih projektih

Vpliv na cilja enakih možnosti in nediskriminacije ter na okoljsko trajnost na ravni Programa (projekti, sofinancirani v okviru prednostne naloge 1).

ENAKE MOŽNOSTI		OKOLJSKA TRAJNOST	
Vpliv	Št. projektov	Vpliv	Št. projektov
Zelo pozitivno	11	Zelo pozitivno	26
Pozitivno	14	Pozitivno	4
Nevtralno	5	Nevtralno	0
	30		30

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o sofinanciranih projektih

Vpliv na cilja enakih možnosti in nediskriminacije ter na okoljsko trajnost na ravni Programa (projekti, sofinancirani v okviru prednostne naloge 2).

ENAKE MOŽNOSTI		OKOLJSKA TRAJNOST	
Vpliv	Št. projektov	Vpliv	Št. projektov
Zelo pozitivno	21	Zelo pozitivno	21
Pozitivno	6	Pozitivno	9
Nevtralno	3	Nevtralno	0
	30		30

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o sofinanciranih projektih

Vpliv na cilja enakih možnosti in nediskriminacije ter na okoljsko trajnost na ravni Programa (projekti, sofinancirani v okviru prednostne naloge 3).

ENAKE MOŽNOSTI		OKOLJSKA TRAJNOST	
Vpliv	Št. projektov	Vpliv	Št. projektov
Zelo pozitivno	17	Zelo pozitivno	14
Pozitivno	8	Pozitivno	10
Nevtralno	0	Nevtralno	1
	25		25

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o sofinanciranih projektih



Predvideno je tudi polje, v katerega upravičenci vnesejo podrobnejši opis (največ 20 vrstic) vpliva projekta na zgoraj omenjene cilje, z navedbo specifičnega odraza na območje in področja na katera se projekt nanaša.



3.1 Prednostna naloga 1: Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija

3.1.1 Doseganje ciljev in analiza napredka

Podatki o fizičnem napredku prednostne naloge

- Za vsak izmerjen kazalnik, s posebnim poudarkom na osrednje kazalnike:

- Kumulativni rezultat; vrednost kazalnika mora biti enaka skupni vrednosti pridobljeni na koncu leta poročanja.
- Rezultate za prejšnja leta se lahko dopolni v letnih poročilih o izvajanju za naslednja leta, v primerih ko so na voljo podrobnejše informacije.
- Cilj je mogoče navesti za določeno leto ali za celotno programsko obdobje.
- Navede se le za prvo leto, če so informacije na voljo, razen v primerih, ko se uporablja načelo dinamične reference.

- Vse kazalnike je potrebno razčleniti glede na vrsto, kjer je mogoče. V primerih, ko podatki še niso na voljo, se jasno navede, kdaj bodo na voljo in kdaj jih bo organ upravljanja predložil Komisiji.

V spodnji tabeli so navedeni kazalniki, ki se nanašajo na prednostno nalogo 1, na dan 31.12.2012. Podatki se nanašajo na 30 projektov, sofinanciranih v okviru prednostne naloge 1.

KAZALNIK FIZIČNIH REZULTATOV (PREDNOSTNA NALOGA 1)	Cilj	Vrednost	Enota	Opis enote
1A - Projekti za varovanje in upravljanje okolja	20	28	število	število projektov
1B - Projekti za preprečevanje in zmanjšanje naravnih in tehnoloških nesreč	6	9	število	število projektov
1C - Projekti, ki spodbujajo energetska učinkovitost in rabo obnovljivih energijskih virov	6	7	število	število projektov
1D - Projekti, usmerjeni v izboljšanje koordinacije in dostopnosti do transportnih in komunikacijskih sistemov	10	8	število	število projektov
1E - Projekti, usmerjeni v razvoj trajnostne mobilnosti	8	9	število	število projektov



KAZALNIKI REZULTATOV/UČINKOV (PREDNOSTNA NALOGA 1)	Cilj	Vrednost	Enota	Opis enote
1F - Število občin/javnih teles, vključenih v zmanjševanje porabe energije in promocijo pobud rabe obnovljivih energetskega virov	20	111	število	število občin/javnih teles
1G1 - Površina programskega območja, vključena v okoljske projekte (delež celotnega programskega območja)	več kot 10%	100%*	%	delež celotnega programskega območja
1G2 - Površina programskega območja, vključena v okoljske projekte (delež zavarovanih območij programskega območja)	25%	100%*	%	delež zavarovanih območij programskega območja
1H - Trajna partnerstva (trajajoča več kot dve leti po koncu projektov) v sektorjih upravljanja naravnih virov, preprečevanje nesreč, transporta in energije	5	56	število	število

Iz navedenih podatkov izhaja, da vrednosti skoraj vseh kazalnikov rezultatov/učinkov presegajo ciljne vrednosti, določene v okviru Programa.

*Veliko število upravičencev je izbralo in vrednotilo oba kazalnika ter navedlo, da je delež programskega območja, na katerem se izvajajo okoljski projekti enak 100%. Posledično lahko trdimo, da se na celotnem programskem območju izvajajo projekti z okoljskimi vsebinami.



Kakovostna analiza

- Analiza dosežkov, pri kateri se upošteva finančne podatke (točka 2.1.2.) in kazalnike (točka 3.1.1.) ter druge ustrezne podatke.
- Ustrezen prikaz učinkov spodbujanja enakih možnosti med moškimi in ženskami (če je ustrezno).
- Analiza uporabe sredstev iz 2. odstavka 34. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. Za programe financirane iz ESS navesti informacije zahtevane v 10. členu Uredbe (ES) št. 1081/2006.
- Seznam nedokončanih projektov s predvidenim datumom zaključka (le za zaključno poročilo).

Finančni napredek projektov, sofinanciranih v okviru prednostne naloge 1, na dan 31.12.2012

Prednostna naloga	Javni razpis	Odobrena vrednost projektov v € (A)	Prevzete obveznosti v € (B)	Zahtevani in potrjeni izdatki v € (C)	% prevzetih obveznosti (B/A)	% porabe sredstev (C/A)
1	Javni razpis št. 01/2009	19.554.944,51	13.134.020,84	7.082.960,99	67,16%	36,22%
1	Javni razpis št. 02/2009	23.453.440,00	4.902.606,12	1.828.198,04	20,90%	7,80%
1	Javni razpis št. 03/2011	7.629.248,49	-	-		
Skupaj - Prednostna naloga 1		50.637.633,00	13.036.626,96	8.911.159,03	36,62%	17,60%

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o sofinanciranih projektih

V okviru prednostne naloge 1 vrednost dodeljenih sredstev znaša več kot 50,5 milijonov EUR, t.j. 39,53%, od skupno 128 milijonov sredstev dodeljenih na ravni Programa za sofinanciranje vseh projektov prenostnih nalog 1, 2 in 3.

Odstotek porabe sredstev v okviru prednostne naloge 1 (skupno za vse tri javne razpise) znaša 17,60% glede na skupno vrednost sredstev, dodeljenih vsem trem prednostnim nalogam. Odstotek prevzetih obveznosti pa presega 35%. Poraba sredstev v okviru izvajanja strateških projektov je 36,22%. Odstotek prevzetih obveznosti s strani upravičencev znaša 67,16%. Ob upoštevanju zamud, ki so nastale pri zaključevanju postopkov sklenitve Pogodb o dotaciji sofinanciranja za posamezne projekte, sofinancirane v okviru javnega razpisa št. 02/2009, lahko trdimo, da je poraba standardnih projektov v višini skoraj 8% glede na celotna razpoložljiva sredstva omenjene prednostne naloge zadovoljiva. Dober je tudi odstotek prevzetih obveznosti, ki znaša skoraj 21%.

V nadaljevanju sledi opis projekta, sofinanciranega v okviru Prednostne naloge 1 - »Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija«, kot primer dobre prakse:

Naslov projekta: CLIMAPARKS - Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij

Datum pričetka projekta: maj 2010



Datum zaključka projekta: oktober 2013

Odobreni izdatki: 3.239.513,01 EUR

Dežela / Statistična regija: Udine, Pordenone, Venezia, Ferrara, Ravenna, Obalno-Kraška, Goriška, Gorenjska

Tipologija projekta: projekt, sofinanciran v okviru Javnega razpisa za predložitev strateških projektov št. 01/2009

Vodilni partner: Javni zavod Triglavski narodni park

Projektni partnerji:

Javni zavod Krajinski park Strunjan

SOLINE Pridelava soli, d.o.o.

Javni zavod Park Škocjanske jame

Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie

Ente Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane

Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po

Provincia di Ravenna

Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversita - Delta del Po

Opis: V projektu CLIMAPARKS sodeluje devet partnerjev - 4 slovenski in 5 italijanskih parkov. Projekt vodi Triglavski narodni park. Slovenski in italijanski parki bodo v projektu raziskovali in ozaveščali o klimatskih spremembah, ohranjanju biodiverzitete in trajnostnem odnosu do okolja v dotičnih zavarovanih območjih kot tudi v svetu nasploh. Vzpostavljena bo dolgoročna mreža informacijskih postaj, prek katerih bo mogoče primerjati podatke med parki. Slovenski in italijanski parki bodo v sodelovanju okrepili ozaveščanje o pomenu odgovornega odnosa do naravnega okolja (informacijski centri, izobraževalni programi). S pilotnimi projekti bodo tudi parki sami razvijali okolju prijazne načine obiskovanja varovanih območij. V slovensko-italijanskem sodelovanju so zastopane primorska (severno-jadranska), kraška in gorska (alpska) regija.

Aktivnosti: Koordinacija projekta: intenzivno sodelovanje med devetimi parki pri izvajanju različnih projektnih nalog bo pripomoglo k izmenjavi dobrih praks ter krepitvi sodelovanja med Slovenijo in Italijo. Monitoring in analize: z vzpostavitvijo skupne merilne in opazovalne mreže, katere podatke bo mogoče spremljati prek spleta, si v parkih obetajo predvsem dobro osnovo za izdelavo primerjalnih analiz. Te bo prvič mogoče opravljati v tem območju znotraj posameznih parkov in med njimi. Parki kot primeri dobrih praks: po vzoru obstoječih primerov dobre prakse bodo parki izvedli pilotne projekte s področja trajnostnega upravljanja zavarovanih območij. Na ta način bodo razvijali okolju prijazno obiskovanje parkov, hkrati pa služili kot vzorčni primeri za osveščanje zainteresirane javnosti. Trajnostno obiskovanje in ozaveščanje (mreža info centrov): vsi sodelujoči parki bodo obiskovalcem predstavljali podnebne spremembe, pomen ohranjanja biodiverzitete ter možnosti ukrepanja posameznika za bolj odgovoren odnos do okolja. Vzpostavljene bodo informativne in izobraževalne aktivnosti o podnebnih spremembah, biodiverziteti, trajnostnem ravnanju in okoljskih problemih nasploh, namenjene obiskovalcem in drugim ciljnim skupinam. Komunikacijska strategija: parki bodo pripravili vrsto skupnih aktivnosti na področju komuniciranja. Okrepili bodo aktivnosti znotraj parkov - predvsem tiste,

ki so namenjene ozaveščanju obiskovalcev.

Rezultati: Vzpostavljena ali poglobljena trajna partnerstva med parki v Italiji in Sloveniji. Vzpostavljeni dolgoročni in primerljivi sistemi monitoringa podnebnih sprememb, biodiverzitete in tokov obiskovalcev parkov. Vzpostavljena mreža informacijskih točk s projektnimi vsebinami. Vzpostavljen in nadgrajene izobraževalne aktivnosti in aktivnosti ozaveščanja javnosti o podnebnih spremembah, biodiverziteti in okoljskih tematikah nasploh. Izvedeni pilotni projekti s področja trajnostnega upravljanja zavarovanih območij, ki bodo kot primeri dobre prakse dostopni zainteresirani javnosti. Izvedene komunikacijske aktivnosti: dve konferenci, strokovna in poljudna publikacija, spletne strani, objave v medijih idr.



3.1.2 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

- Informacije o večjih težavah, ki so nastopile pri izvajanju prednostne naloge, vključno s povzetkom resnih težav, določenih pri postopku iz člena 62(1)(d)(i) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, kjer je to primerno, in ukrepi, ki jih je sprejel organ upravljanja ali nadzorni odbor, da težave odpravi.

V letu 2012 ni bilo ugotovljenih večjih težav pri izvajanju prednostne naloge 1. Kljub temu so bila ugotovljena odstopanja in zamude pri pričetku izvajanja nekaterih aktivnosti, predvsem v zvezi s standardnimi projekti, za katere je obdobje podpisovanja Pogodb o dotaciji sofinanciranja trajalo dlje časa.

Vsi vključeni upravičenci si prizadevajo za hitrejšo izvajanje aktivnosti, da bi nadoknadili nastalo zamudo.

V zvezi z javnim razpisom za predložitev strateških projektov št. 01/2009 velja izpostaviti, da so projekti dosegli vrhunec izvajanja, saj so upravičenci v letu 2012 pospešeno izvajali projektne aktivnosti. Veliko VP je predložilo prošnjo za podaljšanje izvajanja projektnih aktivnosti in tako preložilo datum zaključka projekta za nekaj mesecev, z namenom učinkovitejšega doseganja ciljev in rezultatov projekta.

V zvezi z javnim razpisom št. 02/2009 za predložitev standardnih projektov, kljub zamudam, ki so nastale pri postopku sklepanja Pogodb o dotaciji sofinanciranja za posamezne projekte, so upravičenci že ob samem začetku pričeli s pospešenim izvajanjem aktivnosti, kar je prispevalo k doseganju znatnega odstotka porabe sredstev.

V zvezi z javnim razpisom za predložitev standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 so se v letu 2012 pričeli in zaključili postopki sklenitve vseh 20 Pogodb o dotaciji sofinanciranja med OU in VP za posamezne projekte, kar bo omogočilo hitrejši pričetek izvajanja projektnih aktivnosti in črpanja sredstev.

Pri upravičencih še vedno prisotne določene težave v povezavi z načrtovanjem aktivnosti, kar je deloma posledica spoštovanja pravil in omejitev, ki jih določajo postopki javnega naročanja.

Po drugi strani pomanjkanje izkušenj upravičencev pri vodenju zelo kompleksnih projektov, kot so projekti programskega obdobja 2007-2013, kakor tudi formalistični in birokratski postopki upravljanja projektov, so vplivali na dejanski pričetek izvajanja aktivnosti.

Glede na ugotovljene težave je OU, s pomočjo STS, uvedel številne ukrepe, namenjene zagotavljanju pravilnega in pravočasnega izvajanja načrtovanih aktivnosti, kot na primer: redna srečanja z VP vseh projektov, z namenom spremljanja poteka projektnih aktivnosti in obravnave ključnih ugotovljenih težav; izobraževalne delavnice za upravičence s področja javnega naročanja; poenostavitev postopkov vodenja projektov, v skladu z veljavnimi predpisi.



3.2 Prednostna naloga 2: Konkurenčnost in na znanju temelječa družba

3.2.1 Doseganje ciljev in analiza napredka

Podatki o fizičnem napredku prednostne naloge

- Za vsak izmerjen kazalnik, s posebnim poudarkom na osrednje kazalnike:

- Kumulativni rezultat; vrednost kazalnika mora biti enaka skupni vrednosti pridobljeni na koncu leta poročanja.
- Rezultate za prejšnja leta se lahko dopolni v letnih poročilih o izvajanju za naslednja leta, v primerih ko so na voljo podrobnejše informacije.
- Cilj je mogoče navesti za določeno leto ali za celotno programsko obdobje.
- Navede se le za prvo leto, če so informacije na voljo, razen v primerih, ko se uporablja načelo dinamične reference.

- Vse kazalnike je potrebno razčleniti glede na vrsto, kjer je mogoče. V primerih, ko podatki še niso na voljo, se jasno navede, kdaj bodo na voljo in kdaj jih bo organ upravljanja predložil Komisiji.

V spodnji tabeli so navedeni kazalniki, ki se nanašajo na prednostno nalogo 2, na dan 31.12.2012. Podatki se nanašajo na 30 projektov, sofinanciranih v okviru omenjene prednostne naloge.

KAZALNIKI FIZIČNIH REZULTATOV (PREDNOSTNA NALOGA 2)	Cilj	Vrednost	Enota	Opis enote
2A - Projekti čezmejnega poslovnega sodelovanja in promocije	30	24	število	število projektov
2B - Projekti, usmerjeni v podpiranje procesa internacionalizacije podjetij	10	10	število	število projektov
2C - Projekti, izvedeni v turističnem sektorju	15	12	število	število projektov
2D - Projekti raziskav in razvoja, ki vključujejo raziskovalne centre, univerze in podjetja	20	20	število	število projektov
2E - Projekti usposabljanja (poklicno, profesionalno, vseživljenjsko učenje)	25	16	število	število projektov
2F - Projekti podjetij in drugih privatnih subjektov, ki zaposlujejo večinoma ženske	10%	0	%	delež v odstotkih glede na skupno število podjetij



KAZALNIK REZULTATOV/UČINKOV (PREDNOSTNA NALOGA 2)	Cilj	Vrednost	Enota	Opis enote
2G - Podjetja, vključena v čezmejno sodelovanje	60	215	število	število sporazumov o sodelovanju
2H - Razvoj čezmejnih RTR projektov s strani raziskovalnih centrov in podjetij	40	154	število	število vključenih organizacij
2I - Ustvarjene mreže v sektorju turizma	5	6	število	število
2L - Ljudje, ki so našli službo zaradi čezmejnega projekta usposabljanja	50	36	število	število
2M - Izvedene čezmejne mreže za poklicno usposabljanje	5	6	število	število

Iz navedenih podatkov izhaja, da vrednosti skoraj vseh kazalnikov rezultatov/učinkov presegajo ciljne vrednosti, določene v okviru Programa.

Kakovostna analiza

- Analiza dosežkov, pri kateri se upošteva finančne podatke (točka 2.1.2.) in kazalnike (točka 3.1.1.) ter druge ustrezne podatke.
- Ustrezen prikaz učinkov spodbujanja enakih možnosti med moškimi in ženskami (če je ustrezno).
- Analiza uporabe sredstev iz 2. odstavka 34. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. Za programe financirane iz ESS navesti informacije zahtevane v 10. členu Uredbe (ES) št. 1081/2006.
- Seznam nedokončanih projektov s predvidenim datumom zaključka (le za zaključno poročilo).

Finančni napredek projektov, sofinanciranih v okviru prednostne naloge 2, na dan 31.12.2012

Prednostna naloga	Javni razpis	Odobrena vrednost projektov v € (A)	Prevzete obveznosti v € (B)	Zahtevani in potrjeni izdatki v € (C)	% prevzetih obveznosti (B/A)	% porabe sredstev (C/A)
2	Javni razpis št. 01/2009	15.235.859,50	8.765.377,54	6.710.038,11	57,53%	44,04%
2	Javni razpis št. 02/2009	17.519.163,52	5.333.443,41	2.152.792,79	30,44%	12,29%
2	Javni razpis št. 03/2011	6.411.210,50	-	-		
Skupaj - Prednostna naloga 2		39.166.233,52	14.098,820,95	8.862.830,90	36,00%	22,63%

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o sofinanciranih projektih

V okviru prednostne naloge 2 vrednost dodeljenih sredstev znaša nekaj več kot 39 milijonov EUR, t.j. 30,58%, od skupnih 128 milijonov sredstev dodeljenih na ravni Programa za sofinanciranje projektov prednostnih nalog 1, 2 in 3.

Upoštevajoč vse tri javne razpise, je odstotek porabe sredstev v okviru prednostne naloge 2 (presega 22%), glede na skupno vrednost dodeljenih sredstev, najvišji v primerjavi z ostalima dvema prednostnima nalogama. Tudi visok odstotek prevzetih obveznosti (36%) nakazuje na pomemben napredek pri izvajanju projektov druge prednostne naloge. Poraba sredstev za izvajanje strateških projektov znaša 44,04%, odstotek prevzetih obveznosti pa nekaj manj kot 58%. Ob upoštevanju zamud, ki so nastale pri zaključevanju postopkov sklenitve Pogodb o dotaciji sofinanciranja za posamezne projekte, sofinancirane v okviru javnega razpisa št. 02/2009, lahko trdimo, da je tudi poraba standardnih projektov, ki presega 12% vseh razpoložljivih sredstev omenjene prednostne naloge, zadovoljiva. Dober je tudi odstotek prevzetih obveznosti s strani upravičencev v okviru javnega razpisa št. 02/2009, ki znaša 30,44%.

V nadaljevanju sledi opis projekta, sofinanciranega v okviru Prednostne naloge 2 - »Konkurenčnost in na znanju temelječa družba«, kot primer dobre prakse:

Naslov projekta: SLOWTOURISM - Valorizacija in promocija turističnih "slow" poti med Italijo in Slovenijo

Datum pričetka projekta: maj 2010

Datum zaključka projekta: november 2013

Odobreni izdatki: 3.815.700,00 EUR

Dežela / Statistična regija: Trieste, Udine, Treviso, Venezia, Rovigo, Ferrara, Ravenna, Goriška, Osrednjeslovenska, Gorenjska

Tipologija projekta: projekt, sofinanciran v okviru Javnega razpisa za predložitev strateških projektov št. 01/2009

Vodilni partner: DELTA 2000 SOC. CONS. A R.L.

Projektni partnerji:

Provincia di Rovigo

Triglavski narodni park

Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po

Provincia di Ravenna

Provincia di Ferrara

GAL Polesine Delta Po

GAL dell'Alta Marca Trevigiana

GAL Terre di Marca

BSC poslovno podporni center d.o.o. Kranj

Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod



Provincia di Venezia
Provincia di Udine
GAL Venezia Orientale - VEGAL
Občina Bled
Občina Bohinj
Občina Gorenja vas-Poljane
Občina Jesenice
Občina Kobarid
Občina Kranjska Gora
Občina Radovljica
Občina Žiri
Regione Emilia-Romagna
Associazione nautica "Nautisette"
Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversita - Delta del Po
Spirit Slovenia, javna agencija
Dipartimento di Scienze dell'Uomo, Università degli studi di Trieste
Comune di Ravenna

Opis: Oblikovanje nove turistične ponudbe na italijanskih in slovenskih območjih, ki jih zaznamujejo dragoceni naravoslovni elementi in voda preko razvijanja oblik "počasnega" turizma, ki poudarja trajnost, odgovornost in sonaravnost.

"Slow tourism" je nova filozofija potovanja, ki bo povezala slovenska in italijanska območja v obliki «počasnega in kakovostnega» turizma in bo prispevala k krepitvi ponudbe Zgornjega Jadrana, ki ima edinstvene značilnosti na mednarodni ravni.

Aktivnosti: organizacija čezmejne mreže "Slow tourism", ki bo vključevala vsaj 20 operaterjev za vsako turistično "slow" pot; uveljavitev naravnih-eko turističnih produktov iz italijanskega in slovenskega območja na evropskih in azijskih trgih; organi in društva, ki delujejo na področju turizma, in ki so prisotni v partnerstvu bodo jamčili nadaljevanje prodajnih aktivnosti produktov in turističnih "slow" paketov tudi po zaključku projekta.

Projekt bo zagotovil turistično ponubo skozi celotno sezono na določenem območju. Z vključitvijo šol bomo dosegli večjo razširjenost "slow" filozofije in s tem ekoturizma tako, da se bo povečalo zavedanje pomembnosti mladih generacij do okoljskih in naravnih virov, ki so specifični za omenjeno čezmejno območje.

Rezultati: 10% povečanje turističnega pritoka izven projektne območja; 5% povečanje novo zaposlenih v sektorju naravnega-ekoturizma; 5% povečanje ekonomske dejavnosti v zvezi s podeželskimi in ekološkimi turističnih produktih; 10% povečanje prihodkov iz evropskih in azijskih trgov na italijanskem in slovenskem "slow" območju; 5% povečanje turističnih paketov v zvezi s slovenskimi in italijanskimi turističnimi "slow" potmi, ki so vključene v kataloge turističnih operaterjev specializiranih za trajnostni ekološki turizem.



3.2.2 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

- Informacije o kakršnih koli večjih težavah, ki so nastopile pri izvajanju prednostne naloge, vključno s povzetkom resnih težav, določenih pri postopku iz člena 62(1)(d)(i) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, kjer je to primerno, in ukrepi, ki jih je sprejel organ upravljanja ali nadzorni odbor, da težave odpravi

V letu 2012 ni bilo ugotovljenih večjih težav pri izvajanju prednostne naloge 2. Kljub temu so bila ugotovljena odstopanja in zamude pri pričetku izvajanja določenih aktivnosti, predvsem v zvezi s standardnimi projekti, za katere je obdobje podpisovanja Pogodb o dotaciji sofinanciranja trajalo dlje časa.

Vsi vključeni upravičenci si prizadevajo za hitrejšo izvajanje aktivnosti, da bi nadoknadili nastalo zamudo.

V zvezi z javnim razpisom za predložitev strateških projektov št. 01/2009 velja izpostaviti, da so projekti dosegli vrhunec izvajanja, saj so upravičenci v letu 2012 pospešeno izvajali projektne aktivnosti. Veliko VP je predložilo prošnjo za podaljšanje izvajanja projektnih aktivnosti in tako preložilo datum zaključka projekta za nekaj mesecev, z namenom učinkovitejšega doseganja ciljev in rezultatov projekta.

V zvezi z javnim razpisom št. 02/2009 za predložitev standardnih projektov, kljub zamudam, ki so nastale pri postopku sklepanja Pogodb o dotaciji sofinanciranja za posamezne projekte, so upravičenci že ob samem začetku pričeli s pospešenim izvajanjem aktivnosti, kar je prispevalo k doseganju znatnega odstotka porabe sredstev.

V zvezi z javnim razpisom za predložitev standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 so se v letu 2012 pričeli in zaključili postopki sklenitve vseh 20 Pogodb o dotaciji sofinanciranja med OU in VP za posamezne projekte, kar bo omogočilo hitrejši pričetek izvajanja projektnih aktivnosti in črpanja sredstev.

Pri upravičencih so bile ugotovljene določene težave v povezavi z načrtovanjem aktivnosti, kar je deloma posledica spoštovanja pravil in omejitev, ki jih določajo postopki javnega naročanja.

Po drugi strani pomanjkanje izkušenj upravičencev pri vodenju zelo kompleksnih projektov, kot so projekti programskega obdobja 2007-2013, kakor tudi formalistični in birokratski postopki upravljanja projektov, so vplivali na dejanski pričetek izvajanja aktivnosti.

Glede na ugotovljene težave je OU, s pomočjo STS, uvedel številne ukrepe, namenjene zagotavljanju pravilnega in pravočasnega izvajanja načrtovanih aktivnosti, kot na primer: redna srečanja z VP vseh projektov, z namenom spremljanja poteka projektnih aktivnosti in obravnave ključnih ugotovljenih težav; izobraževalne delavnice za upravičence s področja javnega naročanja; poenostavitev postopkov vodenja projektov, v skladu z veljavnimi predpisi.



3.3 Prednostna naloga 3: Socialna integracija

3.3.1 Doseganje ciljev in analiza napredka

Podatki o fizičnem napredku prednostne naloge

- Za vsak izmerjen kazalnik, s posebnim poudarkom na osrednje kazalnike:

- Kumulativni rezultat; vrednost kazalnika mora biti enaka skupni vrednosti pridobljeni na koncu leta poročanja.
- Rezultate za prejšnja leta se lahko dopolni v letnih poročilih o izvajanju za naslednja leta, v primerih ko so na voljo podrobnejše informacije.
- Cilj je mogoče navesti za določeno leto ali za celotno programsko obdobje.
- Navede se le za prvo leto, če so informacije na voljo, razen v primerih, ko se uporablja načelo dinamične reference.

- Vse kazalnike je potrebno razčleniti glede na vrsto, kjer je mogoče. V primerih, ko podatki še niso na voljo, se jasno navede, kdaj bodo na voljo in kdaj jih bo organ upravljanja predložil Komisiji.

V nadaljevanju sledi tabela s kazalniki, ki se nanašajo na prednostno nalogo 3, na dan 31.12.2012. Podatki se nanašajo na 25 projektov, sofinanciranih v okviru omenjene prednostne naloge.

KAZALNIK FIZIČNIH REZULTATOV (PREDNOSTNA NALOGA 3)	Cilj	Vrednost	Enota	Opis enote
3A - Projekti za oblikovanje in razvoj mrež med univerzami, šolami, raziskovalnimi centri in mediji	10	20	število	število projektov
3B - Projekti na področju kulture	75	17	število	število projektov
3C - Projekti na področju zdravja in socialnega sektorja	15	6	število	število projektov
3D - Vključene kulturne, socialne in zdravstvene strukture	30	80	število	število
KAZALNIK REZULTATOV/UČINKOV (PREDNOSTNA NALOGA 3)	Cilj	Vrednost	Enota	Opis enote
3E - Univerze in šole, povezane z mrežami	50	229	število	število
3F - Skupna uporaba kulturne infrastrukture	25	30	število	število
3G - Udeleženci kulturnih dogodkov	5.000	5000	število	število

Za skoraj vse kazalnike rezultatov/učinkov navedene vrednosti presegajo ciljne vrednosti, določene v okviru Programa. Izjemo predstavljata kazalnika »3B - Projekti na področju kulture«



in »3C - Projekti na področju zdravja in socialnega sektorja«, za katera so bile ciljne vrednosti določene na podlagi podatkov, ki so bili pridobljeni na osnovi izkušnje predhodnega programskega obdobja, v okviru katerega sta bili tematiki obravnavani s strani številnih projektov nižje vrednosti. Število sofinanciranih projektov, ki se uvrščajo v omenjeni tematiki je zato nižje od predvidene vrednosti.

Kakovostna analiza

- Analiza dosežkov, pri kateri se upošteva finančne podatke (točka 2.1.2.) in kazalnike (točka 3.1.1.) ter druge ustrezne podatke.
- Ustrezen prikaz učinkov spodbujanja enakih možnosti med moškimi in ženskami (če je ustrezno).
- Analiza uporabe sredstev iz 2. odstavka 34. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. Za programe financirane iz ESS navesti informacije zahtevane v 10. členu Uredbe (ES) št. 1081/2006.
- Seznam nedokončanih projektov s predvidenim datumom zaključka (le za zaključno poročilo).

Finančni napredek projektov, sofinanciranih v okviru prednostne naloge 3, na dan 31.12.2012

Prednostna naloga	Javni razpis	Odobrena vrednost projektov v € (A)	Prevzete obveznosti v € (B)	Zahtevani in potrjeni izdatki v € (C)	% prevzetih obveznosti (B/A)	% porabe sredstev (C/A)
3	Javni razpis št. 01/2009	16.156.000,07	7.247.610,47	5.111.182,25	44,86%	31,64%
3	Javni razpis št. 02/2009	18.000.000,00	4.051.468,20	2.226.638,87	25,01%	12,37%
3	Javni razpis št. 03/2011	4.123.925,00	-	-		
Skupaj - Prednostna naloga 3		38.279.925,07	11.749.078,67	7.337.821,12	30,96%	19,17%

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o sofinanciranih projektih

V okviru prednostne naloge 3 vrednost dodeljenih sredstev znaša 38.279.925,07 EUR, t.j. 29,89% od skupnih 128 milijonov sredstev dodeljenih na ravni Programa za sofinanciranje projektov prednostnih nalog 1, 2 in 3.

Upoštevajoč vse tri javne razpise, je odstotek porabe sredstev v okviru prednostne naloge 3 19,17%, odstotek prevzetih obveznosti pa znaša 30,96% glede na skupno vrednost sredstev, dodeljenih vsem trem prednostnim nalogam. Poraba sredstev za izvajanje strateških projektov je skoraj 32%, odstotek prevzetih obveznosti pa skoraj 45%. Ob upoštevanju zamud, ki so nastale pri zaključevanju postopkov sklenitve Pogodb o dotaciji sofinanciranja za posamezne projekte, sofinancirane v okviru javnega razpisa št. 02/2009, lahko trdimo, da je poraba standardnih projektov, ki presega 12%, zadovoljiva. Zadovoljiv je tudi odstotek prevzetih obveznosti glede na celotna razpoložljiva sredstva omenjene prednostne naloge, ki znaša 25,01%.



V nadaljevanju sledi opis projekta, sofinanciranega v okviru Prednostne naloge 3 - »Socialna integracija«, kot primer dobre prakse:

Naslov projekta: P.E.S.C.A. - Projekt o vzgoji za zdravo prehrano

Datum pričetka projekta: september 2011

Datum zaključka projekta: september 2014

Odobreni izdatki: 954.000,00 EUR

Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Venezia, Padova, Ravenna, Obalno-Kraška, Goriška, Osrednjeslovenska, Gorenjska

Tipologija projekta: projekt, sofinanciran v okviru Javnega razpisa za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

Vodilni partner: Comune di Fiumicello

Projektni partnerji:

Provincia di Ravenna

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Univerza v Ljubljani

Università degli studi di Trieste

BSC poslovno podporni center d.o.o. Kranj

Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia

Občina Postojna

Biotehniški Center Naklo

DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM

Comune di Este

AZIENDA U.L.S.S. N. 13 - Mirano

Opis: Projekt spodbuja uporabo krajevnih in tradicionalnih proizvodov italijanskih in slovenskih v šolskih menzah čezmejnega območja, z ukrepi nad prehrabeno vzgojo v šolah po učinkovitem pristopu.

Aktivnosti: Usposabljanje in izobraževanje študentov in učiteljev na pram določene izobraževalne poti. Uvedba selekcije lokalnih in tradicionalnih slovenskih in italijanskih proizvodov v čezmejnih šolskih menzah. Razvijanje »dobrih praks za« uvedbo uporabe v šolskih menzah lokalnih in tradicionalnih proizvodov. Preverjanje učinkovitosti posegov, za izboljšanje dejavnosti tudi po izvajanju projekta.

Rezultati: 12 lokalnih deležnikov vključenih v projekt, 10 mrež med univerzami in šolskimi ustanovami, 600 Dijakov ali študentov vključenih v projektne aktivnosti, 20 usposobljenih promotorjev in uslužbencev, 80 usposobljenih predavateljev in delavcev v šolskih menzah, 6 tematskih delavnic, 12 tipičnih lokanih proizvodov vključenih v šolske menze in 75% zadovoljnost študentov z lokalnimi proizvodi.



3.3.2 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

- Informacije o kakršnih koli večjih težavah, ki so nastopile pri izvajanju prednostne naloge, vključno s povzetkom resnih težav, določenih pri postopku iz člena 62(1)(d)(i) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, kjer je to primerno, in ukrepi, ki jih je sprejel organ upravljanja ali nadzorni odbor, da težave odpravi.

V letu 2012 ni bilo ugotovljenih večjih težav pri izvajanju prednostne naloge 3. Kljub temu so bila ugotovljena odstopanja in zamude pri pričetku izvajanja določenih aktivnosti, predvsem v zvezi s standardnimi projekti, za katere je obdobje podpisovanja Pogodb o dotaciji sofinanciranja trajalo dlje časa.

Vsi vključeni upravičenci si prizadevajo za hitrejše izvajanje dejavnosti, da bi nadoknadili nastalo zamudo.

V zvezi z javnim razpisom za predložitev strateških projektov št. 01/2009 velja izpostaviti, da so projekti dosegli vrhunec izvajanja, saj so upravičenci v letu 2012 pospešeno izvajali projektne aktivnosti. Veliko VP je predložilo prošnjo za podaljšanje izvajanja projektnih aktivnosti in tako preložilo datum zaključka projekta za nekaj mesecev, z namenom učinkovitejšega doseganja ciljev in rezultatov projekta.

V zvezi z javnim razpisom št. 02/2009 za predložitev standardnih projektov, kljub zamudam, ki so nastale pri postopku sklepanja Pogodb o dotaciji sofinanciranja za posamezne projekte, so upravičenci že ob samem začetku pričeli s pospešenim izvajanjem aktivnosti, kar je prispevalo k doseganju znatnega odstotka porabe sredstev.

V zvezi z javnim razpisom za predložitev standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 so se v letu 2012 pričeli in zaključili postopki sklenitve vseh 20 Pogodb o dotaciji sofinanciranja med OU in VP za posamezne projekte, kar bo omogočilo hitrejši pričetek izvajanja projektnih aktivnosti in črpanja sredstev.

Pri upravičencih ugotovljene težave predvsem v povezavi z načrtovanjem aktivnosti, kar je deloma posledica spoštovanja pravil in omejitev, ki jih določajo postopki javnega naročanja.

Po drugi strani pomanjkanje izkušenj upravičencev pri vodenju zelo kompleksnih projektov, kot so projekti programskega obdobja 2007-2013, kakor tudi formalistični in birokratski postopki upravljanja projektov, so vplivali na dejanski pričetek izvajanja aktivnosti.

Glede na ugotovljene težave je OU, s pomočjo STS, uvedel številne ukrepe, namenjene zagotavljanju pravilnega in pravočasnega izvajanja načrtovanih aktivnosti, kot na primer: redna srečanja z VP vseh projektov, z namenom spremljanja poteka projektnih aktivnosti in obravnave ključnih ugotovljenih težav; izobraževalne delavnice za upravičence s področja javnega naročanja; poenostavitev postopkov vodenja projektov, v skladu z veljavnimi predpisi.



3.4 Prednostna naloga 4: Tehnična pomoč

3.4.1 Doseganje ciljev in analiza napredka

Podatki o fizičnem napredku prednostne naloge

- Za vsak izmerjen kazalnik, s posebnim poudarkom na osrednje kazalnike:

- Kumulativni rezultat; vrednost kazalnika mora biti enaka skupni vrednosti pridobljeni na koncu leta poročanja.
- Rezultate za prejšnja leta se lahko dopolni v letnih poročilih o izvajanju za naslednja leta, v primerih ko so na voljo podrobnejše informacije.
- Cilj je mogoče navesti za določeno leto ali za celotno programsko obdobje.
- Navede se le za prvo leto, če so informacije na voljo, razen v primerih, ko se uporablja načelo dinamične reference.

- Vse kazalnike je potrebno razčleniti glede na vrsto, kjer je mogoče. V primerih, ko podatki še niso na voljo, se jasno navede, kdaj bodo na voljo in kdaj jih bo organ upravljanja predložil Komisiji.

V nadaljevanju sledi tabela s kazalniki, ki se nanašajo na prednostno nalogo 4, na dan 31.12.2012.

KAZALNIKI FIZIČNE REALIZACIJE (PREDNOSTNA NALOGA 4)	Cilj	Vrednost	Enota	Opis enote
4A - Osebe Skupnega tehničnega sekretariata	12	13	število	število oseb
4B - Izvedeni komunikacijski dogodki	30	48	število	število dogodkov
4C - Navodila, usmerjena v olajševanje izvajanja OP	6	27	število	število
KAZALNIKI REZULTATOV/UČINKOV (PREDNOSTNA NALOGA 4)	Cilj	Vrednost	Enota	Opis enote
4D - Projekti, ki kažejo nepravilnosti, od celotnega števila financiranih projektov	Manj kot 5 %	0,5% ¹⁰	%	odstotek
4E - Prebivalci, ki jih dosežejo komunikacijski dogodki	10 %	10%	%	delež prebivalcev programskega območja v odstotkih

¹⁰ V referenčnem obdobju tega poročila so bile s strani Revizijskega organa ugotovljene nepravilnosti pri 5 projektih-subjektih od 893 upravičenih subjektov, vključenih v Program.



Vsi fizični kazalniki, tako kazalniki realizacije kakor kazalniki rezultatov, kažejo stalen napredek, skladno z značilnostmi aktivnosti tehnične pomoči, oziroma postopen napredek glede na izvajanje celotnega Programa.

S finančnega vidika ugotovljene kumulativne obveznosti znašajo 6.824.344,34 EUR, potrjeni izdatki (skupni znesek) pa 3.387.981,12 EUR.

Kakovostna analiza

- Analiza dosežkov, pri kateri se upošteva finančne podatke (točka 2.1.2) in kazalnike (točka 3.1.1.) ter druge ustrezne podatke.
- Ustrezen prikaz učinkov spodbujanja enakih možnosti med moškimi in ženskami (če je ustrezno).
- Analiza uporabe sredstev iz 2. odstavka 34. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. Za programe financirane iz ESS navesti informacije zahtevane v 10. členu Uredbe (ES) št. 1081/2006.
- Seznam nedokončanih projektov s predvidenim datumom zaključka (le za zaključno poročilo).

V letu 2012 se je napredek aktivnosti, ki potekajo v okviru prednostne naloge 4, nadaljeval usklajeno in se je pri tem ohranila transverzalnost glede na predvidene ukrepe. Prednostno nalogo, glede na njeno naravo zaznamuje napredek, ki poteka skladno z izvajanjem celotnega Programa.

Poročilo v nadaljevanju vsebuje pregled vrednosti po posameznih kategorijah izdatkov, vključenih v finančni načrt projekta tehnične pomoči.

Spodnja tabela prikazuje porazdelitev sredstev (skupni znesek in delež ESRR) v okviru prednostne naloge 4 - Tehnična pomoč po kategorijah izdatkov ter po VP (ITA) in PP (SLO).

Prednostna naloga 4 - Tehnična pomoč. Porazdelitev sredstev po kategorijah izdatkov.

Kategorije izdatkov		Skupni znesek dodeljenih sredstev (v €)	Od tega ESRR (v €)	Sredstva dodeljena VP - skupaj (v €)	Sredstva dodeljena PP - skupaj (v €)
1	Zaposleni	5.357.419,14	4.553.806,27	2.667.823,63	2.689.595,51
2	Zunanji sodelavci	1.980.661,86	1.683.732,58	1.846.861,86	134.000,00
3	Srečanja	149.720,00	127.262,00	77.360,00	72.360,00
4	Oprema	80.000,00	68.000,00	60.000,00	20.000,00
5	Izdatki za gradbena dela, nakup zemljišč in nepremičnin	-	-	-	-
6	Informiranje in obveščanje	555.891,25	472.507,56	507.391,25	48.500,00
7	Pripravljalni izdatki	-	-	-	-
8	Administrativni in ostali izdatki	78.949,75	67.107,29	65.949,75	13.000,00
Skupaj		8.202.842,00	6.972.415,70	5.225.386,49	2.977.455,51



Opis stroškovnega načrta za leto 2012 vključuje kategorije izdatkov prikazane v tabeli, ki zajemajo sledeče izdatke:

- zaposleni - uslužbenci STS in slovenske Info točke; nacionalni prvostopenjski kontrolorji v Republiki Sloveniji in v Italiji;
- zunanji sodelavci - sistem spremljanja; prevajanje; svetovanje v zvezi z državnimi pomočmi, pravno svetovanje in dejavnosti izobraževanja/izpopolnjevanja STS; strokovnjaki za širjenje informacij v deželah partnericah Veneto in Emilia Romagna;
- srečanja - seja NO v Novi Gorici dne 6. julija 2012 in drugi sestanki med organi Programa;
- oprema - nabava strojne in programske računalniške opreme;
- informiranje in obveščanje javnosti - uradna spletna stran Programa; mediji - Twitter profil Programa in spletni koledar; informativni dogodki na upravičenem območju - delavnice za upravičence - javni razpis št. 01/2009, 02/2009, 03/2011 in izobraževalne delavnice o postopkih javnega naročanja; sodelovanje na Barkovljanki in obeležitev ECday; promocijski material - promocijski predmeti za obiskovalce s programskega območja.

V tabeli je navedena višina izdatkov v okviru prednostne naloge 4 »Tehnična pomoč« na dan 31. decembra 2012 (kumulativna vrednost):

Skupni znesek (v €)	Sofinanciranje iz ESRR (v €)	Nacionalno sofinanciranje (v €)
3.387.981,12	2.879.778,90	508.202,22

Kot prikazuje tabela, so bili v letu 2012 potrjeni izdatki v višini 3.387.981,12 EUR (kumulativna vrednost), porazdeljeni med VP - v višini 1.986.093,39 EUR in PP - v višini 1.401.887,73 EUR.

Vsi postopki za izbor članov STS so bili izvedeni v skladu z načeli enakih možnosti med moškimi in ženskami ter nediskriminacije.

Po temeljiti analizi nastalih izdatkov in potreb v okviru Programa, so bile na 12. redni seji NO, ki je potekala v Novi Gorici, potrjene v nadaljevanju opisane spremembe projekta tehnične pomoči:

1. SPREMEMBE »BL 1 INTERNAL PERSONNEL« - SREDSTVA VP

- Skladno s 4. odstavkom 11. člena javnega razpisa za ustanovitev STS, objavljenega v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine št. 50 z dne 16. decembra 2009, ter z določili pogodb, podpisanih s strani italijanskih sodelavcev STS, je NO na 11. redni seji, ki je potekala v San Daniele del Friuli, 18. oktobra 2011, na predlog OU in upoštevajoč pomembno in obsežno delo, ki ga je STS opravil v povezavi z vodenjem številnih postopkov za pravilno in pravočasno izvajanje programskih aktivnosti, odobril povišanje plač italijanskih sodelavcev STS. V okviru naslednje redne seje, ki je potekala v Novi Gorici, 6. julija 2012, je NO odobril spremembo projekta tehnične pomoči - št. 4TA03-2009, in sicer spremembo vrednosti postavke 1.01 »Personnel«, zaradi povišanja plač italijanskih sodelavcev STS, za maksimalno skupno vrednost 104.000,00 EUR.



Omenjena postavka se je povečala za navedeni znesek. Posledično se je za navedeno vrednost znižala postavka 2.01 »Design and realization of Monitoring System«, kjer so ostala neporabljena sredstva. Sklep NO je izvedel OU, ki je odredil izplačilo povišice od dvomesečja oktober-november 2012 dalje, t.j. s prvim dvomesečjem tretjega pogodbenega leta sodelavcev STS. V skladu s predlagano spremembo nova skupna vrednost postavke 1.01 »Personnel« znaša 2.342.095,51 EUR.

- Na podlagi specifičnih zahtev organov Programa se je dodatno vključilo postavko 1.03 »Overtime Programme Authorities and FLC Italy and travel and accomodation of the Programme Authorities« v višini 36.000,00 EUR. Navedeni znesek je bil na postavko 1.03 prenesen s postavke 2.01 »Design and realization of Monitoring System«, ki se je posledično znižala za omenjeni znesek.
- Po analizi dejanskih potreb, načrtovanih s strani »FLC Italia«, so se sredstva predvidena za italijansko stran v okviru postavke 1.04 »On spot check FLC Italy Slovenia and other travel and accomodation FLC Italy«, v višini 24.000,00 EUR, znižala za 9.000,00 EUR in s se je s tem ustvarilo prihranke.
- V stroškovni načrt je bila vključena postavka 1.05 »First level control in Italy - Internal Personnel« v višini 223.728,12 EUR.

Višina »BL1 Internal Personnel« - sredstva VP sedaj znaša 2.667.823,63 EUR, skupna vrednost pa 5.357.419,14 EUR.

2. SPREMEMBE »BL 2 EXTERNAL PERSONNEL« - SREDSTVA VP

V skladu z ugotovljenimi vrednostmi neporabljenih sredstev, so bile predlagane sledeče spremembe:

- znižanje vrednosti postavke 2.01 »Design and realization of Monitoring System« za 140.000,00 EUR. V skladu s predlagano spremembo nova vrednost omenjene postavke znaša 155.999,98 EUR;
- znižanje vrednosti postavke 2.03 »Workshop« za 30.000,00 EUR. V skladu s predlagano spremembo nova vrednost omenjene postavke znaša 63.000,00 EUR;
- znižanje vrednosti postavke 2.07 »External Experts RV in RER« za 10.000,00 EUR. V skladu s predlagano spremembo nova vrednost omenjene postavke znaša 470.000,00 EUR;
- znižanje vrednosti postavke 2.06 »First Level Control Italy - External Personnel« za 223.728,12 EUR. V skladu s predlagano spremembo nova vrednost omenjene postavke znaša 518.771,88 EUR. Znesek v vrednosti 223.728,12 EUR je bil prenesen na novo postavko 1.05 »First level control in Italy - Internal Personnel« in sicer na BL Internal Personnel.

Višina »BL2 External Personnel« - sredstva VP sedaj znaša 1.841.861,86 EUR, skupna vrednost pa 1.975.861,86 EUR.



3. SPREMEMBE »BL 2 EXTERNAL PERSONNEL« - SREDSTVA PP

V skladu s predvidenimi izdatki, je bila predlagana sledeča sprememba:

- znižanje vrednosti postavke 2.03 »Workshop« za 25.000,00 EUR. V skladu s predlagano spremembo nova vrednost omenjene postavke znaša 38.000,00 EUR.

4. SPREMEMBE »BL 3 MEETINGS« - SREDSTVA VP

V skladu z analizo iz katere izhaja, da do sedaj nastali izdatki presegajo načrtovano vrednost za programsko obdobje 2007-2013 in v povezavi s predlogom programskih partnerjev, predstavljenim v okviru 11. redne seje NO, da bi se izdatke za udeležbo sej NO s strani članov NO z volilno pravico uveljavljalo v okviru postavke BL3 - »Meetings« je bilo predlagano, da se omenjeno postavko poveča za 35.000,00 EUR, od katerih je 5.000,00 EUR predvidenih za izdatke Dežele Veneto in 5.000,00 EUR za izdatke Dežele Emilia Romagna.

Natančneje:

- znižala se je vrednost postavke 1.04 »On spot check FLC Italy Slovenia and other travel and accomodation expenses of FLC Italy« za 9.000,00 EUR;
- znižala se je postavka 5.04 »Promotional Items« za 16.000,00 EUR;
- znižala se je postavka 2.07 »External Experts RV in RER« za 10.000,00 EUR.

5. SPREMEMBE »BL 3 MEETINGS« - SREDSTVA PP

Iz analize certificiranih izdatkov izhaja, da nastali izdatki presegajo načrtovano vrednost za programsko obdobje 2007-2013. V skladu s tem in tudi z namenom omogočiti uveljavljanje izdatkov za udeležbo sej NO s strani predstavnikov Republike Slovenije je bilo predlagano, da se vrednost postavke 3 »Meetings« poveča za 25.000,00 EUR. V skladu s predlagano spremembo nova skupna vrednost omenjene postavke znaša 72.360,00 EUR.

V skladu z opisanimi spremembami vrednost BL 3 »Meetings« znaša skupno 154.720,00 EUR.

6. SPREMEMBE »BL 4 EQUIPMENT« - SREDSTVA LP

Za boljše upravljanje sprememb projektov s strani organov Programa, in sicer za nabavo namenske ad hoc programske opreme, se je postavko 4 »Equipment« povečalo za 30.000,00 EUR. V skladu s predlagano spremembo nova skupna vrednost omenjene postavke znaša 60.000,00 EUR. Omenjeni znesek 30.000,00 EUR se na postavko 4 »Equipment« prenese s postavke 2.03 »Workshop«. Slednja se je posledično znižala za navedeno vrednost.



7. SPREMEMBE »BL 5 INFORMATION ACTIVITIES« - SREDSTVA VP

V skladu z izdatki, načrtovanimi za obdobje 2012-2015, je bilo predlagano znižanje vrednosti postavke 5.04 »Promotional Items« za 16.000,00 EUR. V skladu s predlagano spremembo nova skupna vrednost omenjene postavke znaša 169.950,00 EUR.

8. SPREMEMBE »ADMINISTRATIVE COSTS« - SREDSTVA VP-PP

Da bi se obdržalo obstoječi obseg deležev italijanskega in slovenskega nacionalnega sofinanciranja, kot določeno v Tehnično-administrativnem sporazumu, se je italijansko nacionalno sofinanciranje znižalo za 2.850,00 EUR in slovensko nacionalno sofinanciranje povišalo za 2.850,00 EUR. V skladu s predlagano spremembo vrednost italijanskega nacionalnega sofinanciranja znaša 6.082,46 EUR, vrednost slovenskega nacionalnega sofinanciranja pa 5.760,00 EUR.

Kot že navedeno v poglavju 2.1.1 v zvezi s sredstvi prednostne naloge 4, je NO v okviru 40. dopisne seje, ki je potekala decembra 2012, potrdil spremembo projekta Tehnične pomoči št. 4TA03-2009, in sicer dodelitev zneska v višini 124.380,31 EUR za pričetek novega programskega obdobja čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo 2014-2020. Sredstva bodo namenjena pripravi predhodnega vrednotenja, posodobitvi celovite presoje vplivov na okolje, aktivnostim v pomoč delovni skupini v ustanavljanju in pripravi novega O.P.



3.4.2 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

- Informacije o kakršnih koli večjih težavah, ki so nastopile pri izvajanju prednostne naloge, vključno s povzetkom resnih težav, določenih pri postopku iz člena 62(1)(d)(i) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, kjer je to primerno, in ukrepi, ki jih je sprejel organ upravljanja ali nadzorni odbor, da težave odpravi

Ni bilo ugotovljenih posebnih težav pri izvajanju prednostne naloge 4. Aktivnosti so dobro organizirane in potekajo usklajeno skozi vse leto.

Velja izpostaviti, da je bil projekt tehnične pomoči, v skladu s 16. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006, izbran v vzorec za leto 2012. Vzorčenje je zajemalo izdatke VP - Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina, certificirane v letu 2011, v skupni vrednosti 757.631,08 EUR. Za Deželo Furlanijo Julijsko krajino je bil revidiran znesek v višini 139.122,88 EUR. Dne 6. novembra 2012 je RO posredoval končno revizijsko poročilo, v okviru katerega ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Za PP - Republiko Slovenijo so bili predmet revizije izdatki iz leta 2011 v skupni vrednosti 727.877,77 EUR. RO Republike Slovenije je v okviru revizijskega poročila z dne 04.12.2012 navedel dve nepravilnosti in ugotovil neupravičene izdatke v višini 500,00 EUR.



4. Programi iz ESRR/kohezijskega sklada: veliki projekti (če je ustrezno)

- *Napredek pri izvajanju velikih projektov skladno s časovnim razporedom iz točke D.1 v prilogah XXI in XXII;*
- *Napredek pri sofinanciranju velikih projektov na podlagi podatkov iz točke H.2.2 v prilogah XXI in XXII (podatke, je potrebno navesti kumulativno).*

Program ne predvideva izvajanja velikih projektov.



5. Tehnična pomoč

- Izvajanje tehnične pomoči.

- Izdatki za Tehnično pomoč iz sredstev Strukturnih skladov dodeljenih operativnemu programu, izraženi v odstotkih.

Finančna sredstva, dodeljena prednostni nalogi 4, predstavljajo 6% skupne vrednosti O.P. in znašajo 8.202.842,00 EUR. V skladu s finančnim načrtom O.P. so sredstva razdeljena med VP (Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina) in PP (Republika Slovenija), in sicer 5.225.386,49 EUR je dodeljenih VP, 2.977.455,51 EUR pa PP.

Izdatke za osebje v okviru Začasne tehnične pomoči je omogočilo sprejetje projekta s oznako »4TA 01-2008«.

Za ta projekt je bil izdelan poseben finančni načrt v skupni vrednosti 2.839.000,00 EUR, ki predvideva dve kategoriji izdatkov »Zunanji sodelavci« (1.419.500,00 EUR) in »Zaposleni« (1.419.500,00 EUR). Vrednost certificiranih izdatkov tega projekta znaša 550.213,71 EUR. Ta projekt je zaključen.

Projekt Tehnične pomoči z oznako »4TA 03-2009« je bil odobren s strani NO v okviru 10. dopisne seje z dne 21. julija 2009. NO je končno različico skupaj z navodili za izvajanje potrdil na seji, ki je potekala v Novi Gorici, 6. julija 2012. Projektne aktivnosti zajemajo šest različnih kategorij izdatkov, in sicer

- zaposleni: sodelavci STS in slovenske Info-točke - vključno s projektom s šifro 4TA01-2008 in naslovom »Začasna tehnična pomoč v okviru O.P. Slovenija-Italija 2007-2013«, ki se je izvajal pred ustanovitvijo STS; nacionalni prvostopenjski kontrolorji za slovensko in italijansko stran;
- zunanji sodelavci: sistem spremljanja; storitve prevajanja; vrednotenje Programa; svetovanje o revizijskih aktivnostih, o državnih pomočeh, o izobraževanju/izpopolnjevanju za STS; strokovnjaki s področja širjenja rezultatov projektov v deželah partnericah Veneto in Emilia Romagna; nacionalni prvostopenjski kontrolorji za italijansko stran;
- srečanja: seje NO, sestanki Čezmejne koordinacijske delovne skupine in drugi sestanki organov Programa;
- oprema: nabava strojne in programske računalniške opreme;
- informiranje in obveščanje: uradna spletna stran Programa; mediji; informativni dogodki na upravičenem območju; promocijski predmeti; celostna grafična podoba;
- administrativni izdatki.

V skladu z določili 14. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006 STS, ki ga sestavljajo italijanski uslužbenci in slovenski uslužbenci in deluje v okviru prostorov OU, skrbi za tehnično podporo ter pomaga samemu OU, OP in NO pri opravljanju njihovih nalog. Pomaga tudi skupini revizorjev v skladu z 2. odstavkom 14. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o ESRR.

V obdobju obravnavanem v pričujočem Poročilu, se je dejavnost STS osredotočila na prioritete opisane v poglavju 1.2 tega poročila.

Certificirani izdatki za projekt Tehnične pomoči na dan 31.12.2012 znašajo 1.986.093,39 EUR za VP in 1.401.887,73 EUR za PP. Skupna vrednost certificiranih izdatkov znaša 3.387.981,12 EUR.

Izdatki, nastali do 31. decembra 2011 predstavljajo 41,30% razpoložljivih sredstev v okviru prednostne naloge 4.



6. Informiranje in obveščanje javnosti

- informacije v skladu z 2. odstavkom 4. člena Uredbe Komisije (ES) št. 846/2009, vključno z dosežki, primeri dobre prakse in pomembnimi dogodki.

Naloge in funkcije OU so določene v 60. členu Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, v 15. členu Uredbe (ES) št. 1080/2006 in v 6. poglavju O.P.

Tudi v letu 2012 je OU zagotovil spoštovanje zakonodaje na področju informiranja in obveščanja javnosti, kot določeno v 69. členu Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in podrobneje v 2.-10. členu Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006¹¹.

V skladu z določbami 2. odstavka 4. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 so v tem poglavju opisani predvsem ukrepi informiranja in obveščanja javnosti, izvedeni v letu 2012, ki so pripomogli k:

- promociji in prepoznavnosti Programa ter so okrepili poznavanje vloge le-tega;
- povečanju dodane vrednosti ukrepov Skupnosti.

Obenem je bil v okviru ukrepov informiranja in obveščanja pripravljen in objavljen seznam upravičencev, skladno z določili 7. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 ter European Transparency Initiative (COCOF z dne 23. Aprila 2008) in je bilo omogočeno ustrezno informiranje upravičencev v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti glede ukrepov informiranja in obveščanja javnosti.

6.1 Nosilci in strukture

Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 podrobno določa postopke izvajanja Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in v 2. členu določa, da OU pripravi Komunikacijski načrt za O.P., za katerega je tudi odgovoren. Obenem 5., 7., 8. in 9. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 določajo, da je OU odgovoren za izvajanje ukrepov informiranja in obveščanja javnosti, katerih namen je širjenje informacij o O.P. ter podatkov o sofinanciranju iz ESRR.

V letu 2012 je OU zagotavljal spoštovanje obveznosti s področja informiranja in obveščanja javnosti, ki jih določa 69. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, in s pomočjo STS in slovenske Info točke zagotavljal skladnost ukrepov informiranja in obveščanja javnosti z določbami Komunikacijskega načrta (v nadaljevanju KN) Programa, ki predstavlja strateški dokument za načrtovanje in vodenje komunikacijskih aktivnosti.


V povezavi z dejanskimi cilji in roki v okviru Programa je OU v letu 2012 pripravil programski dokument oz. »izvedbeni načrt«, v katerem so opredeljene smernice in prednostne naloge, med drugim tudi na področju informiranja in obveščanja javnosti. Pri tem je OU upošteval tudi predloge in pobude STS in slovenske Info točke.

¹¹ Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj, spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 846/2009 z dne 1. septembra 2009.

STS je na podlagi dopolnjenega »izvedbenega načrta« pripravil »časovni načrt« za doseganje ciljev, predvidenih v O.P. in določenih s strani NO ter OU. Pri tem so glede na načrtovane aktivnosti sodelovali tudi ostali člani STS. Časovni načrt vsebuje opis posameznih faz izvajanja Programa ter časovni raspored izvajanja splošnih usmeritev, ki se določajo sproti in predvsem:

- časovnico za doseganje ciljev in ugotavljanje potreb po strokovnih virih, v povezavi z določenimi roki in
- pravočasno obveščanje OU o morebitnih ovirah za doseganje predvidenih ciljev.

Diagram v nadaljevanju prikazuje opis komunikacijskega toka med OU in STS ter **slovensko Info točko** in **Delovno skupino za komunikacijo** (v nadaljevanju DSK). Delovna skupina za komunikacijo, ki jo sestavljajo predstavniki programskih partnerjev, ima svetovalno in predlagalno funkcijo. Delo skupine poteka preko elektronske izmenjave informacij, in sicer preko elektronske pošte.

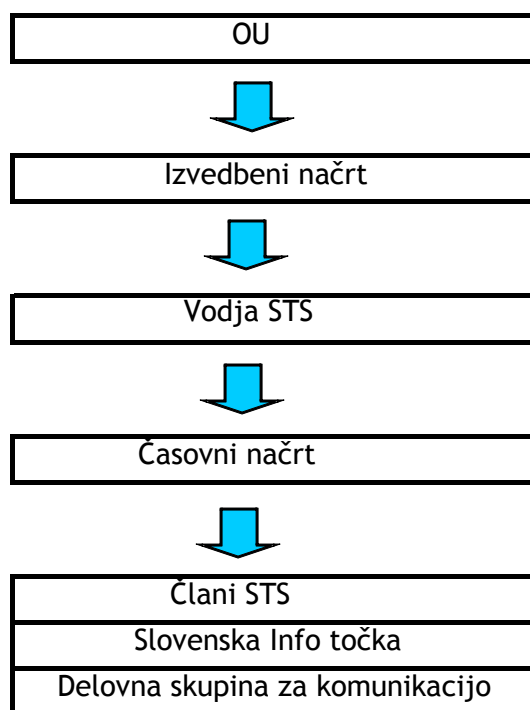

Slovenska Info točka je poleg pomoči in svetovanja slovenskim upravičencem sodelovala z OU in STS pri organizaciji vseh komunikacijskih aktivnosti, ki so potekale na območju Republike Slovenije.

Referenti DSK iz Dežele Veneto in Emilia Romagna pa so nudili pomoč upravičencem na območju omenjenih dežel in so aktivno sodelovali pri organizaciji dogodkov na svojih območjih.

Predstavniki programskih partnerjev so se udeležili srečanj, organiziranih v okviru Programa; pripravili so potrebno dokumentacijo za seje NO; spremljali so izvajanje odgovarjajočih delov projektov; sodelovali so pri posodabljanju uradne spletne strani Programa.



6.2 Izvajanje, nadzor in spremembe Komunikacijskega načrta

OU pripravi in izvaja strateški KN, ki je usklajen in dolgoročno zastavljen ter izpostavlja potrebo po zagotavljanju transparentnosti ukrepov in široke prepoznavnosti doseženih rezultatov z obsežnim širjenjem informacij.

Rezultat skupnega dela predstavnikov programskih partnerjev v okviru DSK je KN, ki ga je Evropska komisija potrdila z dopisom št. 5387 z dne 30. junija 2008 in je bil nato sprejet z dopisom št. Ares(2011)915460 z dne 29. avgusta 2011 s spremembami, pripravljenimi v skladu z 2. odstavkom 4. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in vključenimi v Letno poročilo o izvajanju za leto 2010, ki ga je odobril NO v okviru dopisne seje z dne 10. junija 2011.

V okviru izvajanja KN so bili v letu 2012 organizirani letni dogodek (udeležba na Barkovljanki) in številni drugi informativni dogodki. Omenjene aktivnosti so omogočile pokrivanje vseh ciljnih skupin, ki jih vključuje KN.

V zvezi s komunikacijskimi sredstvi velja izpostaviti, da je bilo leto 2012 inovativno, saj sta bila poleg spletne strani Programa vzpostavljena tudi profil Programa na Twitterju in spletni koledar dogodkov, kot osrednji sredstvi obveščanja o aktivnostih Programa.

6.3 Vrste ukrepov

Strateška odločitev, ki jo je na operativni ravni sprejel OU za leto 2012 (kakor tudi za predhodno leto), je spodbujati **različne aktivnosti, načrtovane tako na centralni ravni**, z aktivno vključitvijo STS, **kot tudi na decentralizirani ravni**, in sicer s pomočjo skupnega delovanja STS, slovenske Info točke in DSK. Cilj odločitve, ki je praktične narave, je izvedba primernih organiziranih izobraževanj, ki upoštevajo posebnosti čezmejne narave Programa.

Spodnja tabela vsebuje seznam vseh aktivnosti, ki so bile organizirane v okviru Programa v letu 2012:

KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI 2012					
Vrsta dogodka	Št.	Opis	Kraj in datum	Programsko območje	Št. dni
Mreženje in izmenjava izkušenj	1	Srečanje med organi Programa	TRST, 10.01.2012	FJK	1
Izobraževalne delavnice	2	Delavnica za upravičence v sodelovanju s slovensko prvostopenjsko kontrolo - poročanje	LJUBLJANA, 12.01.2012	SLO	0,5
Izobraževalne delavnice	3	Delavnica za upravičence v sodelovanju s slovensko prvostopenjsko kontrolo - poročanje	LJUBLJANA, 17.01.2012	SLO	0,5
Izobraževalne delavnice	4	Pripravljalni sestanki s čezmejnimi delovnimi skupinami ocenjevalcev javnega razpisa št. 03/2011	TRST, 19.01.2012	FJK	0,5
Mreženje in izmenjava izkušenj	5	Srečanje s predstavniki dežele Veneto in dežele Emilia Romagna - informiranje in obveščanje	TRST, 19.01.2012	FJK	1




KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI 2012					
Vrsta dogodka	Št.	Opis	Kraj in datum	Programsko območje	Št. dni
Izobraževalne delavnice	6	Pripravljalni sestanek s čezmejnimi delovnimi skupinami ocenjevalcev javnega razpisa št. 03/2011	LJUBLJANA, 20.01.2012	SLO	0,5
Izobraževalne delavnice	7	Pripravljalni sestanek s čezmejnimi delovnimi skupinami ocenjevalcev javnega razpisa št. 03/2011	VIDEM, 23.01.2012	FJK	0,5
Izobraževalne delavnice	8	Pripravljalni sestanek s čezmejnimi delovnimi skupinami ocenjevalcev javnega razpisa št. 03/2011	LJUBLJANA, 26.01.2012	SLO	0,5
Izobraževalne delavnice	9	Delavnica za upravičence v sodelovanju z italijansko prvostopenjsko kontrolo - poročanje	VIDEM, 26.01.2012	FJK	1
Mreženje in izmenjava izkušenj	10	Srečanje z VP strateških projektov (javni razpis št. 01/2009)	TRST, 30.01.2012	FJK	1
Mreženje in izmenjava izkušenj	11	Udeležba na Gospodarskem forumu, ki e potekal na Konzulatu RS v Trstu	TRST, 22.02.2012	FJK	0,5
Mreženje in izmenjava izkušenj	12	Srečanje z VP strateških projektov (javni razpis št. 01/2009)	TRST, 03.04.2012	FJK	1
Izobraževalne delavnice	13	Delavnica za upravičence v sodelovanju z italijansko prvostopenjsko kontrolo - poročanje	BENETKE, 04.05.2012	VEN	1
Mreženje in izmenjava izkušenj	14	Srečanje med organi Programa	TRST, 12.06.2012	FJK	1
Izobraževalne delavnice	15	Delavnica za upravičence - uvod v nova navodila za poročanje	VIDEM, 18.06.2012	FJK	1
Izobraževalne delavnice	16	Delavnica za upravičence - uvod v nova navodila za poročanje	NOVA GORICA, 21.06.2012	SLO	1
Mreženje in izmenjava izkušenj	17	Srečanje z VP strateških projektov (javni razpis št. 01/2009)	TRST, 18.07.2012	FJK	1
Mreženje in izmenjava izkušenj	18	Interact seminar o EZTS	NOVA GORICA, 17.-18.07.2012	SLO	2
Mreženje in izmenjava izkušenj	19	Predstavitev Programa v sklopu AEBS Summer Seminar	TRST, 22.07.2012	FJK	0,5
Mreženje in izmenjava izkušenj	20	ECDAY - Razprava na Twitter-ju ob Dnevu evropskega sodelovanja	TRST, 21.09.2012	FJK	0,5
Izobraževalne delavnice	21	Delavnica za upravičence v sodelovanju z italijansko prvostopenjsko kontrolo - poročanje	BOLOGNA, 03.10.2012	E-R	1




KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI 2012					
Vrsta dogodka	Št.	Opis	Kraj in datum	Programsko območje	Št. dni
Mreženje in izmenjava izkušenj	22	Predstavitve dveh projektov (Slowtourism in Pot miru-Via di pace) v sklopu Open Days v Bruslju	BRUSELJ, 09.10.2012	EXT	0,5
Letni dogodek	23	Sodelovanje na »Villaggio Barcolana«	TRST, 10.-14.10.2012	FJK	4
Izobraževalne delavnice	24	Delavnica za upravičence - javni razpis št. 03/2011	NOVA GORICA, 18.10.2012	SLO	1
Izobraževalne delavnice	25	Delavnica za upravičence - javni razpis št. 03/2011	VIDEM, 25.10.2012	FJK	1
Izobraževalne delavnice	26	Delavnica o postopkih javnega naročanja (javna naročila, ki ne presegajo mejne vrednosti EU)	VIDEM, 06.11.2012	FJK	1
Izobraževalne delavnice	27	Delavnica o postopkih javnega naročanja blaga in storitev v skladu s 125. členom italijanskega zakona o javnem naročanju	VIDEM, 12.11.2012	FJK	1
Izobraževalne delavnice	28	Delavnica o postopkih javnega naročanja (javna naročila, ki ne presegajo mejne vrednosti EU)	BENETKE, 10.12.2012	VEN	1
Izobraževalne delavnice	29	Delavnica o postopkih javnega naročanja blaga in storitev v skladu s 125. členom italijanskega zakona o javnem naročanju	BENETKE, 17.12.2012	VEN	1
Skupaj dni					28



% tipologia evento / % vrste dejavnosti



Numero di eventi per area / Število dogodkov glede na območje (tot=29)

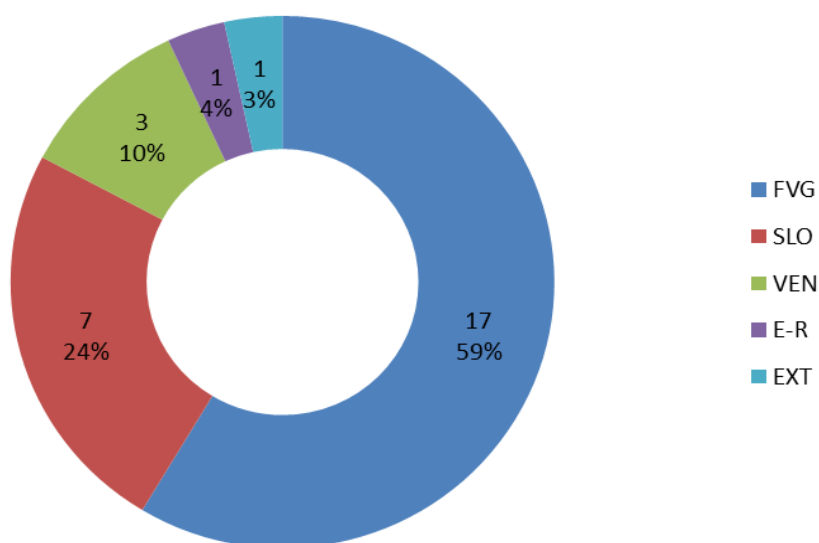

Poleg organiziranih dogodkov so komunikacijske aktivnosti zajemale tudi redno posodabljanje uradnih spletnih strani Programa (www.ita-slo.eu), vzpostavitev in upravljanje Twitter profila ter spletnega koledarja dogodkov. Omenjena sredstva smo uporabljali za redno obveščanje javnosti o aktivnostih, organiziranih v okviru Programa in v okviru sofinanciranih projektov.



6.4 Vsebina

Zakonodaja Skupnosti v zvezi s strukturnimi skladi poudarja pomembno vlogo informacijskih in komunikacijskih orodij in podpira potrebo po natančnem in sistematičnem načrtovanju, kot tudi jasno opredelitev metodologij in ciljev.

Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006, poglavje II, oddelek 1, določa obveznosti v zvezi z aktivnostmi informiranja o sofinanciranih programih in v zvezi z obveščanjem o pobudah. 7. člen omenjene Uredbe določa, da »Organ upravljanja zagotovi, da se ukrepi za informiranje in obveščanje javnosti izvajajo v skladu s KN, ter da si prizadeva za kar najbolj splošno poročanje v medijih z različnimi oblikami in načini komunikacije na ustrezni ozemeljski ravni.«

Zavezanost Evropske unije k širši in bolj učinkoviti komunikaciji se konkretno izvaja v okviru predpisov EU za programsko obdobje 2007-2013, in sicer v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006, ki se nanašata na Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad.

Informiranje in obveščanje javnosti sta torej sestavni del programov Evropske unije in ravno zato je tudi Evropska komisija pripravila posebno uredbo, ki ureja to področje. V primerjavi s programskim obdobjem 2000-2006 je Evropska unija z regulativnim okvirom za obdobje 2007-2013 jasno opredelila načine za uporabo orodij za informiranje in obveščanje javnosti, pri čemer je namenila posebno pozornost in dala poudarek učinkovitemu komuniciranju v okviru regionalnih razvojnih politik. Glavni cilj izvajanja ukrepov informiranja in obveščanja javnosti je povečati transparentnost, prepoznavnost in poznavanje strukturnih politik s pomočjo razpoložljivih informacijskih orodij, zlasti tistih, ki temeljijo na uporabi sodobnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

Predpisi EU s področja informiranja in obveščanja javnosti poudarjajo pomen le-tega z namenom, da bi ovrednotili vlogo Evropske unije in spodbujali občutek pripadnosti državljanov Evrope.

Komunikacijski ukrepi so bili usmerjeni k doseganju skupnega cilja »Izboljšanje privlačnosti in konkurenčnosti programskega območja«, kar kaže na pomembno vlogo komunikacije, zaradi česar je potrebno zagotoviti širjenje in krepitev aktivnosti, ki se izvajajo na programskem območju.

6.4.1 Dodana vrednost ukrepov Skupnosti

Vprašanje dodane vrednosti za Skupnost temelji na predpostavki, da je potrebno posredovanje Skupnosti, v primerih, ko ukrepi držav članic ne zadostujejo in bi posredovanje prineslo pozitivne učinke za celotno Evropsko unijo. Ta dodana vrednost strukturnih ukrepov vključuje tudi spodbujanje sodelovanja in prepoznavnosti EU, izmenjavo izkušenj na terenu na podlagi najboljših praks in povezovanje v mreže akterjev in virov¹².

¹² http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/debate/document/general_en.pdf




6.4.2 Spletna stran in socialna omrežja

STS je tudi v letu 2012 skrbel za redno posodabljanje uradne spletne strani Programa <http://www.ita-slo.eu/>, ki je na voljo v treh jezikih (v slovenskem, italijanskem in angleškem).

Na omenjeni spletni strani je bilo v letu 2012, v delih v slovenskem in italijanskem jeziku, objavljenih več kot 100 novic.

Mesečno je spletno stran povprečno obiskalo več kot 6.500 obiskovalcev.

Mesec / Enkratni obiskovalci / Št. obiskov / Obiskane strani / Kontakti
/Pasovna širina za posamezni mesec v letu 2012 (vir: Actrur d.o.o.)



Mesec	Enkratni obiskovalci	Št. obiskov	Strani	Zadetki	Pasovna širina
Jan 2012	2,438	6,032	62,502	350,133	14.01 GB
Feb 2012	2,506	6,148	62,006	314,461	13.11 GB
Mar 2012	2,711	6,786	56,147	333,698	14.05 GB
Apr 2012	2,322	5,742	52,430	258,526	10.09 GB
Maj 2012	2,795	7,187	58,660	350,004	13.42 GB
Jun 2012	2,919	7,246	58,393	393,563	14.73 GB
Jul 2012	2,944	7,360	49,846	369,427	15.07 GB
Avg 2012	2,409	5,357	40,580	264,192	9.99 GB
Sep 2012	3,185	6,814	44,204	300,399	11.16 GB
Okt 2012	3,828	8,512	66,354	418,561	16.08 GB
Nov 2012	3,198	6,584	41,208	290,374	11.12 GB
Dec 2012	2,662	5,190	36,471	225,727	9.48 GB
Skupno	33,917	78,958	628,801	3,869,065	152.31 GB

Podatki kažejo, da je spletna stran nepogrešljivo orodje za komunikacijo in informiranje uporabnikov in ciljnih skupin, določenih v KN, kar je pomembno za izvajanje O.P. Obenem spletna stran predstavlja idealno orodje za prepoznavnost O.P. in vloge Evropske unije. OU in STS skrbita za stalno posodabljanje strani, preprosti dostop in pregledovanje vsebin, skladno s potrebami zainteresiranih uporabnikov.

V letu 2012 je bila posebna pozornost, poleg aktualnim novicam o Programu, namenjena delu »izvajanje projektov«, ki je bil redno posodobljen glede na novosti v okviru Programa.

Posodobljeni so bili tudi osrednji in specifični dogodki posameznih programskih partnerjev ter njihove institucionalne spletne strani, in sicer:



za Republiko Slovenijo

http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj_in_evropsko_teritorialno_sodelovanje/podrocje_evropskega_teritorialnega_sodelovanja/op_slovenija_italija_2007_2013/

za Avtonomno deželo Furlanijo Julijsko krajino

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/cooperazione-territoriale-europea/FOGLIA3/>

za Deželo Veneto

<http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Italia-Slovenia/>

in za Deželo Emilijo Romagno

<http://www.fondieuropei2007-2013.it/sezioni/scheda.asp?id=9>

Poleg novic, objavljenih na spletni strani Programa, sta bila v letu 2012 vzpostavljena Twitter profil Programa @CBCPITASLO0713, kjer je bilo objavljenih več kot 200 tweetov, ter spletni koledar http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo, ki omogoča stalno obveščanje javnosti o aktivnostih, ki potekajo v okviru Programa in posameznih projektov.

6.4.3 Dogodki, ki jih je organiziral Organ upravljanja

V letu 2012 je OU dal pobudo in izvedel znatno število dogodkov. Dogodki so vključevali aktivnosti informiranja in obveščanja, ki so prispevale k širjenju rezultatov aktualnega programskega obdobja ter delavnice, namenjene izobraževanju in usposabljanju upravičencev Programa. Poleg tega so bila organizirana različna srečanja za izmenjavo informacij in izkušenj.

OU je s podporo STS v letu 2012 spodbujal:

a) osrednje informacijske aktivnosti, kot je opredeljeno v KN, z namenom predstavitve rezultatov O.P.

a.1) letni dogodek

Letni dogodek Programa je bil za leto 2012 organiziran v Trstu, v okviru Barkovljanke in je potekal od 10. do 14. oktobra 2012. Organizirana je bila predstavitev Programa in posameznih projektov v okviru razstavnega prostora v sklopu »Villaggio Barcolana«.

Obiskovalcem je bilo na voljo informativno gradivo o Programu s predstavitvijo programskega območja, prednostnih nalog in ciljev Programa.

Ob tej priložnosti je bilo obiskovalcem razdeljeno promocijsko gradivo (promocijske torbe, flomastri, svinčniki, bloki, bomboni in cestni atlasi), ki prispeva k večji prepoznavnosti Programa in sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter iz nacionalnih virov.

Posebna pozornost je bila namenjena projektom, sofinanciranih v okviru Programa, ki so pripravili predstavitve za obiskovalce po posameznih tematskih sklopih. Predstavitve so potekale skozi vse 4 dni.



a.2) informativno-izobraževalni dogodki in delavnice

Skladno s potrebami, ki so jih izrazili upravičenci projektov, sofinanciranih v okviru Programa in v povezavi z novostmi, ki so bile uvedene v letu 2012, je OU s pomočjo STS, slovenske Info točke in DSK organiziral 14 informativno-izobraževalnih delavnic:

- 12. in 17. januarja 2012 v Ljubljani, 26. januarja 2012 v Vidmu, 4. maja 2012 v Benetkah, 3. oktobra 2012 v Bologni: delavnice o poročanju in izpolnjevanju obrazcev za poročanje, v sodelovanju s prvostopenjsko kontrolo;
- 18. junija v Vidmu in 21. junija 2012 v Novi Gorici: dve ad hoc delavnici, v okviru katerih so bile predstavljene novosti v Navodilih za poročanje za upravičence, ki so bila objavljena na spletni strani Programa 22. maja 2012 (veljavna za upravičene izdatke od 01.06.2012 dalje);
- 18. oktobra v Novi Gorici in 25. oktobra 2012 v Vidmu: delavnici sta bili namenjeni upravičencem javnega razpisa št. 03/2011 za standardne projekte - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju;
- 6.-12. november v Vidmu in 10.-17. december 2012 v Benetkah: 4 delavnice na temo javnega naročanja, ki so bile organizirane v sodelovanju s podjetjem Soges, d.d.. Prvo srečanje je bilo posvečeno javnim naročilom gradenj in storitev, ki ne presegajo mejne vrednosti EU in vodenju postopkov oddaje naročila, drugo srečanje pa javnim naročilom blaga in storitev v skladu s 125. členom italijanskega zakona o javnem naročanju.

V okviru naštetih delavnic so bile obravnavne specifične teme, povezane z izvajanjem projektov, in je bilo predstavljeno tudi stanje izvajanja Programa. Predavatelji so bili na voljo za morebitna vprašanja in pojasnila v zvezi s predstavljenimi vsebinami.

Poleg predstavitve postopka poročanja so bile zaradi velikega števila zakonskih novosti na področju javnih naročil v letu 2012 organizirane 4 specifične izobraževalne delavnice, namenjene bolj poglobljeni obravnavi vsebin, povezanih z javnimi naročili.

V povezavi z ocenjevanjem kakovosti projektov, ki je potekalo v skladu z določili Priročnika za ocenjevanje standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011, je STS koordiniral aktivnosti Čezmejne delovne skupine ocenjevalcev (ČDSO) in organiziral 4 pripravljalne sestanke, ki so potekali 19.01.2012 v Trstu, 20. in 26.01.2012 v Ljubljani in 23.01.2012 v Vidmu.

a.3) mreženje in izmenjava izkušenj

OU je s pomočjo STS organiziral še vrsto drugih srečanj:

- 10. januarja in 12. januarja 2012 v Trstu: srečanje organov Programa, na katerem so sodelovali OU, STS, slovenski nacionalni organ, prvostopenjski kontrolni enoti in OP. Na srečanjih je bilo predstavljeno stanje izvajanja Programa in so bila obravnavana nekatera skupna vprašanja.
- 30. januarja, 3. aprila in 18. julija 2012 v Trstu: srečanja z vodilnimi partnerji strateških projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 01/2009. Ob tej priložnosti so organi Programa obravnavali najpomembnejša vprašanja neposredno z upravičenci. VP



projektov so predstavili stanje izvajanja projektnih aktivnosti ter povezane težave in obenem obravnavali različna vprašanja neposredno z organi Programa.

- 19. januarja 2012 v Trstu: srečanje med STS, predstavniki Dežele Veneto in Dežele Emilia Romagna, ki so obenem tudi člani DSK, v okviru katerega so bile obravnavane aktivnosti, predvidene za leto 2012, s posebnim poudarkom na aktivnostih informiranja in obveščanja oz. širjenja rezultatov na posameznih območjih.

Tudi sodelovanje v okviru Dneva evropskega sodelovanja - ECDAY lahko štejemo kot priložnost za izmenjavo izkušenj, saj je 21. septembra 2012 potekala razprava o čezmejnem sodelovanju na družabnem omrežju Twitter.

Program je sodeloval tudi v okviru naslednjih aktivnosti:

- 22. februar 2012 - Trst. Program je sodeloval na Gospodarskem forumu, ki je potekal na Konzulatu Republike Slovenije v Trstu;
- 22. julij 2012 - Trst. Tudi v letu 2012, kakor v predhodnih letih, so se predstavniki Programa srečali z udeleženci AEER Summer Seminar in predstavili aktivnosti in rezultate Programa;
- 09. oktober 2012 - Open Days, Bruselj. Program je sodeloval na delavnici z naslovom »From Euroregion to EGTC, a long path to territorial cooperation«, ki je potekala na predstavništvu Galicije. V okviru dogodka so bile predstavljene dobre prakse evropskih lokalnih oblasti v okviru GECT, ki se že izvajajo in/ali se bodo izvajale. Kot primer dobre prakse sta bila predstavljena tudi projekta SLOWTOURISM in POT MIRU - VIA DI PACE, ki sta sofinancirana v okviru Programa.

b) izobešanje zastave Evropske unije za en teden od 9. maja dalje na sedežu OU

Zastava Evropske unije je vedno izobešena pred sedežem OU v Trstu. V prostorih OU in STS je izobešena tudi teden dni ob 9. maju, dnevu Evrope.

c) objavo v elektronski ali drugačni obliki seznama upravičencev, naslovov operacij in zneskov dodeljenih javnih sredstev¹³

Skladno z določili 7. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 ter European Transparency Initiative (COCOF z dne 23. aprila 2008), je OU s pomočjo STS poskrbel za pripravo in objavo seznama upravičencev z naslovom in zneskom sofinanciranja projektov, na spletni strani Programa, v delu ki zadeva projekte.

Obenem STS redno posodablja slovensko¹⁴, italijansko¹⁵ in angleško¹⁶ različico dela »projekti 2007-2013« uradne spletne strani Programa www.ita-slo.eu, kjer je objavljen seznam sofinanciranih operacij v okviru Programa. Za posamezen projekt je na voljo stran, ki poleg akronima in naslova projekta vključuje tudi:

- uradni naziv upravičencev projekta;

¹³ http://www.ita-slo.eu/projekti/projekti_2007_2013/

¹⁴ http://ita-slo.eu/progetti/progetti_2007_2013/

¹⁵ http://ita-slo.eu/progetti/progetti_2007_2013/

¹⁶ http://ita-slo.eu/projects/projects_2007_2013/

- naslov projekta (akronim, naslov, prednostna naloga);
- znesek javnih sredstev, dodeljenih za izvajanje projekta;
- datum začetka in zaključka, predviden v Pogodbi o dotaciji sofinanciranja med OU in VP;
- vpliv na območje;
- kratek opis projekta;
- različne druge podatke (npr. naslov spletne strani, če obstaja).

6.4.4 Dogodki, ki jih je organizirala Republika Slovenija

Slovenska Info točka s sedežem v Regionalni pisarni Štanjel, ki deluje v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) Republike Slovenije, je sodelovala pri organizaciji vseh aktivnosti, ki so bile na pobudo OU organizirane v Sloveniji.

Slovenska Info točka je v sodelovanju z INTERACT organizirala seminar z naslovom »Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS)«, ki je potekal v Novi Gorici, 17. in 18. julija 2012.

6.4.5 Celostna grafična podoba Programa

Osnovni sestavni elementi celostne grafične podobe Programa, kot določeno v KN, sestavljajo podobo, s katero Program oziroma sofinancirani projekt komunicira z javnostjo in s katero sta oba prepoznavna.

Ti elementi in pravila za njihovo uporabo so navedeni v »Navodilih za uporabo celostne grafične podobe«, ki opisujejo značilnosti logotipov Programa, napake, ki se jim je potrebno izogniti ter smernice za pravilno in učinkovito uporabo celostne grafične podobe. Ta dokument vsebuje vsa pojasnila o pravilni uporabi različic logotipa, ponuja nabor vzorcev in omogoča upravičencem enostavno in samostojno oblikovanje načrtovanih komunikacijskih gradiv.

Pogodba o dotaciji sofinanciranja med VP in LP določa, da morajo biti izdatki skladni z obveznostmi, ki jih določa Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006, z določili Priročnika o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju ter z Navodili za uporabo celostne grafične podobe za izvajanje aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti o projektih.

Sodelavec STS, odgovoren za odnose z javnostmi, redno nudi upravičencem vse potrebne informacije s področja informiranja in obveščanja, povezane z uporabo celostne grafične podobe Programa.



6.5 Ocena komunikacijskih dejavnosti


OU je v skladu s KN in s pomočjo vprašalnikov, ki so jih izpolnili udeleženci, pridobila informacije o izvedbi ukrepov informiranja in obveščanja, ki so bili realizirani v letu 2012, in sicer na osnovi ciljev, ki jih določa KN. Čeprav bi bilo potrebno vsebino vprašalnikov nekoliko prilagoditi aktualnemu stanju komunikacijskih dejavnosti Programa, so bili le-ti predloženi obiskovalcem nekaterih dogodkov z namenom pridobiti podrobnejšo oceno o organiziranem dogodku in morebitne dodatne predloge s strani udeležencev.

V letu 2012 so vprašalnike izpolnili udeleženci sledečih dogodkov:

1. Nova Gorica, 21.06.2012 - Delavnica za upravičence - predstavitev novih Navodil za poročanje;
2. Nova Gorica, 18.10.2012 - Delavnica za upravičence - posvečena predvsem javnemu razpisu št. 03/2011;
3. Videm, 25.10.2012 - Delavnica za upravičence - posvečena predvsem javnemu razpisu št. 03/2011;
4. Benetke, 17.12.2012 - Delavnica o postopkih javnega naročanja za italijanske upravičence - javno naročanje v skladu s 125. členom italijanskega zakona o javnem naročanju.

1. Nova Gorica, 21.06.2012

V okviru delavnice smo pridobili 101 izpolnjenih vprašalnikov¹⁷ s sledečimi ocenami dogodka:

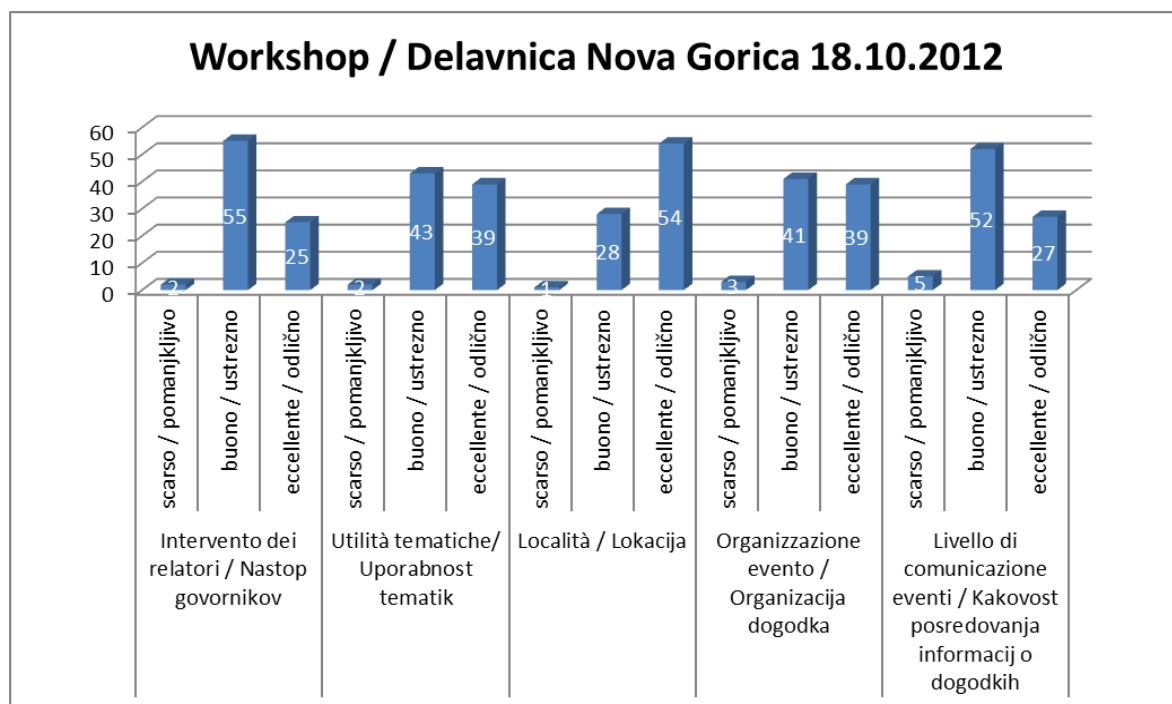


¹⁷ Skupno število odgovorov na posamezno vprašanje je v nekaterih primerih nižje.

Iz zgornjih podatkov je razvidno, da je več kot 93% udeležencev, ki je izpolnilo vprašalnik za omenjeni dogodek, organizacijo dogodka v vseh vidikih ocenilo kot »ustrezno« ali »odlično«.

2. Nova Gorica, 18.10.2012

V okviru delavnice smo pridobili 84 izpolnjenih vprašalnikov¹⁸ s sledečimi ocenami dogodka:

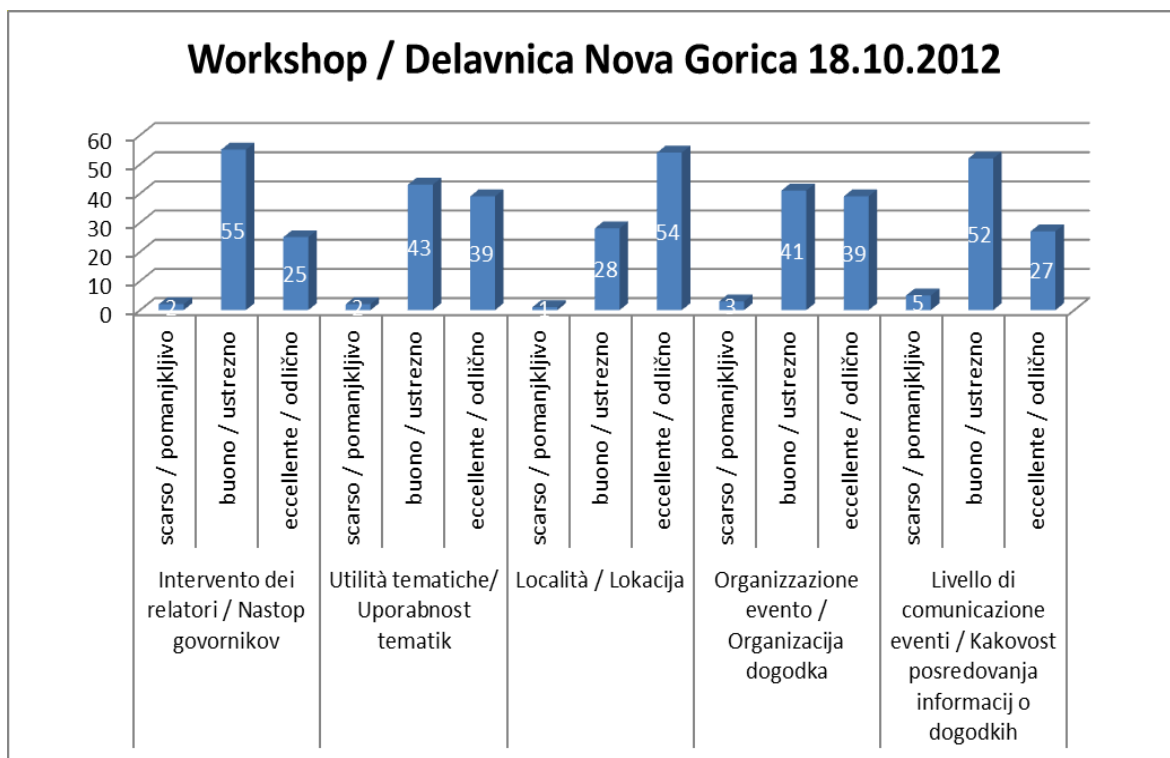


Iz zgornjih podatkov je razvidno, da je več kot 94% udeležencev, ki je izpolnilo vprašalnik za omenjeni dogodek, organizacijo dogodka v vseh vidikih ocenilo kot »ustrezno« ali »odlično«.

¹⁸ Skupno število odgovorov na posamezno vprašanje je v nekaterih primerih nižje.



3. Videm, 25.10.2012

V okviru delavnice smo pridobili 53 izpolnjenih vprašalnikov¹⁹ s sledečimi ocenami dogodka:

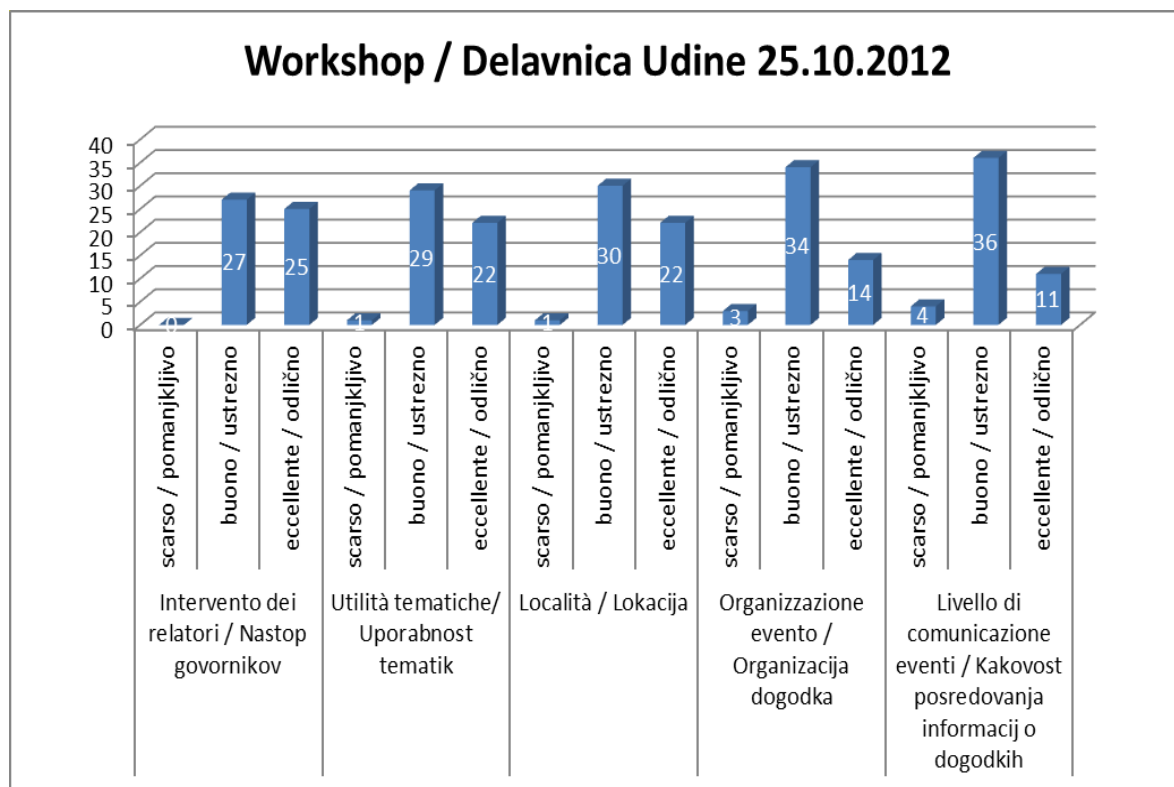


Tudi v tem primeru je iz zgornjih podatkov razvidno, da je več kot 92% udeležencev, ki je izpolnilo vprašalnik za omenjeni dogodek, organizacijo dogodka v vseh vidikih ocenilo kot »ustrezno« ali »odlično«.

¹⁹ Skupno število odgovorov na posamezno vprašanje je v nekaterih primerih nižje.



4. Benetke, 17.12.2012

V okviru delavnice o postopkih javnega naročanja smo pridobili 27 izpolnjenih vprašalnikov²⁰ s sledečimi ocenami dogodka:

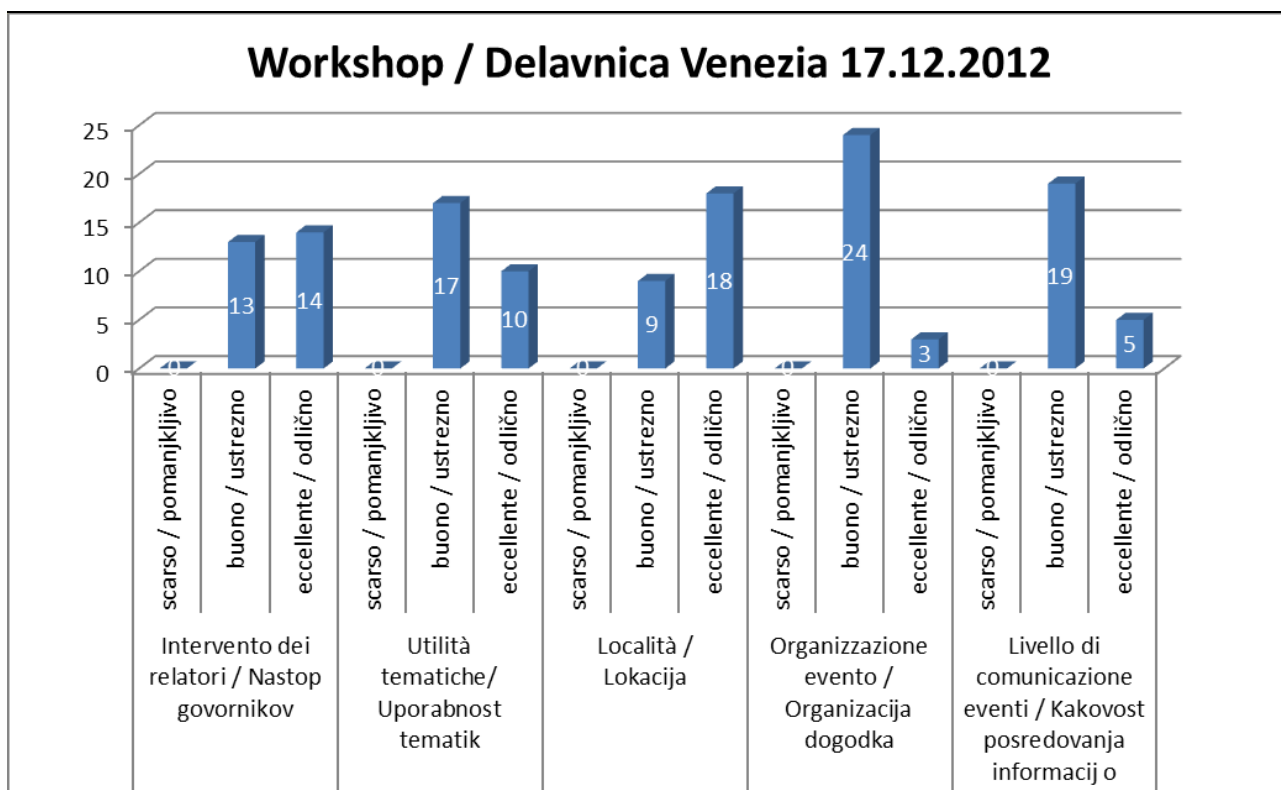

V zgornjem primeru nihče od udeležencev ni dogodka ocenil kot »pomanjkljivega«. Sto odstotkov udeležencev je uporabnost tematik, organizacijo dogodka ter kakovost posredovanja informacij o dogodku ocenilo najmanj kot »ustrezno«, medtem ko sta bila nastop govornikov ter lokacija ocenjena kot »odlična«.


²⁰ Skupno število odgovorov na posamezno vprašanje je v nekaterih primerih nižje.




Skupna ocena

Grafikoni v nadaljevanju predstavljajo skupno oceno (za vse 4 zgoraj navedene dogodke) po posameznih vprašanjih:

Intervento dei relatori / Nastop govornikov - 2012 (n=261)




Utilità tematiche/ Uporabnost tematik - 2012 (n=264)







Località / Lokacija - 2012 (n=263)

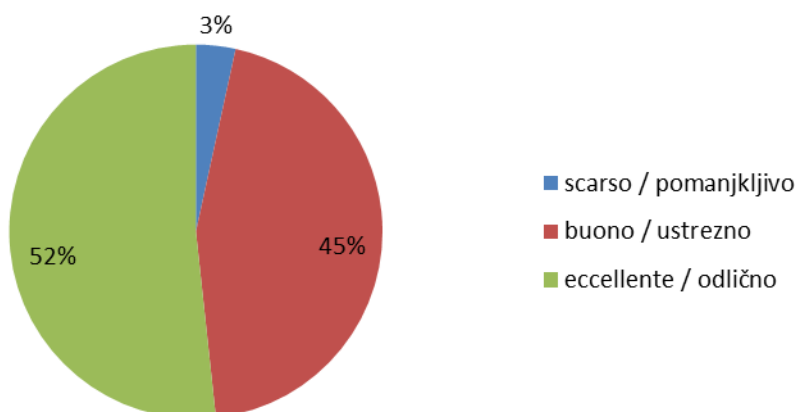

Organizzazione evento / Organizacija dogodka - 2012 (n=259)



Livello di comunicazione eventi / Kakovost posredovanja informacij o dogodkih - 2012 (n=259)





Iz prikazanih grafov izhaja, da je več kot 94% udeležencev pri vseh 5 vprašanjih ocenila organizacijo dogodka kot »dobro« ali »odlično«, kar kaže na učinkovitost aktivnosti, ki so bile organizirane v okviru Programa.

Udeleženci dogodkov so v vprašalnikih navedli tudi vrsto predlogov in nekateri že bili upoštevani in izvedeni (npr. reorganizacija vsebine na spletni strani v meri, ki jo dopušča tehnična zasnova le-te). Obenem je bila organizacija spletne strani, v kolikor je bilo mogoče, poenostavljena. Drugi predlogi, ki večinoma zadevajo izvedbo dogodkov (odmori, trajanje predavanj, možnost predhodnega pošiljanja predstavitev, predstavitev konkretnih primerov ali vnaprej pripravljenih primerov), bodo upoštevani pri organizaciji komunikacijskih dogodkov v letu 2013.
